



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU LAUTEM

JULHO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO


IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO LAUTEM

JULHO 2022

Prepara Husi :



(Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Lautem, ADN, I.P



(Eng. Geovanio M.X.C Aleixo)
Eng. ba Projecto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P




(Eng. Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projecto ME ADN, I.P



(Eng. Deamartino Henrique Lopes)
Eng. ba Projecto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P



(Eng. Elnino Junior A. Mota)
Eng. ba Projecto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P




(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Lautem, ADN, I.P

Verifika Husi :



(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu, ADN, I.P



(Eng. Remigio da C.S dos Santos)
Eng. Senior ba Projectu Infraestrutura e
Irigasaun, ADN, I.P



(Eng. Deolindo de F. Marques)

Chefe Seksaun ba Projetu M.E & ITC, ADN,

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

**Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN, I.P**

Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)

Director Executivo, ADN, I.P



INDICE

INDICE TABELA

Tabela 1	: Postos Administrativos, Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1	: Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Lautem.....	6
Tabela 1.2	: Lista Asset ADN,I.P Municipio Lautem	6
Tabela 1.3.1	: Projecto Municipio Lautem Por Fundus Financiamentos	8
Tabela 1.3.2	: Projecto Municipio Lautem Por Sectores.....	11
Tabela 1.3.3	: Projecto Municipio Lautem Por Ministerio.....	17
Tabela 1.4	: Dados Populasaun Munisipiu Lautem	23

I. INTRODUSAUN

1.1. Enkuadramentu Legal.

Agência de Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Dekretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publica iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekretu lei ne'e hetan revogasaun husi dekreto lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekretu lei ne'e hetan revogasaun husi dekreto lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2. Perfil Municipio Lautem



Mapa hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Lautem iha luan 1.702 km2 ho populasaun 59.787 tuir Sensus 2010. Tabela 1 hatudu Administrasaun Munisipal Lautem iha Posto Administrativo 5 , Sukus 34 no aldeias 151.

Iliomar		Lautém		Lospalos	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Ailebere	4	Baduro	5	Bauro	5
Caenilo	5	Com	6	Cacavei	4
fuat	3	Daudare	8	Fuiloru	11
Iliomar I	5	Euquisi	3	Home	4
Iliomar II	5	lilali	2	Leuro	4
-	3	Maina I	5	Loré I	6
-	3	Maina II	5	Loré II	3

-	-	Pairara	4	Muapiti ne	5
-	-	Parlamento	5	raça	3
-	-	serelau	3	Souro	7
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Total	28	-	46	-	52

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 58

Luro		Tutuala	
Sukus	Aldeias	sukus	Aldeias
afabubu	2	Mehara	3
Baricafa	3	Tutuala	4
Cotamutu	3	-	
Lacawa	3	-	
Luro	5	-	
Vairoque	5	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

-	-	-	
-	-	-	
-	21	-	7

Tabela

1.1:

Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Lautem.

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Lautem/ Lospalos								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	3	3				3	
2	Administrasaun no Financas	0	0				0	
3	Motorista	1	1				1	
4	Seguransa	0	0				0	
Total		4					4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Lautem

ASET ADN,IP MUNICIPIO LAUTEM								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1	1					
2	Kareta	1	1					
3	Desktop HP / Monitor	1	1					
4	Laptop HP	1	1					
5	Printer Cannon	1	1					
6	UPS	1	1					

7	Armario File	2	2					
8	Armario Tau hena	3	3					
9	Meja escritorio	1	1					
10	Meja han	1	1					
11	Meja TV (kiik)	1	1					
12	Kadeira escritorio	6	6					
13	Kadeira han	4	4					
14	Sofa	1 Set	1 Set					
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3	3 Set	3 Set					
16	Jeleira	1	1					
17	Water Dispenser	1	1					
18	TV + Parabola	1 Set	1 Set					
19	Kipas Angin / AC	4	4					
20	Kompor	0	0					
21	Kompor Gas	1	1					
22	Rack sepatu	2	2					
23	Rack Piring	1	1					
24	Water Pump Sanyo	1	1					

1.3 : Lista Projectos

Projetu hotu ne'ebe akumulula iha lista ne'e bazeia ba dadus projetu ne'ebe sei lao hela no mos projetu ne'ebe abandona ona tinan barak, projetu hirak ne'e fahe tuir lista 1.3.1 Projeto Por Fundus Financiamento, 1.3.2 Projeto Por Sector no 1.3.3 Projeto Por Ministerio

1.3.1 : Lista Proyecto Municipio Lautem Por Fundus Finansiamento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI+Fundu Covid-19+LM-BS+LM-CD+PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Iliomar	7	\$ 1,396,640.73	36.69%
2	Lautem	8	\$ 12,396,944.68	77.05%
3	Loru	13	\$ 10,997,971.32	87.73%
4	Lospalos	25	\$ 10,336,180.96	60.81%
5	Tutuala	4	\$ 6,271,538.99	46.23%
	Grand Total	57	\$ 41,399,276.68	69.80%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Iliomar	2	\$ 496,832.66	72.51%
2	Lautem	3	\$ 11,851,338.35	79.50%
3	Loru	3	\$ 9,750,745.44	96.54%
4	Lospalos	4	\$ 4,693,761.44	80.19%
5	Tutuala	2	\$ 6,113,033.23	47.43%
	Grand Total	14	\$ 32,905,711.12	78.58%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Iliomar		\$ -	0.00%
2	Lautem		\$ -	0.00%
3	Loru		\$ -	0.00%
4	Lospalos	2	\$ 373,420.03	68.10%
5	Tutuala		\$ -	0.00%
	Grand Total	2	\$ 373,420.03	68.10%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Iliomar		\$ -	0.00%
2	Lautem	1	\$ 85,584.79	82.58%
3	Loru		\$ -	0.00%
4	Lospalos	5	\$ 1,017,957.22	46.27%
5	Tutuala		\$ -	0.00%
	Grand Total	6	\$ 1,103,542.01	49.09%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGE M EXECUSAUN (%)
1	Iliomar	2	\$ 620,871.68	24.51%
2	Lautem	2	\$ 265,297.84	22.31%
3	Loru	4	\$ 606,439.09	38.85%
4	Lospalos	9	\$ 3,424,343.46	52.46%
5	Tutuala			0.00%
	Grand Total	17	\$ 4,916,952.07	45.63%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGE M EXECUSAUN (%)
1	Iliomar	1	\$ 188,968.64	98.44%
2	Lautem		\$ -	0.00%
3	Loru		\$ -	0.00%
4	Lospalos	2	\$ 397,338.85	0.00%
5	Tutuala		\$ -	0.00%
	Grand Total	3	\$ 586,307.49	31.73%

1.3.2 : Lista Proyecto Municipio Laudem Por Sector

NO	POR SECTOR	TOTAL MUNICIPIO LAUTEM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 815,564.95	35.07%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	8	\$ 2,714,339.43	42.65%
3	EDUKASAUN	18	\$ 2,166,673.93	2.64%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1,026,193.79	69.98%
5	ESTRADAS	19	\$ 33,198,180.78	77.18%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	3	\$ 601,385.25	61.54%
7	SAUDE	2	\$ 373,420.03	68.10%
8	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	1	\$ 417,933.73	86.66%
9	TURISMO	1	\$ 85,584.79	82.58%
	Grand Total	57	\$ 41,399,276.68	69.80%

NO	POR SECTOR	Iliomar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			0.00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 280,206.72	54.30%
3	EDUKASAUN	3	\$ 278,936.39	0.00%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 432,643.32	72.00%
5	ESTRADAS	2	\$ 404,854.30	12.05%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			0.00%
7	SAUDE			0.00%
8	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			0.00%
9	TURISMO			0.00%
	Grand Total	7	\$ 1,396,640.73	36.69%

NO	POR SECTOR	Lautem		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			0.00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS			0.00%
3	EDUKASAUN	2	\$ 194,723.70	0.00%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			0.00%
5	ESTRADAS	5	\$ 12,116,636.19	78.24%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			0.00%
7	SAUDE			0.00%
8	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			0.00%
9	TURISMO	1	\$ 85,584.79	82.58%
	Grand Total	8	\$ 12,396,944.68	77.05%

NO	POR SECTOR	Loru		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			0.00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS			0.00%
3	EDUKASAUN	6	\$ 640,786.79	0.00%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 593,550.47	68.51%
5	ESTRADAS	6	\$ 9,763,634.06	94.66%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			0.00%
7	SAUDE			0.00%
8	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			0.00%
9	TURISMO			0.00%
	Grand Total	13	\$ 10,997,971.32	87.73%

NO	POR SECTOR	Lospalos		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 815,564.95	35.07%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	7	\$ 2,434,132.71	41.31%
3	EDUKASAUN	5	\$ 893,721.29	6.39%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			0.00%
5	ESTRADAS	4	\$ 4,800,023.00	82.30%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	3	\$ 601,385.25	61.54%
7	SAUDE	2	\$ 373,420.03	68.10%
8	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	1	\$ 417,933.73	86.66%
9	TURISMO			0.00%
	Grand Total	25	\$ 10,336,180.96	60.81%

NO	POR SECTOR	Tutuala		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			0.00%
2	EDIFICIOS PUBLICOS			0.00%
3	EDUKASAUN	2	\$ 158,505.76	0.00%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			0.00%
5	ESTRADAS	2	\$ 6,113,033.23	47.43%
6	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			0.00%
7	SAUDE			0.00%
8	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			0.00%
9	TURISMO			0.00%
	Grand Total	4	\$ 6,271,538.99	46.23%

1.3.3 : Lista Projecto Municipiu Lautem Por Ministerio

NO	DONO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 397,338.85	0.00%
2	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	26	\$ 35,300,659.81	67.99%
3	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 66,333.92	86.14%
4	MINISTERIO FINANCAS	1	\$ 56,783.85	80.85%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 788,921.55	49.09%
6	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 842,595.39	59.63%
7	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	\$ 417,933.73	86.66%
8	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA	1	\$ 710,074.64	49.29%
9	SEFOPE	1	\$ 85,584.79	82.58%
	Grand Total	38	\$ 38,666,226.53	66.67%

NO	DONO PROJECTO	Iliomar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	2	\$ 496,832.66	72.51%
3	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO FINANCAS		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 469,175.36	52.88%
7	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN		\$ -	0.00%
8	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA		\$ -	0.00%
9	SEFOPE		\$ -	0.00%
	Grand Total	4	\$ 966,008.02	62.98%

NO	DONO PROJECTO	Lautem		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 12,116,636.19	69.21%
3	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO FINANCAS		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN		\$ -	0.00%
8	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA		\$ -	0.00%
9	SEFOPE	1	\$ 85,584.79	82.58%
	Grand Total	6	\$ 12,202,220.98	69.30%

NO	DONO PROJECTO	Loru		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	7	\$ 10,357,184.53	88.32%
3	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO FINANCAS		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN		\$ -	0.00%
8	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA		\$ -	0.00%
9	SEFOPE		\$ -	0.00%
	Grand Total	7	\$ 10,357,184.53	88.32%

NO	DONO PROJECTO	Lospalos		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 397,338.85	0.00%
2	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	10	\$ 6,216,973.20	70.46%
3	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 66,333.92	86.14%
4	MINISTERIO FINANCAS	1	\$ 56,783.85	80.85%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 788,921.55	49.09%
6	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 373,420.03	68.10%
7	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	\$ 417,933.73	86.66%
8	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA	1	\$ 710,074.64	49.29%
9	SEFOPE		\$ -	0.00%
	Grand Total	19	\$ 9,027,779.77	64.66%

NO	DONO PROJECTO	Tutuala		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	2	\$ 6,113,033.23	28.25%
3	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO FINANCAS		\$ -	0.00%
5	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN		\$ -	0.00%
8	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA		\$ -	0.00%
9	SEFOPE		\$ -	0.00%
	Grand Total	2	\$ 6,113,033.23	28.25%

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Lautem

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Iliomar	7,401	1,685	1,971	1,828	1,917
Lautém	16,400	4,376	4,645	3,704	3,676
Lospalos	32,336	9,067	9,699	6,814	6,756
Luro	7,266	1,988	1,948	1,677	1,653
Tutuala	3,563	911	1,014	821	817

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan nia laran, husi lista #anexu B hatudu progresu aktual fulan ida ne'e ho nia presentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu prentangen aktual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu husi prosentu antrior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare iha #anexu B, detallu ba back-up #anexu C, no Instrusaun Servisu #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Durante ami nia monitorizasaun ba projecto hotu nebe mak lokaliza iha Munisipio Lautem, ami hasoru obstáclu sira hanesan tuir mai ne'e :

- Rekursu umanu seidauk sufisien (enginheiro,driver,administrasaun).
- Mina La Suficiente
- Ba projecto sira nebe'e ho distancia do'ok no kondisaun estrada mos la dun diak (a'at), hanesan posto administrativo Luro no Iliomar, deficit mai ami atu halo monitorizasaun kada fulan dala tolu ou ha'at
- Ekipamentus apoio servisu sei avaria (Komputador no Laptop).
- Sistema rekolhamentu dados inspeksaun no folder system balun sei dupla hela.
- Kapasidade folder system la to'o atu guarda/save dados inspeksaun tomak ne'ebe barak.
- Kompanhia barak mak servisu la tuir tempo kontratu nebe'e mak iha
- Rekursu umanu ou engenheiro companhia nian la suficiente
- Projeito balun nebe'e mak abandona ou parrado iha tinan barak nia laran

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

Bazeia ba obstákulu ne'ebe iha leten maka ami rekomenda atu :

- Presija aumenta tan rekursu umanu atu bele aselera no fasilita prosesu servisu tomak iha Munisipio.
- Presija Aumenta tan Kupon Mina ba Kareta
- Husu mos ba Superior ADN,I.P atu tolera mos ami hodi halo monitorizasaun ba projeto nebe mak lokaliza iha posto administrativo Luro no Iliomar, se bele kada fulan maksimal dala rua tanba hare ba nia distancia nebe'e mak do'ok no kondisaun Estrada mos a'at
- Presija hadia ka troka ekipamentu apoio servisu ninian hanesan Komputador no Laptop, tamba dala barak sempre avaria/error bainhira ita uja hodi halo servisu.

- Sistema Rekolhamentu dadus inspeksaun ninian sei dupla hela, liu liu hanesan site instruction format ne'ebe iha rua (ida ita terrenu no ida fali iha sistema laran).
- Presija minimiza ka halo rezumu ba rekolhamentu dadus folder system ne'ebe dupla.
- Presija aumenta tan kapasidade/*memory* folder system nian halo boot, atu nune'e be'e akumula dados inspeksaun sira hotu ne'ebe iha.
- Husu mos ba Superior A D N I.P atu se bele koordena ho projeto nain sira hodi fo sansaun ka penalidade ba kompanhia sira nebe mak servico atraza ou abandona servico hodi han tempo to'o tinan 2 ba leten

Note: Asinatura Husi Eng. Municipio Lautem

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Lautem						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Enjineiru	Inocencio dos Reis Costa Maia	208	Enjineiru EPAS		
		Geovanio M. X. Carlos Aleixo	164	Enjineiru ITI		
		Deamantino Henrique Lopes	213	Enjineiru ITI		

		Quico Adelino Junior	240	Enjineiru EPAS		
		Elnino Junior A. Mota	242	Enjineiru ITI		
3		Adonis Julio Fernandes	152	Enjineiru ME		
3	Enjineira	Olivia Soares	112	Enjineira VEBD		
4	Motorista	Delio Abel Manuel Ferreira	159	Motorista		



#ANEXU A (LISTA GERAL)

Localizaçaun Projeto

NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	NARAN KONT.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	STATUS PROJECTO	OBS
1	Rehabilitation of Laleno Road Project Road Section (Sta. 0+000 - 6+210) Maina 2 in Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lautem	Lautem	Corcorcio Irloiyvon, Lda	SSS/117/MOPTC-2016	\$ 4,782,693.68	July 25, 2016	87.20%	71.50%	\$ 3,419,406.76	\$ 1,363,286.92	ON-GOING	
2	Rehabilitation Roads Maina 1 to parlamento 3.916 km	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lautem	Lautem	Samudra Unip, Lda	SSS/100/MOPTC-2017	\$ 3,039,825.77	Sept. 12, 2017	97.04%	86.30%	\$ 2,623,270.63	\$ 416,555.14	ON-GOING	
3	Rural Roads Periodic Maintenance Dasidara Lequidiga 0+000 - 10+000 Chainage Municipality Lautem (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lautem	Lautem	Franam Lindo Unip. Lda	MPW-W-RTQ-190038	\$ 84,077.42	Oct. 29, 2013	56.05%	49.46%	\$ 41,581.46	\$ 42,495.96	ON-GOING	
4	Projectu Konstrusaun Turismu Komunitariu iha COM, Postu Administrativu Lautem	SEFOPE	LM-BS	TURISMO	Lautem	Lautem	Joli Toni Unip Lda	17/CNEFP/XI/2016	\$ 85,584.79	Nov. 3, 2016	91.76%	82.58%	\$ 70,676.00	\$ 14,908.79	PENDENTE	
5	Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 8+000 - 15+200 Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lautem	Lautem	Fian Const. Unip. Lda	SSS/144/MOPTC-2017	\$ 4,028,818.90	Sept. 12, 2017	94.52%	83.86%	\$ 3,378,739.07	\$ 650,079.83	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 1.01%
6	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT DASIDARA - LIQUIDIGA CHAINAGE 0+000-10+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lautem	Lautem	ILIE CHAO, UNIPESAOAL LDA	MPW - W - 210078	\$ 181,220.42	16-Jul-21	30.27%	9.72%	\$ 17,606.18	\$ 163,614.24	ON-GOING	
7	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Euquisi iha Aldeia Barlio Suco Euquisi Postu Administrativu Lautem Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lautem	Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 EUQUISI	-	\$ 105,204.19	Oct. 15, 2021	32.77%	0.00%	\$ -	\$ 105,204.19	ON-GOING	
8	Rehabilitasaun ba EBF Tasi Iibun Lautem iha Aldeia Lautem Suco Parlamento Postu Administrativu Lautem Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lautem	Lautem	MEJD PKRIE EBF TASI IBUN LAUTEM	-	\$ 89,519.51	Oct. 15, 2021	32.18%	0.00%	\$ -	\$ 89,519.51	ON-GOING	
9	Konstrusaun Monumento Nino Konis Santana no Jardim iha Escola Secundaria Nino Konis Santana Publica LAUTEM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	Amor Construction	RDTL 2016	\$ 66,333.92	Dec. 16, 2016	95.58%	86.14%	\$ 57,143.15	\$ 9,190.77	PENDENTE	
10	Konstrusaun foun ba Edificio procuradoria Distrital, Residente no Edificio ba Apoio nian iha Suco Fuiloro, Municipio Lautem	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Cambota	RDTL- D.FeO/APRO/PGR/19.001/2019	\$ 710,074.64	Oct. 17, 2019	81.80%	65.00%	\$ 461,529.62	\$ 248,545.02	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 4.99%
11	Rural Road Rehabilitation Fuiloro - Home Chainage 1+200 - 2+500 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lospalos	Lautem	Paiahara Unipessoal Lda	RT/033/MOP - 2019	\$ 287,376.91	Jan. 22, 2020	50.11%	44.95%	\$ 129,167.94	\$ 158,208.97	ON-GOING	
12	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Lautem, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Lospalos	Lautem	Parapa Bemizuiu Star Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-189	\$ 88,631.06	Nov. 1, 2021	92.09%	73.21%	\$ 64,885.18	\$ 23,745.88	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 10.00%
13	Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct Assalaino to Caicavamoko Sta. 0+000 - 8+000 km municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Salve, Unip. Lda	SSS/143/MOPTC-2017	\$ 4,092,376.19	Sept. 12, 2017	93.60%	82.93%	\$ 3,393,981.58	\$ 698,394.61	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 0.41%
14	Routine Maintenance Lospalos - Souro Chainage 0+000 - 5+800, Routine Maintenance Leuro - Sorulua Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lospalos	Lautem	Afabubo f. Unip Lda.	RFQ/222/MOPTC-2016	\$ 49,805.16	July 11, 2016	96.47%	86.83%	\$ 43,243.66	\$ 6,561.50	ON-GOING	
15	Road Maintenance Sections : Lospalos - Ilomar Section (A082 - 2) Municipality Lautem (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Lero Company, Lda	MPW-W-190120	\$ 219,745.45	Sept. 16, 2019	92.80%	83.52%	\$ 183,526.66	\$ 36,218.79	PENDENTE	
16	Prefurasaun Sistema Be'e mos iha Suku PA'Papa Postu Adm. Lospalos Vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Lospalos	Lautem	Mai Moco	MPWTC-NCB-170007	\$ 140,470.95	Aug. 25, 2017	80.38%	72.34%	\$ 101,622.87	\$ 38,848.08	PENDENTE	
17	Konstrusaun Edificio CDS Lospalos Inklui Armagem no pavimento	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLSAUN	LM-CD	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Lospalos	Lautem	Delta Dini	RDTL 15/MSS/DNFALM-DAD/XII/2015	\$ 417,933.73	July 20, 2015	96.29%	86.66%	\$ 362,176.33	\$ 55,757.40	PENDENTE	
18	Konstrusaun no Instalasaun Sistema Be'e Mos iha Aldeia Homokanu, Foemaa, Nanskuru no EBF Soru Postu Administrativo Lospalos Vila, Municipio Lautem/ 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Lospalos	Lautem	Paza Conis Unip Lda	NCB-MOP-190063	\$ 255,685.00	Dec. 1, 2019	25.15%	22.64%	\$ 57,875.81	\$ 197,809.19	PENDENTE	
19	Konstrusaun Be'e Mos Sistema Pompa no Gravitasau,Tchay Ttilary, Nuhatala, Postu Administrativo Lospalos Vila, Municipio Lautem/ 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Lospalos	Lautem	Ukat Mape Goll Unip Lda	NCB-MOP-190062	\$ 419,409.00	Dec. 1, 2019	33.53%	30.18%	\$ 126,557.78	\$ 292,851.22	PENDENTE	
20	Rural Road Rehabilitation Fuiloro - Home Chainage 0+000 - 1+200 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lospalos	Lautem	Paiahara Unipessoal Lda	RT/032/MOP - 2019	\$ 264,203.18	Jan. 22, 2020	85.48%	74.83%	\$ 197,694.75	\$ 66,508.43	ON-GOING	

Localizasaun Projeto																
NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNL	NARAN COMP.	NARAN KONT.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	STATUS PROJECTO	OBS
21	Building Minor Maintenance East Side (Manatuto, Baucau, Lospalos & Viqueque	MINISTERIO FINANÇAS	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Prify Unip Lda	01 - Prify - MOF/DGCS.2019	\$ 56,783.85	Jan. 15, 2019	80.85%	80.85%	\$ 45,907.81	\$ 10,876.04	PENDENTE	
22	Rural Roads Periodic Maintenance Lospalos Soru Chainage 0 + 000 - 2 + 500, Lautem Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Ulau Unip. Lda	MPW-W: 190110	\$ 216,252.57	March 9, 2019	97.70%	88.04%	\$ 190,387.49	\$ 25,865.08	ON-GOING	
23	Konstrusaun Fatin Izolamentu iha CHC Lospalos Municipiu Lautem	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Lospalos	Lautem	RICS Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-253	\$ 284,788.97	Dec. 9, 2020	91.94%	66.51%	\$ 189,409.82	\$ 95,379.15	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 2.54%
24	New Construction Of Houses For Veteran 8 Unit	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Davinci	001/RDTL/MPIE/AND/DIL/VI/2016	\$ 788,921.55	Aug. 06, 2016	54.54%	49.09%	\$ 387,253.22	\$ 401,668.33	PENDENTE	
25	Konstrusaun Murru Haleu Edifisiu Administasaun Munisipiu no Jardim Municipiu Lautem	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Marvong Construction Unip.Lda	02/KML-PDIM/SMA/X/2021	\$ 145,363.15	8-Jul-21	6.87%	0.00%	\$ -	\$ 145,363.15	ON-GOING	
26	Rehabilitasaun Residencia Adminitrador + Murru no Jardim Municipio Lautem	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Marvong Construction Unip.Lda	01/KML-PDIM/SMA/X/2021	\$ 251,975.70	8-Jul-21	6.18%	0.00%	\$ -	\$ 251,975.70	ON-GOING	
27	R4D RURAL ROADS SPOT IMPROVEMENT LEURO - SOURULUA CHAINAGE 0+000-2+650	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	KOMI ARA UNIPessoal LDA	MPW - W -210080	\$ 271,648.79	16-Jul-21	47.96%	67.23%	\$ 182,621.20	\$ 89,027.59	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 4.46%
28	Projeto Konstrusaun Foun ESTV Lospalos	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Lero Company, Lda	NCB:14/MEJD/DNA/2021	\$ 307,716.65	Nov. 26, 2021	28.16%	0.00%	\$ -	\$ 307,716.65	ON-GOING	
29	Rehabilitasaun ba EBF No-2 Lospalos iha Aldeia Central Suco Fuluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	MEJD PKRIE EBF NO2 LOSPALOS	-	\$ 108,612.72	Oct. 15, 2021	31.24%	0.00%	\$ -	\$ 108,612.72	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 3.61%
30	Rehabilitasaun ba Pre Escolar Ira - Ara iha Aldeia Lospala Suco Fuluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	MEJD PKRIE PRE ESCOLAR IRA-ARA	-	\$ 111,729.45	Oct. 15, 2021	36.17%	0.00%	\$ -	\$ 111,729.45	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 1.34%
31	Rehabilitasaun ba ESG Lere Anan Timur Lospalos iha Aldeia Kuluhun Suco Fuluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	MEJD PKRIE ESG LERE ANAN TIMOR LOSPALOS	-	\$ 209,017.79	Oct. 15, 2021	25.20%	0.00%	\$ -	\$ 209,017.79	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 2.95%
32	Konstrusaun Foun ba ESTV Laico Lospalos Municipio Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	Salve, Unip. Lda	CNB:013/MEJD/DNA/2021	\$ 398,027.41	Feb. 14, 2022	46.42%	0.00%	\$ -	\$ 398,027.41	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 46.42%
33	Complition of Veteranus Houses - Lospalos Municipality Lautem	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Venjus Unip. Lda	NCB/010CD/ADN/IP/MPO/V/DILI/2022	\$ 173,297.17	May 12, 2022	40.01%	63.99%	\$ 110,887.65	\$ 62,409.52	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 40.01%
34	New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Ailembere, and Liarafa, Luro - Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Loru	Lautem	Vairoque Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000432	\$ 593,550.47	Sept. 1, 2016	81.25%	68.51%	\$ 406,628.69	\$ 186,921.78	ON-GOING	
35	Rehabilitation of Road Laivai - Vairoque - Liarava Roads Sta. 0+000 - 7+250 (7.25 km) Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Loru	Lautem	Hoven II, Unip. Lda	SSS/140/MOPTC-2017	\$ 4,207,194.97	Sept. 7, 2017	99.82%	99.82%	\$ 4,199,689.10	\$ 7,505.87	FHO	Projecto Fonaliza ona
36	Rural Roads Periodic Maintenance Luro - Barikafa Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Lautem (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loru	Lautem	Perekiki Mori Unip. Lda	MPW-W-NVB-R-190041	\$ 161,431.38	Aug. 22, 2013	80.22%	72.16%	\$ 116,493.83	\$ 44,937.55	ON-GOING	
37	Rehabilitation of Luro - Buihomau Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Loru	Lautem	Consorcio ASCEM "CACM" Lda"	MPW-W-13-005	\$ 4,950,000.00	Oct. 1, 2012	97.11%	97.11%	\$ 4,806,765.20	\$ 143,234.80	PENDENTE	
38	Road Maintenance Periodic Luro - Kota Mutu - Lakawa Sta. 0+000 6+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loru	Lautem	Cambota	MPW-W:190095	\$ 62,781.36	Aug. 02, 2019	75.93%	64.69%	\$ 40,614.46	\$ 22,166.90	ON-GOING	


Localizasaun Projeto

NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	NARAN KONT.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	STATUS PROJECTO	OBS
39	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - BARIKAFA CHAINAGE 0+000+7+000 LAUTEM MUNICIPALITY	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loru	Lautem	Lili Unip. Lda.	MPW - W 210079	\$ 249,614.09	16-Jul-21	24.86%	18.62%	\$ 46,478.19	\$ 203,135.90	ON-GOING	
40	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - KOTAMUTU - LAKAWA CHAINAGE 0+000-6+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loru	Lautem	ILIE CHAO, UNIPESOAL LDA	MPW - W - 210077	\$ 132,612.26	16-Jul-21	29.56%	24.13%	\$ 32,004.91	\$ 100,607.35	ON-GOING	
41	Rehabilitasaun ba EBF Abere iha Aldeia Abere Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE EBF ABERE	-	\$ 103,671.57	Oct. 15, 2021	26.41%	0.00%	\$ -	\$ 103,671.57	ON-GOING	
42	Rehabilitasaun ba Pre Escolar Amaira Luro iha Aldeia Amaira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE PRE ESCOLAR AMAIRA LURO	-	\$ 88,217.01	Oct. 15, 2021	31.86%	0.00%	\$ -	\$ 88,217.01	ON-GOING	
43	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Barikafa iha Aldeia Sarelari Suco Baricafa Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 BARIKAFA	-	\$ 86,976.71	Oct. 15, 2021	18.11%	0.00%	\$ -	\$ 86,976.71	ON-GOING	
44	Rehabilitasaun ba EBC Luro iha Aldeia Amaira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE EBC LURO	-	\$ 82,737.98	Oct. 15, 2021	28.76%	0.00%	\$ -	\$ 82,737.98	ON-GOING	
45	Rehabilitasaun ba ESG Fernando Lasama de Luro iha Aldeia Amahira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE LURO	-	\$ 182,929.22	Oct. 15, 2021	20.44%	0.00%	\$ -	\$ 182,929.22	ON-GOING	
46	Rehabilitasaun ba EBF Ussuvasu iha Aldeia Ussufasu Suco Baricafa Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE EBF USSUVASU	-	\$ 96,254.30	Oct. 15, 2021	32.14%	0.00%	\$ -	\$ 96,254.30	ON-GOING	
47	New Installation MV, LV Line and House Connection from Ailebere to Pujara, Arafalun and Ledo Ira, Iliomar Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Iliomar	Lautem	Lor Construction Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000363	\$ 432,643.32	July 6, 2016	84.35%	72.00%	\$ 311,503.19	\$ 121,140.13	ON-GOING	
48	Rehabilitation of Road and Drainage Slope Protection Municipality of Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Iliomar	Lautem	Resister Unip.Lda	SSS/140/MOPTC-2016	\$ 64,189.34	Nov. 7, 2016	86.34%	75.98%	\$ 48,771.30	\$ 15,418.04	ON-GOING	PHO
49	New construction of health post and doctor house building in fuat,Lautem,Iliomar	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Iliomar	Lautem	Naesalobu	RDTL-MS-DNA-ICB-21-072	\$ 280,206.72	Aug. 13, 2021	75.87%	54.30%	\$ 152,146.48	\$ 128,060.24	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 8.70%
50	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Ta - Besi Fera Naben - Fuat iha Aldeia Acadiliro Suco Fuat Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Iliomar	Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 TA BESI FERA NABEN-FUAT	-	\$ 80,768.69	Oct. 15, 2021	28.29%	0.00%	\$ -	\$ 80,768.69	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 8.85%
51	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Tirilolo iha Aldeia Tirilolo Suco Tirilolo Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Iliomar	Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 TIRILOLO	-	\$ 81,437.95	Oct. 15, 2021	46.96%	0.00%	\$ -	\$ 81,437.95	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 31.60%
52	Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Iliomar	Lautem	MEJD PKRIE EBC DE ILIOMAR	-	\$ 116,729.75	Oct. 15, 2021	26.25%	0.00%	\$ -	\$ 116,729.75	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 2.13%
53	Roads Maintenance section Lospalos - Iliomar (A08-3) 2021 Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Iliomar	Lautem	Venjus Unip. Lda	MPW-W220015	\$ 340,664.96	Feb. 14, 2022	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 340,664.96	ON-GOING	
54	Road Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Tutuala	Lautem	Consortio Vacu-Hiamoinu Lda	SSS/063/MOPTC-2017	\$ 3,104,481.77	Aug. 25, 2017	65.00%	37.00%	\$ 1,148,524.16	\$ 1,955,957.61	ON-GOING	
55	Rehabilitation Road Section : Jct. Tutuala Roads (C2) Package 1 Sta. 3+850 - 7+725 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Tutuala	Lautem	Hamutuk Unipessoal, Lda	SSS/083/MOPTC-2017	\$ 3,008,551.46	Aug. 28, 2017	68.11%	58.19%	\$ 1,750,607.13	\$ 1,257,944.33	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 17.23%
56	Rehabilitasaun ba EBC Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Tutuala	Lautem	MEJD PKRIE EBC MEHARA	-	\$ 66,995.57	Oct. 15, 2021	29.85%	0.00%	\$ -	\$ 66,995.57	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 1.57%
57	Rehabilitasaun ba EPE Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Tutuala	Lautem	MEJD PKRIE EPE MEHARA	-	\$ 91,510.19	Oct. 15, 2021	30.31%	0.00%	\$ -	\$ 91,510.19	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Julho Aumenta 2.16%
TOTAL									\$ 41,399,276.68				\$ 28,897,379.26	\$ 12,501,897.42		


Prepara Husi :




1. Eng. Inocencio doa Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Lautem,ADN,I.P



2. Eng. Geovanio M.X.C. Aleixo
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P



3. Eng. Desarmindo Henrique Lopes
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P



4. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

Certifika Husi :



Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De Qualidade ADN,I.P



#ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN

LOKALIZASAUN PROJETU										Jul-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress	This Month Progress	Kumulativo Progress
1	Rehabilitation of Laleno Road Project Road Section (Sta. 0+000 - 6+210) Maina 2 in Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lautem	Lautem	Corcorcio Irloyvon, Lda	SSS/117/MOPTC-2016	\$ 4,782,693.68	87.20%	0.00%	87.20%
2	Rehabilitation Roads Maina 1 to parlamento 3.916 km	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lautem	Lautem	Samudra Unip, Lda	SSS/100/MOPTC-2017	\$ 3,039,825.77	97.04%	0.00%	97.04%
3	Rural Roads Periodic Maintenance Dasidara Lequidiga 0+000 - 10+000 Chainage Municipality Lautem (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Lautem	Lautem	Franam Lindo Unip. Lda	MPW-W-RTQ-190038	\$ 84,077.42	56.05%	0.00%	56.05%
4	Projectu Konstrusaun Turismu Komunitariu iha COM, Postu Administrativu Lautem	SEFOPE	LM	TURISMO	Lautem	Lautem	Joli Toni Unip Lda	17/CNEFP?XI/2016	\$ 85,584.79	91.76%	0.00%	91.76%
5	Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 8+000 - 15+200 Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lautem	Lautem	Fian Const. Unip. Lda	SSS/144/MOPTC-2017	\$ 4,028,818.90	93.51%	1.01%	94.52%
6	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT DASIDARA - LIQUIDIGA CHAINAGE 0+000-10+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lautem	Lautem	ILIE CHAO, UNIPESOAAL LDA	MPW - W - 210078	\$ 181,220.42	30.27%		30.27%
7	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Euquisi iha Aldeia Barlio Suco Euquisi Postu Administrativu Lautem Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lautem	Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 EUQUISI	-	\$ 105,204.19	32.77%	0.00%	32.77%
8	Rehabilitasaun ba EBF Tasi Ibun Lautem iha Aldeia Lautem Suco Parlamento Postu Administrativu Lautem Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lautem	Lautem	MEJD PKRIE EBF TASI IBUN LAUTEM	-	\$ 89,519.51	32.18%		32.18%
9	Konstrusaun Monumento Nino Konis Santana no Jardim iha Escola Secundaria Nino Konis Santana Publica LAUTEM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	Amor Construction	RDTL 2016	\$ 66,333.92	95.58%	0.00%	95.58%
10	Konstrusaun Edificio PGR Municipio Lautem	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	LM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Cambota	RDTL- D.FeO/APRO/PGR/19.001/2019	\$ 710,074.64	76.81%	4.99%	81.80%
11	Rural Road Rehabilitation Fuioro - Home Chainage 1+200 - 2+500 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lospalos	Lautem	Paiahara Unipessoal Lda	RT/033/MOP - 2019	\$ 287,376.91	50.11%	0.00%	50.11%
12	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Lautem, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM	SAUDE	Lospalos	Lautem	Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-189	\$ 88,631.06	82.09%	10.00%	92.09%

LOKALIZASAUN PROJETU										Jul-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress	This Month Progress	Komulativo Progress
13	Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct Assalaino to Caicavamoko Sta. 0+000 - 8+000 km municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Salve, Unip. Lda	SSS/143/MOPTC-2017	\$ 4,092,376.19	93.19%	0.41%	93.60%
14	Routine Maintanance Lospalos - Souro Chainage 0+000 - 5+800, Routine Maintanance Leuro - Sorulua Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lospalos	Lautem	Afabubo f. Unip Lda.	RFQ/222/MOPTC-2016	\$ 49,805.16	96.47%	0.00%	96.47%
15	Road Maintenance Sections : Lospalos - Iliomar Section (A082 - 2) Municipality Lautem (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Lero Company, Lda	MPW-W-190120	\$ 219,745.45	92.80%	0.00%	92.80%
16	Prefurasau Sistema Be'e mos iha Suku PA'Papa Postu Adm. Lospalos Vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	AGUA E SANEAMENTO	Lospalos	Lautem	Mai Moco	MPWTC-NCB-170007	\$ 140,470.95	80.38%	0.00%	80.38%
17	Konstrusaun Edificio CDS Lospalos Inklui Armagem no pavimento	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Lospalos	Lautem	Delta Dini	RDTL 15/MSS/DNFALM-DAD/XII/2015	\$ 417,933.73	96.29%	0.00%	96.29%
18	Konstrusaun no Instalasaun Sistema Be'e Mos iha Aldeia Homokanu, Foemaa, Nanakuru no EBF Soru Posto Administrativo Lospalos Vila, Municipio Lautem/ 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	AGUA E SANEAMENTO	Lospalos	Lautem	Paza Conis Unip Lda	NCB-MOP-190063	\$ 255,685.00	25.15%	0.00%	25.15%
19	Konstrusaun Be'e Mos Sistema Pompa no Gravitasaun,Tchay Titilary, Nuhalaria, Posto Administrativo Lospalos Vila, Municipio Lautem/ 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	AGUA E SANEAMENTO	Lospalos	Lautem	Ukat Mape Goll Unip Lda	NCB-MOP-190062	\$ 419,409.00	33.53%	0.00%	33.53%
20	Rural Road Rehabilitation Fuiloro - Home Chainage 0+000 - 1+200 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lospalos	Lautem	Paiahara Unipessoal Lda	RT/032/MOP - 2019	\$ 264,203.18	85.48%		85.48%
21	Building Minor Maintenance East Side (Manatuto, Baucau, Lospalos & Viqueque	MINISTERIO FINANÇAS	LM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Prify Unip Lda	01 - Prify - MOF/DGCS.2019	\$ 56,783.85	80.85%	0.00%	80.85%
22	Rural Roads Periodic Maintenance Lospalos Soru Chainage 0 + 000 - 2 + 500, Lautem Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	Uiau Unip. Lda	MPW-W: 190110	\$ 216,525.57	97.70%	0.00%	97.70%
23	Konstrusaun Fatin Izolamentu iha CHC Lospalos Municipiu Lautem	MINISTERIO SAUDE	LM	SAUDE	Lospalos	Lautem	RICS Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-253	\$ 284,788.97	89.40%	2.54%	91.94%
24	New Construction Of Houses For Veteran 8 Unit	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Davinci	001/RDTL/MP/IE/AND/DIL/VI/2016	\$ 788,921.55	54.54%		54.54%
25	Konstrusaun Murru Haleu Edifisiu Administasaun Munisipiu no Jardim Municipiu Lautem	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Marvong Construction Unip.Lda	02/KML-PDIM/SMA/X2021	\$ 145,363.15	6.87%		6.87%
26	Rehabilitasaun Residencia Adminitrador + Murru no Jardim Municipio Lautem	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Marvong Construction Unip.Lda	01/KML-PDIM/SMA/X/2021	\$ 251,975.70	6.18%		6.18%

LOKALIZASAUN PROJETU										Jul-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress	This Month Progress	Komulativo Progress
27	R4D RURAL ROADS SPOT IMPROVEMENT LEURO - SOURULUA CHAINAGE 0+000-2+650	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lospalos	Lautem	KOMI ARA UNIPESOAAL LDA	MPW - W -210080	\$ 271,648.79	43.50%	4.46%	47.96%
28	Projetu Konstrusaun Foun ESTV Lospalos	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Lero Company, Lda	NCB:14/MEJD/DNA/2021	\$ 307,716.65	0.00%	0.00%	0.00%
29	Rehabilitasaun ba EBF No-2 Lospalos iha Aldeia Central Suco Fuiuro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	MEJD PKRIE EBF NO2 LOSPALOS	-	\$ 108,612.72	31.24%	3.61%	34.84%
30	Rehabilitasaun ba Pre Escolar Ira - Ara iha Aldeia Lospala Suco Fuiuro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	MEJD PKRIE PRE ESCOLAR IRA-ARA	-	\$ 111,729.45	36.17%	1.34%	37.51%
31	Rehabilitasaun ba ESG Lere Anan Timur Lospalos iha Aldeia Kuluhun Suco Fuiuro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	MEJD PKRIE ESG LERE ANAN TIMOR LOSPALOS	-	\$ 209,017.79	25.20%	2.95%	28.16%
32	Konstrusaun Foun ba ESTV Laico Lospalos Municipio Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Lospalos	Lautem	Salve, Unip. Lda	CNB:013/MEJD/DNA/2021	\$ 398,027.41	0.00%	46.42%	46.42%
33	Complition of Veteranus Houses - Lospalos Municipality Lautem	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Lospalos	Lautem	Venjus Unip. Lda	NCB/010CD/ADN,IP/MPO/V/DI LI/2022	\$ 173,297.17	0.00%	40.01%	40.01%
34	New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Ailembere, and Liarafa, Luro - Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Loru	Lautem	Vairoque Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000432	\$ 593,550.47	81.25%		81.25%
35	Rehabilitation of Road Laivai - Vairoque - Liarava Roads Sta. 0+000 - 7+250 (7.25 km) Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Loru	Lautem	Hoven II, Unip. Lda	SSS/140/MOPTC-2017	\$ 4,207,194.97	99.82%		99.82%
36	Rural Roads Periodic Maintenance Luro - Barikafa Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Lautem (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Loru	Lautem	Perekiki Mori Unip. Lda	MPW-W-NVB-R-190041	\$ 161,431.38	80.22%	0.00%	80.22%
37	Rehabilitation of Luro - Buihomau Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Loru	Lautem	Consortio ASCEM "CACM" Lda"	MPW-W-13-005	\$ 4,950,000.00	97.11%		97.11%
38	Road Maintenance Periodic Luro - Kota Mutu - Lakawa Sta. 0+000 6+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM	ESTRADAS	Loru	Lautem	Cambota	MPW-W:190095	\$ 62,781.36	75.93%		75.93%
39	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - BARIKAFKA CHAINAGE 0+000+7+000 LAUTEM MUNICIPALITY	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loru	Lautem	Lili Unip. Lda.	MPW - W 210079	\$ 249,614.09	24.86%		24.86%
40	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - KOTAMUTU - LAKAWA CHAINAGE 0+000-6+500	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Loru	Lautem	ILIE CHAO, UNIPESOAAL LDA	MPW - W - 210077	\$ 132,612.26	29.56%		29.56%
41	Rehabilitasaun ba EBF Abere iha Aldeia Abere Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE EBF ABERE	-	\$ 103,671.57	26.41%		26.41%
42	Rehabilitasaun ba Pre Escolar Amaira Luro iha Aldeia Amaira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE PRE ESCOLAR AMAIRA LURO	-	\$ 88,217.01	31.86%		31.86%
43	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Barikafa iha Aldeia Sarelari Suco Baricafa Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 BARIKAFKA	-	\$ 86,976.71	18.11%		18.11%

LOKALIZASAUN PROJETU										Jul-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	Previous Progress	This Month Progress	Kumulativo Progress
44	Rehabilitasaun ba EBC Luro iha Aldeia Amaira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE EBC LURO	-	\$ 82,737.98	28.76%		28.76%
45	Rehabilitasaun ba ESG Fernando Lasama de Luro iha Aldeia Amahira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE LURO	-	\$ 182,929.22	20.44%		20.44%
46	Rehabilitasaun ba EBF Ussuvasu iha Aldeia Ussufasu Suco Baricafa Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Loru	Lautem	MEJD PKRIE EBF USSUVASU	-	\$ 96,254.30	32.14%		32.14%
47	New Installation MV, LV Line and House Connection from Ailebere to Pujiara, Arafalun and Ledo Ira, Iliomar Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Iliomar	Lautem	Lor Construction Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000363	\$ 432,643.32	84.35%		84.35%
48	Additional Emergency Iliomar Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Iliomar	Lautem	Resister Unip.Lda	SSS/140/MOPTC-2016	\$ 64,189.34	86.34%		86.34%
49	NEW CONSTRUCTION OF HEALTH AND DOCTOR HOUSE IN FUAT, LAUTEM, TIMOR LESTE	MINISTERIO SAUDE	LM	SAUDE	Iliomar	Lautem	Naesalobu Unip. Lda		\$ 280,206.72	67.17%	8.70%	75.87%
50	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Ta - Besi Fera Naben - Fuat iha Aldeia Acadiliro Suco Fuat Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Iliomar	Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 TA BESI FERA NABEN-FUAT	-	\$ 80,768.69	23.44%	4.85%	28.29%
51	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Tirilolo iha Aldeia Tirilolo Suco Tirilolo Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Iliomar	Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 TIRILOLO	-	\$ 81,437.95	15.36%	31.60%	46.96%
52	Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Iliomar	Lautem	MEJD PKRIE EBC DE ILIOMAR	-	\$ 116,729.75	24.12%	2.13%	26.25%
53	Roads Maintenance section Lospalos - Iliomar (A08-3) 2021 Lautem Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Iliomar	Lautem	Venjus Unip. Lda	MPW-W220015	\$ 340,664.96	0.00%		0.00%
54	Road Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Tutuala	Lautem	Consorcio Vacu-Hiamoinu Lda	SSS/063/MOPTC-2017	\$ 3,104,481.77	65.00%	0.00%	65.00%
55	Rehabilitation Road Section : Jct. Tutuala Roads (C2) Package 1 Sta. 3+850 - 7+725 Municipality Lautem	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Tutuala	Lautem	Hamutuk Unipessoal, Lda	SSS/083/MOPTC-2017	\$ 3,008,551.46	50.89%	17.23%	68.11%
56	Rehabilitasaun ba EBC Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Tutuala	Lautem	MEJD PKRIE EBC MEHARA	-	\$ 66,995.57	28.28%	1.57%	29.85%
57	Rehabilitasaun ba EPE Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Tutuala	Lautem	MEJD PKRIE EPE MEHARA	-	\$ 91,510.19	28.15%	2.16%	30.31%

Inspeksaun Husi :

1. Eng. Inocencio doa Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Lautem,ADN,I.P

4. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Porjeito ME, ADN, I.P

2. Eng. Geovanio M.X.C. Aleixo
Eng. ba Porjeito Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

3. Eng. Deamentino Henrique Lopes
Eng. ba Porjeito Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

Verifika Husi :

Eng. Remigio da C. S. dos Santos
Eng. Senior ba Porjeito Insfrasturctura e Irigasaun, ADN, I.P

Eng/Arch.Francisco Xavier de D. Jeronimo
Senior Engeneiro ba Porjeito Edificio Publico Beé no Saneamento,ADN,I.P

Eng. Deolindo de Fatima Marques
ChefeSaksaun ME& ITC, ADN, I.P

Certifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-1) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Laleno Road Project Road Section (Sta. 0+000 - 6+210) Maina 2 in Lautem**

No. kontratu : SSS/117/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 6/07/2022

Fatin Inspesaun : Maina II

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.882833, Latetude : 8.4679021

End Point : Long : 126.84887, Latetude : 8.517178

Naran Inspector : **1. Eng. Geovanio M.X.C. Aleixo**

2. Eng. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araújo Mota

Sketch & Foto Desenho

Estrada hetan defeitos no agora companhia
seidauk hadia

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-1) Back-up Data


Naran Projeto : **Rehabilitation of Laleno Road Project Road Section (Sta. 0+000 - 6+210) Maina 2 in Lautem**

No. kontratu : **SSS/117/MOPTC-2016**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Estrada hetan defeitos no agora kompanhia
seidauk hadia

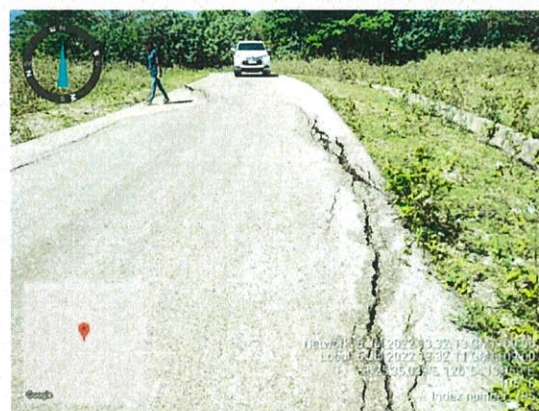



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-2) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation Roads Maina 1 to parlamento 3.916 km**
No. kontratu : **SSS/100/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : 6/7/2022

Fatin Inspesaun : Maina I to Parlamento

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.9186733, Latetude : 8.351191667

End Point : Long : 126.9239417, Latetude : 8.378418333

Naran Inspector : **1. Geovanio M.X.C. Aleixo**

2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araújo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ON GOING Maibe actividade iha tereno
ba fulan Julho laiha





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-2)

Back-up Data


Naran Projeto : **Rehabilitation Roads Maina 1 to parlamento 3.916 km**

No. kontratu : **SSS/100/MOPTC-2017**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ON GOING Maibe actividade iha tereno
ba fulan Julho laiha

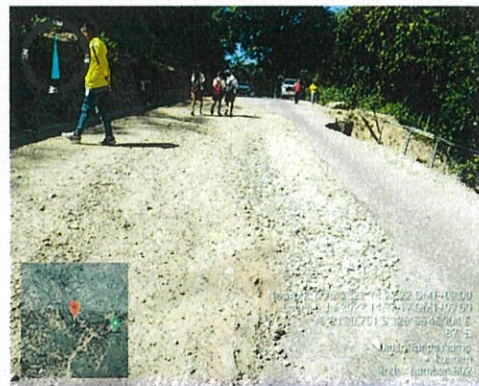



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-5)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 8+000 - 15+200 Lautem Municipality**
No. kontratu : **SSS/144/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : 6/07/2022

Fatin Inspesaun : Assalaino to Caicavamoko

Koordinadas :

Start Point : Long : 127.014768, Latetude : 8.380344

End Point : Long : 127.056664, Latetude : 8.355725

Naran Inspector : **1. Geovanio M.X.Carlos Aleixo**

2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araujo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ON GOING, Maibe actividade iha tereno
ba fulan ne'e laiha.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to
Caicavamoko Sta. 8+000 - 15+200 Lautem Municipality
No. kontratu : SSS/144/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

ON GOING, Maibe actividade iha terreno
ba fulan ne'e laiha.

Observasaun iha terreno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to
Caicavamoko Sta. 8+000 - 15+200 Lautem Municipality
No. kontratu : SSS/144/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 20/07/2022

Fatin Inspesaun : Assalaino to Caicavamoko

Koordinadas :

Start Point : Long : 127.014768, Latetude : 8.380344

End Point : Long : 127.056664, Latetude : 8.355725

Naran Inspector : 1. Geovanio M.X.C. Aleixo

2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araujo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Inspeksaun Pagamento 100%





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA-5)


Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to
Caicavamoko Sta. 8+000 - 15+200 Lautem Municipality
No. kontratu : SSS/144/MOPTC-2017


Sketch & Foto Desenho



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

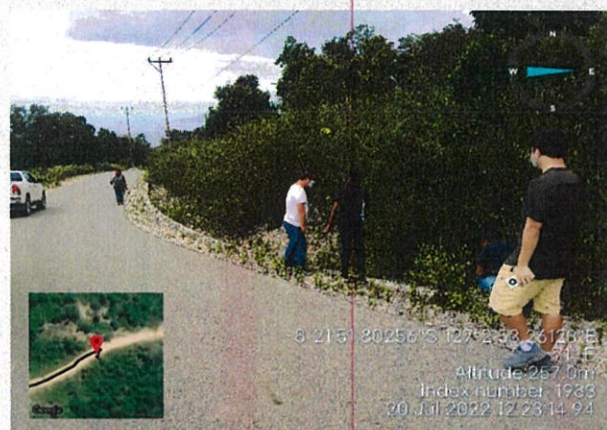

Inspeksaun Pagamento 100%

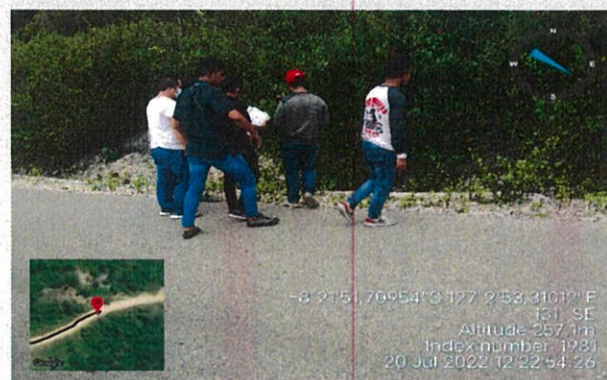



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LA-5)

Contract No. : SSS/144/MOPTC-2017
Project Location : Jct. Assalaino To Com (C3) Jct Caicavamoko to Com (8+000 -
15+242.68 Km)
Contractor : FIAN Construction Unipessoal, Lda.

SUMMARY

	ORIGINAL CONTRACT		Resultado Verifikasaun AND		PREVIOUS		PROGRESS JULHO		TO DATE		PERCENTAGE (%)
No	Item Description	Amount Contract	Amount Revised	Amount Previous	Percentage (%)	Amount This billing	Percentage (%)	Amount to Date			
100	GERERAL REQUIREMENTS	\$ 63,845.00	\$ 63,845.00	\$ 40,260.00	1.06%	\$ 23,585.00	0.25%	\$ 63,845.00	1.31%		
200	EART WORKS	\$ 488,387.07	\$ 812,680.49	\$ 808,926.95	20.36%	\$ 3,372.53	0.09%	\$ 812,299.48	20.45%		
300	SUB BASE AND BASE COURSE WORKS	\$ 701,572.70	\$ 1,118,939.02	\$ 1,118,952.81	27.77%	\$ -	0.00%	\$ 1,118,952.81	27.77%		
400	SURFACE COURSE AND PAVEMENT WORKS	\$ 1,242,424.71	\$ 1,251,339.55	\$ 1,249,724.43	31.02%	\$ -	0.00%	\$ 1,249,724.43	31.02%		
500	CONCRETE BRIDGE CONSTRUCTION WORKS	\$ 10,468.82	\$ 4,702.98	\$ 3,029.61	0.08%	\$ 1,668.96	0.04%	\$ 4,698.57	0.12%		
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION	\$ 1,084,049.38	\$ 146,016.73	\$ 125,054.98	3.06%	\$ 19,537.60	0.51%	\$ 144,592.59	3.57%		
A	Construction Cost	\$ 3,590,747.68	\$ 3,397,523.78	\$ 3,345,948.78	83.34%	\$ 48,164.10	0.90%	\$ 3,394,112.88	84.24%		
B	Construction Fee & Overhead (10% of A)	\$ 359,074.77	\$ 339,752.38	\$ 334,594.88	8.33%	\$ 4,816.41	0.09%	\$ 339,411.29	8.42%		
C	Construction Tax (2% of A + B)	\$ 78,996.45	\$ 74,745.52	\$ 73,610.87	1.83%	\$ 1,059.61	0.02%	\$ 74,670.48	1.85%		
D	Grand Total (A + B +C)	\$ 4,028,818.90	\$ 3,812,021.67	\$ 3,754,154.53	93.51%	\$ 54,040.12	1.01%	\$ 3,808,194.65	94.52%		

Inspeksaun Husi :

(Geovani M.X.C. Aleixo)
Engenheiro ba Projeto ITI Municipio
Lautem ADN,I.P

(Deamantino H. Lopes)
Engenheiro ba Projeto ITI Municipio
Lautem ADN,I.P


Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun ADN,I.P

Sertifika Husi :

(Eng^a. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Koordenadora Da Unidade de Controlo E Validação De
Qualidade ADN,I.P

(Elnino Junior Araujo Mota)
Engenheiro ba Projeto ITI Municipio
Lautem ADN,I.P

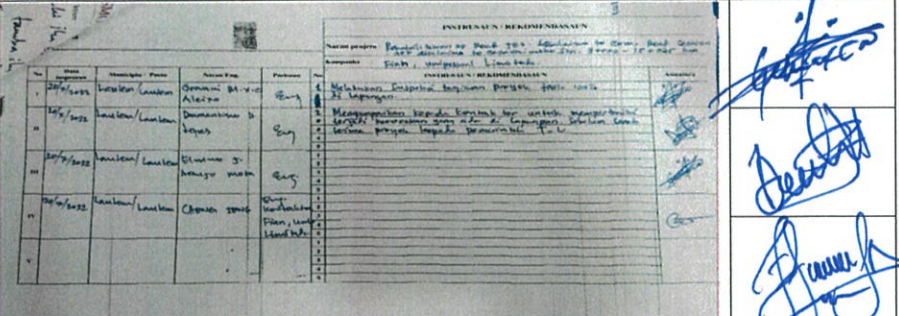					# ANEXU D (LA - 5)		
					Naran projeto : Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 8+000 - 15+200 Lautem Municipality		
					Kompanha : Fian Const. Unip. Lda		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20/07/2022	Lautem/Lautem	Geovanio M X C Aleixo	Teknik	1	Melakukan inspeksi tagihan proyek fisik 100% di lapangan.	
			Deamantino H Lopes				
			Elnino Junior Araujo Mota		2	Menyampaikan kepada kontraktor untuk memperbaiki semua terjadinya kerusakan yang ada di lapangan, sebelum serah terimah proyek kepada pemerintah T-L.	



#ANEXU C1 (LO-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifício PGR Municipio Lautem**

No. kontratu : **RDTL-D.FeO/APRO/PGR/19.001/2019**

Data Inspesaun : 07/08/2022, 14/08/2022

Fatin Inspesaun : Lospalos-Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.2946073 Latetude : 126.5929706.

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2. Quico Adelino Junior

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Peogresso servisu ba projeitu

refere iha fulan ida ne'e nia

laran maka ba servisu

landscaping ninian komesa hahu

ona ho servisu drenajem haleu

uma huun.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 (LO-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edifício PGR Municipio Lautem**

No. kontratu : **RDTL-D.FeO/APRO/PGR/19.001/2019**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Ba Support Building ninian iha fulan ida ne'e servisu monta odamatan no janela remata ona no agora dadauk tama ona ba iha servisu monta asesoria elektrika sira nian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Ba Residence Building ninian iha fulan ida ne'e hahu monta ona odamata tahan inklui ninia asesoria sira.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 (LO-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Edificio PGR Municipio Lautem**

No. kontratu : **RDTL-D.FeO/APRO/PGR/19.001/2019**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....
Ba Office building ninan
progressu iha fulan ida ne'e maka
agora tama ona ba iha servisu
monta rangka plafon ninian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (LO-2)

SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT				INSPECTION PROGRESS REPORT BY ADN.IP					
				PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
NU.	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	WEIGHT (%)	AMOUNT (USD)	WEIGHT (%)	AMOUNT (USD)	WEIGHT (%)	AMOUNT (USD)	WEIGHT (%)
I	PREPARATION WORK	\$ 3,180.80	0.45%	\$ 3,080.80	0.43%	\$ -	0.00%	\$ 3,080.80	0.43%
II	OFFICE BUILDING WORK	\$ 227,425.60	32.03%	\$ 138,925.66	19.56%	\$ 17,917.34	2.52%	\$ 156,843.01	22.09%
III	RESIDENT BUILDING WORK	\$ 86,425.70	12.17%	\$ 79,367.79	11.18%	\$ 1,143.75	0.16%	\$ 80,511.54	11.34%
IV	WAREHOUSE, ARCHIVE AND MEETING ROOM BUILDING WORK	\$ 95,089.89	13.39%	\$ 81,811.64	11.52%	\$ 7,366.00	1.04%	\$ 89,177.64	12.56%
V	GENSET BUILDING WORK	\$ 9,347.57	1.32%	\$ 7,976.98	1.12%	\$ -	0.00%	\$ 7,976.98	1.12%
VI	SECURITY POST BUILDING WORK	\$ 7,703.47	1.08%	\$ 6,935.98	0.98%	\$ 255.00	0.04%	\$ 7,190.98	1.01%
VII	LANDSCAP WORK	\$ 83,020.90	11.69%	\$ 72,572.89	10.22%	\$ -	0.00%	\$ 72,572.89	10.22%
VIII	INSTALL WATER, ELECTRICAL, INTERNET TELEPHON LINE TO SITE WORK	\$ 700.00	0.10%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
IX	CORIDOR BUILD	\$ 15,000.00	2.11%	\$ 3,750.00	0.53%	\$ 3,750.00	0.53%	\$ 7,500.00	1.06%
X	OVERHEAD	\$ 20,400.00	0.00%	\$ 13,540.00	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 13,540.00	1.91%
a	CONSTRUCTION COST (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)_ft	\$ 614,319.64	86.51%	\$ 473,789.52	66.72%	\$ 31,575.84	4.45%	\$ 505,365.36	71.17%
b	OVERHEAD (X)	\$ 20,400.00	2.87%	\$ 13,540.00	1.91%	\$ -	0.00%	\$ 13,540.00	1.91%
c	CONSTRUCTION COST + OVERHEAD (a+b) / ft	\$ 634,719.64	89.39%	\$ 487,329.52	68.63%	\$ 31,575.84	4.45%	\$ 518,905.36	73.08%
d	CONTRACTOR FEE 10%	\$ 61,431.96	8.65%	\$ 47,378.95	6.67%	\$ 3,157.58	0.44%	\$ 50,536.54	7.12%
e	TAX 2%	\$ 13,923.03	1.96%	\$ 10,694.17	1.51%	\$ 694.67	0.10%	\$ 11,388.84	1.60%
f	GRAND TOTAL (c+d+e)	\$ 710,074.64	100.00%	\$ 545,402.64	76.81%	\$ 35,428.10	4.99%	\$ 580,830.73	81.80%

Prepara Husi :


(Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Baucau, ADN, I.P


(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Baucau, ADN, I.P

Verifika Husi :


(Arq. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Eng. Senior ba Projeto Edificio
Publico, Agua e Saneamento ADN, I.P.

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana Da Costa Maia)
Coordenadora da Unidade de
Controlo e Validação de Qualidade
ADN, I.P.

 				
--	--	--	--	--



#ANEXU C1 (LO-3) Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Fuiloro - Home Chainage 1+200 - 2+500**
Municipality **Lautem**
No. kontratu : **SRT/033/MOP - 2019**

Data Inspesaun : 08/07/2022

Fatin Inspesaun : Fuiloro - Home

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.976221, Latetude : 8.508212

End Point : Long : 126.966425, Latetude : 8.501801

Naran Inspector : 1. Eng. Geovanio M.X. Carlos Aleixo
2. Eng. Deamantino H. Lopes
3. Elnino Junior Araújo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha terreno no Foto Aktual

ON GOIN, maibe aktividade iha terreno ba
fulan ne'e laiha.





#ANEXU C1 (LO-3) Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Fuloro - Home Chainage 1+200 - 2+500**
Municipality Lautem
No. kontratu : **SRT/033/MOP - 2019**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ON GOIN, maibe aktividade iha terreno ba
fulan ne'e laiha.





#ANEXU C1 (LO-3) Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation Fuiloro - Home Chainage 1+200 - 2+500

Municipality Lautem

No. kontratu : SRT/033/MOP - 2019

Data Inspesaun : 15/07/2022

Fatin Inspesaun : Fuiloro - Home

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.976221, Latetude : 8.508212

End Point : Long : 126.966425, Latetude : 8.501801

Naran Inspector : 1. Eng. Geovanio M.X. Carlos Aleixo

2. Eng. Deamantino H. Lopes

3. Elnino Junior Araújo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ON GOING, Prepara material ba item servisu
makadam.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LO-3) Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Fuloro - Home Chainage 1+200 - 2+500**

Municipality Lautem

No. kontratu : SRT/033/MOP - 2019

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ON GOING, Prepara material ba item servisu
makadam.





#ANEXU C1 (LO-4)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Laboratory for Covid 19 at Lautem, Ministry of Health, Timor Leste

No. kontratu : RDTL-MS-DNA-RBK-20-189

Data Inspesaun : 28/07/2022

Fatin Inspesaun : Lospalos Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.3121561 Latetude : 126.5953334

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1. Inocencio dos Reis Costa Maia

2. Quico Adelino Junior

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progressu fijiku ba projetu ida ne'e

la iha ona tamba projetu refere

entrega tiha ona ba iha Projetu nain

no iha fulan ida ne'e halo ona

inagurasaun ba projetu refere.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (LO-4)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Laboratory for Covid 19 at Lautem, Ministry of Health, Timor Leste


No. kontratu : RDTL-MS-DNA-RBK-20-189

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

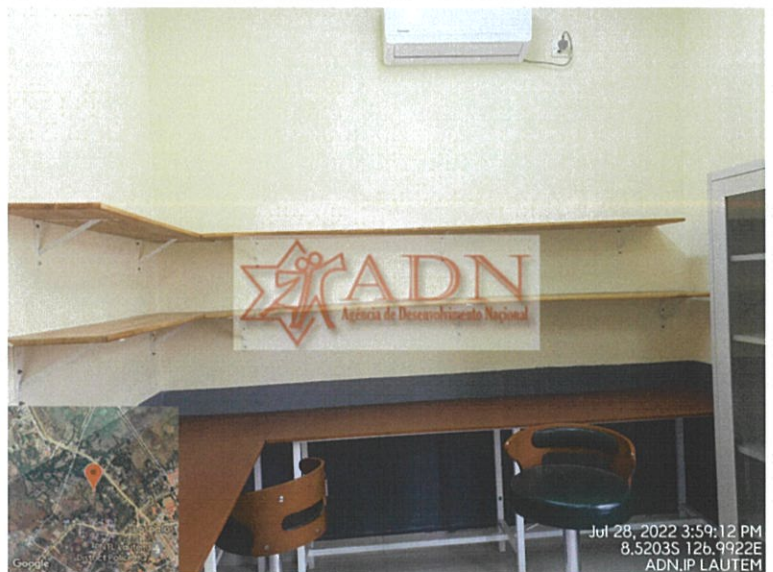

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual








ANEXU D (LO - 3)

Naran projeto : Rural Road Rehabilitation Fuloro - Home Chainage 1+200 - 2+500 Municipality Lautem

Kompanha : Paiahara Unipessoal Lda

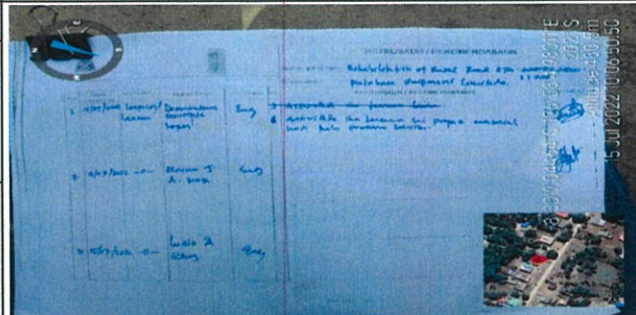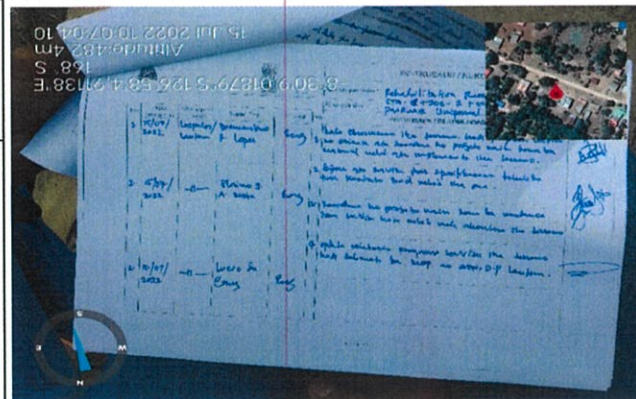No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura	
I	8/07/2022	Lautem / Lospalos	Geovanio M. X. Carlos Aleixo	Eng. ITI	1	Actividade iha terenu sei prepara material hodi halo prosessu servisu.			
			2		Halo observasaun iha terrenu hodi halo prosessu servisu no orienta atu koordena ho projetu, nain konaba material ne'ebe atu implementa iha terrenu.				
			3		Sujere atu servisu tuir espesifikasaun tekniku tuir kontratu BOQ ne'ebe iha.				
2	15/7/2022		Geovanio M. X. Carlos Aleixo		4	Koordena ho projetu nain konaba mudansa item servisu hotu ne'ebe mak akontese iha terrenu.			
			Deamantino H. Lopes		5	Update relatorio progresessu servisu iha terrenu, hodi submete ba MOP no ADN, IP Lautem			
			Elnino Junior Araujo Mota						



#ANEXU C2 (LO-4)

SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT				INPECTION PROGRESS REPORT BY ADN.IP					
				PREVOIUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
NO	DESCRIPTION	Amount (USD)	Weight (%)	TOTAL AMOUNT (USD)	Weight (%)	TOTAL AMOUNT (USD)	Weight (%)	TOTAL AMOUNT (USD)	Weight (%)
I	PREPARATION WORKS	\$ 3,465.45	3.91%	\$ 2,765.43	3.12%	\$ 700.00	0.79%	\$ 3,465.43	3.91%
II	FUNDATION WORKS	\$ 4,295.19	4.85%	\$ 4,295.15	4.85%	\$ -	0.00%	\$ 4,295.15	4.85%
III	CONCRETE WORKS	\$ 11,711.27	13.21%	\$ 10,112.70	11.41%	\$ 1,596.18	1.80%	\$ 11,708.89	13.21%
IV	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 6,480.07	7.31%	\$ 6,026.94	6.80%	\$ 453.13	0.51%	\$ 6,480.07	7.31%
V	CARPENTER WORKS	\$ 5,345.00	6.03%	\$ 5,345.00	6.03%	\$ -	0.00%	\$ 5,345.00	6.03%
VI	ROOFING WORKS	\$ 8,044.97	9.08%	\$ 8,044.97	9.08%	\$ -	0.00%	\$ 8,044.97	9.08%
VII	CEILING WORKS	\$ 2,438.91	2.75%	\$ 2,438.90	2.75%	\$ -	0.00%	\$ 2,438.90	2.75%
VIII	FLOOR TILE WORKS	\$ 3,507.78	3.96%	\$ 3,507.77	3.96%	\$ -	0.00%	\$ 3,507.77	3.96%
IX	ELECTRICAL WORKS	\$ 5,022.00	5.67%	\$ 1,385.00	1.56%	\$ 3,637.00	4.10%	\$ 5,022.00	5.67%
X	SANITASI WORKS	\$ 7,223.06	8.15%	\$ 5,910.00	6.67%	\$ 1,313.03	1.48%	\$ 7,223.03	8.15%
XI	PAINTING WORKS	\$ 2,316.75	2.61%	\$ 2,316.74	2.61%	\$ -	0.00%	\$ 2,316.74	2.61%
XII	PROVISIONAL SUM FOR FURNITURE	\$ 10,000.00	11.28%	\$ 10,000.00	11.28%	\$ -	0.00%	\$ 10,000.00	11.28%
XIII	FINAL CLEARING	\$ 200.00	0.23%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.23%	\$ 200.00	0.23%
A	CONTRUCTION COST (I + XIII)	\$ 70,050.45	79.04%	\$ 62,148.60	70.12%	\$ 7,899.35	8.91%	\$ 70,047.95	79.03%
B	CONTRACTOR FEE (10 % x A)	\$ 7,005.05	7.90%	\$ 6,214.86	7.01%	\$ 789.93	0.89%	\$ 7,004.80	7.90%
C	OVERHEAD	\$ 2,970.00	3.35%	\$ 2,970.00	3.35%	\$ -	0.00%	\$ 2,970.00	3.35%
D	CONSTRUCTION TAX (2% x (A+B+C))	\$ 1,600.51	1.81%	\$ 1,426.67	1.61%	\$ 173.79	0.20%	\$ 1,600.45	1.81%
E	CONTIGENCY (10% x A)	\$ 7,005.05	7.90%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
F	GRAND TOTAL PROJECT COST	\$ 88,631.06	100.00%	\$ 72,760.13	82.09%	\$ 8,863.07	10.00%	\$ 81,623.20	92.09%

PREPARA HUSI :

VERIFIKA HUSI :

SERTIFIKA HUSI :

Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Lautem,ADN,I.P

Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Lautem,ADN,I.P

Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio
Publico, Agua e Saneamentu ADN,I.P

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



#ANEXU C1 (LO-5) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 0+000 - 8+000 Lautem Municipality**
No. kontratu : SSS/144/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 06/7/2022

Fatin Inspesaun : Assalaino to Caicavamoko

Koordinadas :

Start Point : Long : 127.014768, Latetude : 8.380344

End Point : Long : 127.056664, Latetude : 8.355725

Naran Inspector : 1. Geovanio M.X.Carlos Aleixo

2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araujo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ON GOING Maibe actividade iha tereno
ba fulan ne'e laiha






#ANEXU C1 (LO-5) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 0+000 - 8+000 Lautem Municipality**
No. kontratu : SSS/144/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ON GOING Maibe actividade iha tereno
ba fulan ne'e laiha

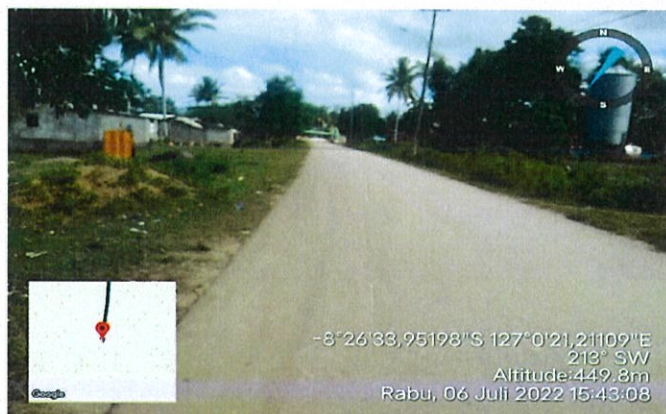



#ANEXU C1 (LO-5) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 0+000 - 8+000 Lautem Municipality**
No. kontratu : SSS/144/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 20/7/2022

Fatin Inspesaun : Assalaino to Caicavamoko

Koordinadas :

Start Point : Long : 127.014768, Latetude : 8.380344

End Point : Long : 127.056664, Latetude : 8.355725

Naran Inspector : 1. Geovanio M.X.Carlos Aleixo

2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araujo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Inspeksaun Pagamento 100%




#ANEXU C1 (LO-5) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 0+000 - 8+000 Lautem Municipality**
No. kontratu : **SSS/144/MOPTC-2017**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

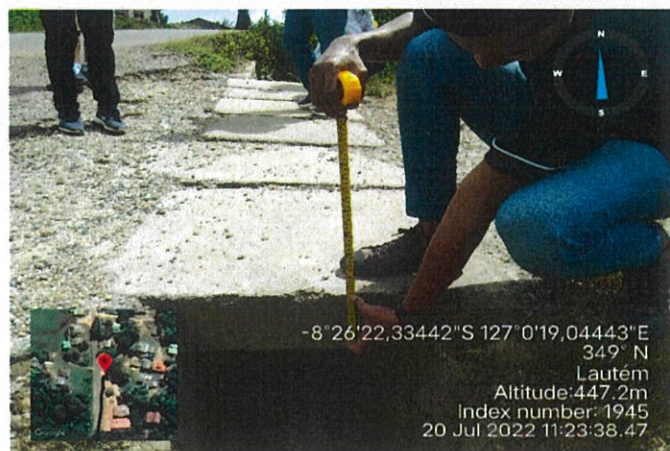

Inspeksaun Pagamento 100%



#ANEXU C1 (LO-5) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 0+000 - 8+000 Lautem Municipality**
No. kontratu : **SSS/144/MOPTC-2017**

Data Inspesaun : 06/7/2022

Fatin Inspesaun : Assalaino to Caicavamoko

Koordinadas :

Start Point : Long : 127.014768, Latetude : 8.380344

End Point : Long : 127.056664, Latetude : 8.355725

Naran Inspector : 1. Geovanio M.X.Carlos Aleixo
2. Deamantino Henrique Lopes
3. Elnino Junior Araujo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ON GOING Maibe actividade iha tereno
ba fulan ne'e laiha






#ANEXU C1 (LO-5) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct. Assalaino to Caicavamoko Sta. 0+000 - 8+000 Lautem Municipality**
No. kontratu : **SSS/144/MOPTC-2017**

Sketch & Foto Desenho



ON GOING Maibe actividade iha terreno
ba fulan ne'e laiha

Observasaun iha terreno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Contract No. : SSS/143/MOPTC-2017
Project Location : ASSALAINO TO CAICAVAMOKO STA.0+000 - 8+000 (8 KM)
Contractor : Salve Unipessoal,Lda

#ANEXU C2 (LO-5)

No	ORIGINAL CONTRACT		REVISED CONTRACT #2	PREVIOUS		PROGRESS JULHO		TO DATE	PERCENTAGE (%)
	Item Description	Amount Contract	Amount Revised	Amount Previous	Percentage (%)	Amount This billing	Percentage (%)	Amount to Date	
100	GERERAL REQUIREMENTS	\$ 63,845.00	\$ 63,845.00	\$ 40,243.33	1.05%	\$ 23,601.67	0.12%	\$ 63,845.00	1.17%
200	EART WORKS	\$ 484,502.29	\$ 644,856.32	\$ 645,356.31	16.64%	\$ (500.00)	-0.01%	\$ 644,856.31	16.62%
300	SUB BASE ANS BASE COURSE WORKS	\$ 1,128,051.55	\$ 1,235,939.20	\$ 1,235,939.20	30.20%	\$ -	0.00%	\$ 1,235,939.20	30.20%
400	SURFACE COURSE AND PAVEMENT WORKS	\$ 1,398,109.41	\$ 1,378,382.50	\$ 1,354,172.50	33.09%	\$ 24,210.00	0.11%	\$ 1,378,382.50	33.20%
500	CONCRETE BRIDGE CONSTRUCTION WORKS	\$ 41,871.49	\$ 4,362.51	\$ 2,962.90	0.07%	\$ 510.55	0.01%	\$ 3,473.45	0.09%
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION	\$ 531,014.37	\$ 89,179.74	\$ 82,369.12	2.01%	\$ 5,191.46	0.14%	\$ 87,562.79	2.15%
A	Construction Cost	\$ 3,647,394.12	\$ 3,416,565.27	\$ 3,361,043.36	83.06%	\$ 53,013.68	0.36%	\$ 3,414,059.25	83.42%
B	Construction Fee & Overhead (10% of A)	\$ 364,739.41	\$ 341,656.53	\$ 336,104.34	8.31%	\$ 5,301.37	0.04%	\$ 341,405.92	8.34%
C	Construction Tax (2% of A + B)	\$ 80,242.67	\$ 75,164.44	\$ 73,942.95	1.83%	\$ 1,166.30	0.01%	\$ 75,109.30	1.84%
D	Grand Total (A + B +C)	\$ 4,092,376.20	\$ 3,833,386.23	\$ 3,771,090.65	93.19%	\$ 59,481.35	0.41%	\$ 3,830,574.48	93.60%

Inspecsaun Husi :


(Geovanio M.X.C. Aleixo)
Engenheiro ba Projeto ITI Municipio
Lautem ADN,IP


(Deamantino H. Lopes)
Engenheiro ba Projeto ITI Municipio
Lautem ADN,IP



Verifika Husi :


(Eng. Remigio da C.S. dos Santos)
Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun ADN,IP

Sertifika Husi :


(Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Koordenadora Da Unidade de Controlo E Validação De
Qualidade ADN,IP


(Elnino Junior Araujo Mota)
Engenheiro ba Projeto ITI Municipio
Lautem ADN,IP
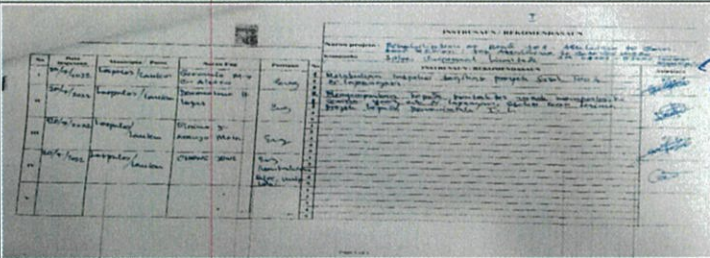
# ANEXU D (LO - 5)									
Naran projeto : Rehabilitation of Road Jct. Assalaino to Com, Road Section : Jct Assalaino to Caicavamoko Sta. 0+000 - 8+000 km municipality Lautem									
Kompanha : Salve, Unip. Lda									
o	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN								Asinatura
	Melakukan inspeksi tagihan proyek fisik 100% di lapangan.								
2	Menyampaikan kepada kontraktor untuk memperbaiki semua terjadinya kerusakan yang ada di lapangan, sebelum serah terimah proyek kepada pemerintah T-L								 



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LO-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Maintanance Lospalos - Souro Chainage 0+000 - 5+800,

Routine Maintanance Leuro - Sorulua Chainage 0+000 - 3+000

No. kontratu : RFQ/222/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico iha terreno parrado hela no plum
concrete balun komesa aát fali ona





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LO-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Maintanance Lospalos - Souro Chainage 0+000 - 5+800,

Routine Maintanance Leuro - Sorulua Chainage 0+000 - 3+000

No. kontratu : RFQ/222/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 18/07/2022

Fatin Inspesaun : Souro - Leuro

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.965058, Latetude : 8.5034449

End Point : Long : 126.949355, Latetude : 8.5191883

Naran Inspector : 1. Geovanio M.X.Carlos Aleixo

2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araújo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico iha terreno parrado hela no plum
concrete balun komesa aát fali ona





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LO-7) Back-up Data

Naran Projeto : Road Maintenance Sections : Lospalos - Iliomar Section (A082 - 2)
Municipality Lautem (162)
No. kontratu : MPW-W-190120

Data Inspesaun : 18/07/2022

Fatin Inspesaun : Lospalos - Iliomar

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.993215, Latetude : 8.522855

End Point : Long : 126.827346, Latetude : 8.7074

Naran Inspector : 1. Eng. Geovanio M.X. Carlos Aleixo

2. Eng. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araújo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servico iha terreno parrado hela no estrda balun
komesa aát fali ona






#ANEXU C1 (LO-7) Back-up Data

Naran Projeto : **Road Maintenance Sections : Lospalos - Iliomar Section (A082 - 2)**
Municipality **Lautem (162)**
No. kontratu : **MPW-W-190120**

Sketch & Foto Desenho



Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Servico iha terreno parrado hela no estrda balun
komesa aát fali ona



#ANEXU C1 (LO-12) Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation Fuloro - Home Chainage 0+000 - 1+200

Municipality Lautem

No. kontratu : RT/032/MOP - 2019

Data Inspesaun : 08/07/2022

Fatin Inspesaun : Fuloro - Home

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.86831, Latetude : 8.509434

End Point : Long : 126.976221, Latetude : 8.508212

Naran Inspector : 1. Geovanio M.X.Carlos Aleixo

2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araújo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ON GOIN, maibe aktividade iha terreno ba
fulan ne'e laiha.



#ANEXU C1 (LO-12) Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Fuloro - Home Chainage 0+000 - 1+200**
Municipality **Lautem**
No. kontratu : **RT/032/MOP - 2019**

Sketch Item Serbisu Stone Masonry

Observasaun iha terreno no Foto Aktual



ON GOING, Maibe aktividade iha terreno ba
fulan ne'e laiha.





#ANEXU C1 (LO-12) Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Rehabilitation Fuloro - Home Chainage 0+000 - 1+200

Municipality Lautem

No. kontratu : RT/032/MOP - 2019

Data Inspesaun : 15/07/2022

Fatin Inspesaun : Fuloro - Home

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.86831, Latetude : 8.509434

End Point : Long : 126.976221, Latetude : 8.508212

Naran Inspector : 1. Geovanio M.X.Carlos Aleixo


2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araújo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ON GOING, Maibe aktividade iha terreno ba
fulan ne'e laiha.

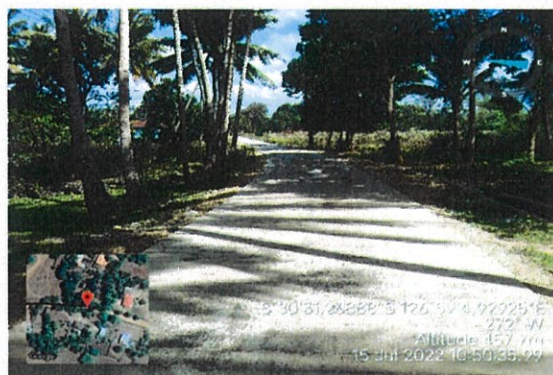



#ANEXU C1 (LO-12) Back-up Data

Naran Projeto : **Rural Road Rehabilitation Fuloro - Home Chainage 0+000 - 1+200**

Municipality **Lautem**


No. kontratu : **RT/032/MOP - 2019**

Sketch Item Serbisu Stone Masonry

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ONGOING Maibe aktividade iha terreno ba
fulan ne'e laiha.



 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (LO-12) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN																		
Naran projeto : Rural Road Rehabilitation Fuloro - Home Chainage 0+000 - 1+200 Municipality Lautem Kompanha : Paiahara Unipessoal Lda																							
No	Data insKpesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura																
I	18/7/2022	Lospalos/Lautem	Geovanio M X C Aleixo	Eng.	1	Husu ba Tekniko Kompanha atu tau fatuk ba servisu Plum Concrete ho medida kiik,atu nune campuran bele tama ba spasu ka leet.	INSTRUSAUN/KOMENTARIU/ OBSERVASAUN: Husu ba Tekniko Kompanha atu tau fatuk ba servisu Plum Concrete ho medida kiik, atu nune campuran bele tama ba spasu/leet. Husu ba Tekniko Kompanha atu tui nafatin campuran/massa job mix nebe'e menciona ona iha BoQ Kontrato nian. Husu ba Kompanha atu ateru tui - tui wainhira servisu Plum Concrete hotu ona iha bahu jalan. Husu nafatin ba Tekniko Kompanha atu halo relatoriu progresso fisico iha terreno fulan - fulan. Husu ba Kompanha atu tau STA. 25 m/section atu nune'e facil ita sura nia quantidade iha terreno. Husu ba Tekniko Kompanha atu kontrola nafatin servisu Plum Concrete iha terreno, liu - liu ba campuran iha fatin servisu. Husu ba Tekniko atu asselera servisu hotu iha terreno. Husu mos ba Tekniko atu kontrola no hadia defeitos hotu nebe'e iha terreno. <table border="1"> <tr> <th>Naran Vizitante(s):</th> <th>Husi Instituisaun:</th> <th>Pozisaun</th> <th>Nu. Timvl.</th> <th>Asinatura:</th> </tr> <tr> <td>Geovanio M. X. C. Aleixo</td> <td>ADN, I.P.</td> <td>Tekniko</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deamantino H. Lopes</td> <td></td> <td></td> <td>77643046</td> <td></td> </tr> </table>	Naran Vizitante(s):	Husi Instituisaun:	Pozisaun	Nu. Timvl.	Asinatura:	Geovanio M. X. C. Aleixo	ADN, I.P.	Tekniko			Deamantino H. Lopes			77643046		  
					Naran Vizitante(s):	Husi Instituisaun:		Pozisaun	Nu. Timvl.	Asinatura:													
					Geovanio M. X. C. Aleixo	ADN, I.P.		Tekniko															
			Deamantino H. Lopes					77643046															
			2		Husu ba Tekniko Kompanha atu tui nafatin campuran/massa job mix nebe'e menciona ona iha BoQ Kontrato nian.																		
			3		Husu ba Kompanha atu ateru tui - tui wainhira servisu Plum Concrete hotu ona iha bahu jalan.																		
			4		Husu nafatin ba Tekniko Kompanha atu halo relatoriu progresso fisico iha terreno fulan - fulan.																		
			5		Husu ba Kompanha atu tau STA. 25 m/section atu nune'e facil ita sura nia quantidade iha terreno.																		
6	Husu ba Tekniko Kompanha atu kontrola nafatin servisu Plum Concrete iha terreno, liu - liu ba campuran iha fatin servisu.																						
7	Husu ba Tekniko atu asselera servisu hotu iha terreno.																						
8	Husu mos ba Tekniko atu kontrola no hadia defeitos hotu nebe'e iha terreno.																						
			Deamantino H. Lopes																				

#ANEXU C1 (LO-15)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Fatin Izolamentu iha CHC Lospalos Municipiu Lautem**
No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-DC-20-253**

Data Inspesaun : 28/07/2022

Fatin Inspesaun : Lospalos-Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.3121274 Latetude : 126.5953147

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2. Quico Adelino Junior

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progressu fiziku ba projetu
refere remata ona.

Projetu ne'e mos entrega tiha ona ba
iha Projetu Nain no iha fulan ida ne'e
nia laran halo ona inagurasaun ba
projetu refere.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 (LO-15)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Fatin Izolamentu iha CHC Lospalos Municipiu Lautem**

No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-DC-20-253**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Jul 28, 2022 3:52:00 PM
8.5203S 126.9922E
ADN.IP LAUTEM

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Jul 28, 2022 4:01:34 PM
8.5223S 126.9979E
ADN.IP LAUTEM



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LO-15)

SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT				INSPECTION PROGRESS REPORT BY ADN.IP					
				UPTO DATE PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UPTO DATE PROGRESS	
NO	DESCRIPTION	Amount (USD)	Weight (%)	Amount (USD)	Weight (%)	Amount (USD)	Weight (%)	Amount (USD)	Weight (%)
I	PREPARATION WORKS	\$ 5,694.26	2.00%	\$ 5,319.26	1.87%	\$ 375.00	0.13%	\$ 5,694.26	2.00%
II	FUNDATION WORKS	\$ 812.67	0.29%	\$ 812.67	0.29%	\$ -	0.00%	\$ 812.67	0.29%
III	CONCRETE WORKS	\$ 40,333.34	14.16%	\$ 37,873.52	13.30%	\$ 2,460.02	0.86%	\$ 40,333.34	14.16%
IV	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 29,579.91	10.39%	\$ 29,579.90	10.39%	\$ -	0.00%	\$ 29,579.91	10.39%
V	CARPENTER WORKS	\$ 23,690.00	8.32%	\$ 23,690.00	8.32%	\$ -	0.00%	\$ 23,690.00	8.32%
VI	ROOFING WORKS	\$ 46,531.32	16.34%	\$ 46,531.32	16.34%	\$ -	0.00%	\$ 46,531.32	16.34%
VII	CEILING WORKS	\$ 12,934.35	4.54%	\$ 12,934.35	4.54%	\$ -	0.00%	\$ 12,934.35	4.54%
VIII	FLOOR TILE WORKS	\$ 18,258.15	6.41%	\$ 18,258.15	6.41%	\$ -	0.00%	\$ 18,258.15	6.41%
IX	ELECTRICAL WORKS	\$ 19,651.77	6.90%	\$ 17,306.01	6.08%	\$ 2,345.74	0.82%	\$ 19,651.77	6.90%
X	SANITASI WORKS	\$ 9,212.45	3.23%	\$ 9,212.11	3.23%	\$ -	0.00%	\$ 9,212.45	3.23%
XI	PAINTING WORKS	\$ 7,328.58	2.57%	\$ 7,328.58	2.57%	\$ -	0.00%	\$ 7,328.58	2.57%
XII	FURNITURE	\$ 15,165.00	5.32%	\$ 15,165.00	5.32%	\$ -	0.00%	\$ 15,165.00	5.32%
XIII	FINAL CLEARING	\$ 300.00	0.11%	\$ -	0.00%	\$ 300.00	0.11%	\$ 300.00	0.11%
A	CONSTRUCTION COST (I + XIII)	\$ 229,491.79	80.58%	\$ 224,010.88	78.66%	\$ 5,480.75	1.92%	\$ 229,491.79	80.58%
B	CONTRACTOR FEE (10 % x A)	\$ 22,949.18	8.06%	\$ 22,401.09	7.87%	\$ 548.08	0.19%	\$ 22,949.18	8.06%
C	OVERHEAD	\$ 4,350.00	1.53%	\$ 3,262.50	1.15%	\$ 1,087.50	0.38%	\$ 4,350.00	1.53%
D	CONSTRUCTION TAX (2% x (A+B))	\$ 5,048.82	1.77%	\$ 4,928.24	1.73%	\$ 120.58	0.04%	\$ 5,048.82	1.77%
E	CONTINGENCY (10% x A)	\$ 22,949.18	8.06%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
F	GRAND TOTAL PROJECT COST	\$ 284,788.97	100.00%	\$ 254,602.71	89.40%	\$ 7,236.91	2.54%	\$ 261,839.79	91.94%

PREPARA HUSI :


Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico
Beé no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P


Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Porjecto Edificio Publico
Beé no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

VERIFIKA HUSI :


Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico,
Agua e Saneamento ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI :


Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P



#ANEXU C1 (LO-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projetu Konstrusaun Foun ESTV Lospalos**

No. kontratu : **NCB:14/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : 15/07/2022

Fatin Inspesaun : Lospalos-Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :, 8.4899S Latetude : 126.9948E

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2. Quico Adelino Junior

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progressu Fiziku ba iha projetu
refere iha fulan ida ne'e maka ;
Agora dadauk tama ona ba iha
servisu reboka ninian

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 (LO-17)

Back-up Data

Naran Projeto : **Projetu Konstrusaun Foun ESTV Lospalos**

No. kontratu : **NCB:14/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

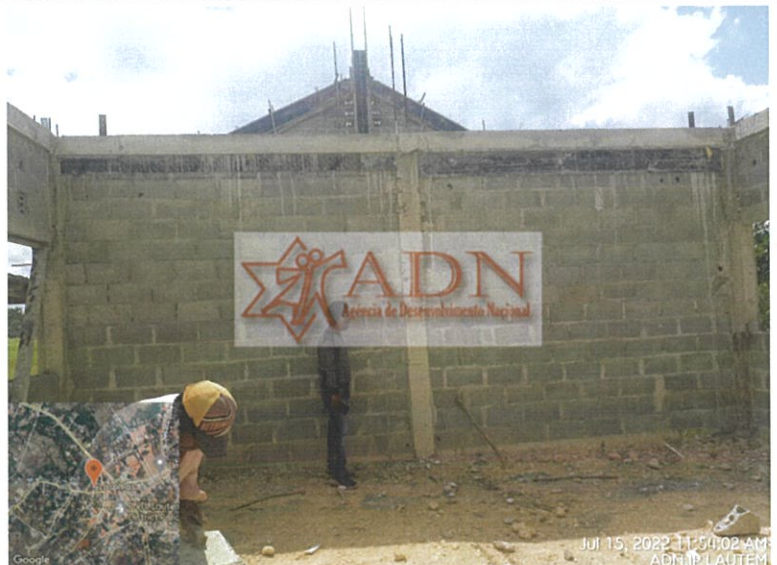

#ANEXU C1 (LO-18)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun ba EBF No-2 Lospalos iha Aldeia Central Suco
Fuilluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem
No. kontratu :

Data Inspesaun : 15/07/2022

Fatin Inspesaun : Lospalos-Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.312168018 , Latetude : 126.594114529

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1. Inocencio dos Reis Costa Maia

2. Quico Adelino Junior

3.

4.


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progressu servisu ba projetu refere
iha fulan ida ne'e maka ; Servisu ba
Classroom to ona iha servisu
plesteran, plesteran iha parte laran
finaliza ona no parte liur falta tan $\frac{1}{4}$,
no Toilet Building ninian remata hotu
ona, agora dadauk atu tama ona mos
ba servisu plesteran parte laran.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

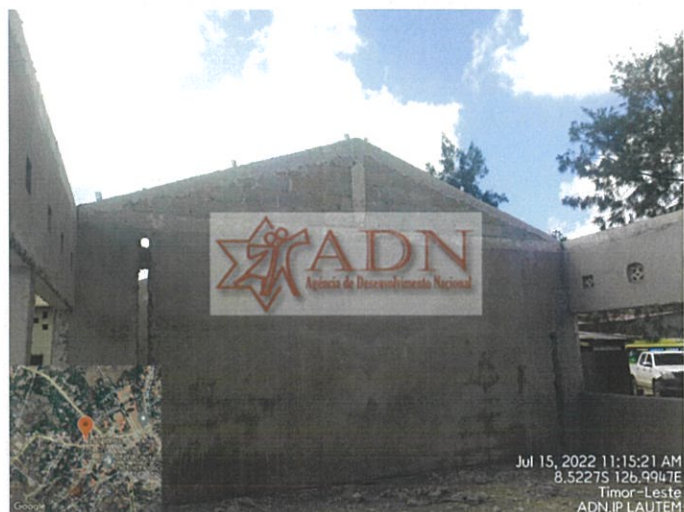

#ANEXU C1 (LO-18)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun ba EBF No-2 Lospalos iha Aldeia Central Suco
Fuiluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

.....




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

.....

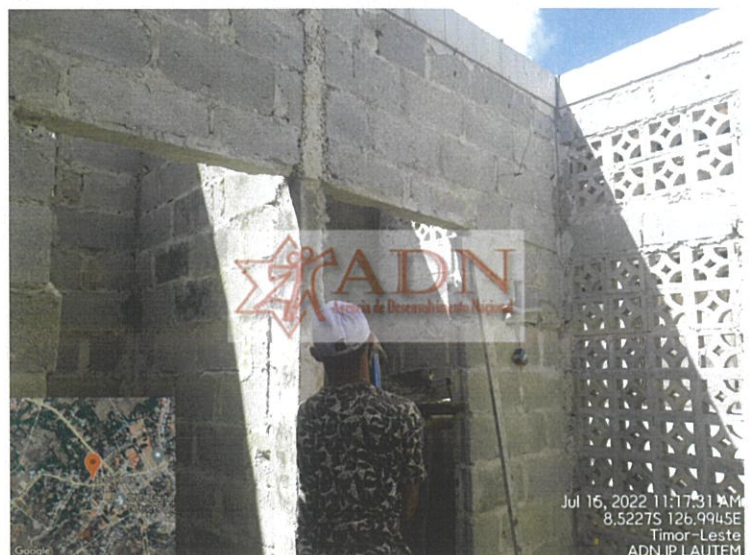



ANEXO C2 (LO-18)

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA FILIAL NO 2 LOSPALOS
FATIN PROJEITO : LOSPALOS, SUCO FUILOORO
DONO DO PROJEITO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT						ADN PROGRESS REPORT					
						PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
NO	WORKS DESCRIPTION	PAGE NO		AMOUNT USD	WEIGHTH %	AMOUNT USD	WEIGHTH %	AMOUNT USD	WEIGHTH %	AMOUNT USD	WEIGHTH %
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3,075.00	2.83%	\$ 2,475.00	2.28%	\$ -	0.00%	\$ 2,475.00	2.28%
II	PROVUSIONAL SUM FOR DEMOLITION	DM/3		\$ 313.50	0.29%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
III	CLASSROOM BUILDING C2	C/39	(i)	\$ 56,210.58	51.75%	\$ 18,639.87	17.16%	\$ 2,845.74	2.62%	\$ 21,485.61	19.78%
IV	TOILET BUILDING Tb	TB/39	(i)	\$ 27,521.87	25.34%	\$ 11,229.57	10.34%	\$ 1,069.99	0.99%	\$ 12,299.56	11.32%
V	PROFESIONAL SUM FOR SITEWORKS	SW/24	(i)	\$ 12,151.77	11.19%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			\$ 99,272.72	91.40%	\$ 32,344.44	29.78%	\$ 3,915.73	3.61%	\$ 36,260.17	33.38%
B	OVERHEAD			\$ 6,340.00	5.84%	\$ 1,585.00	1.46%	\$ -	0.00%	\$ 1,585.00	1.46%
C	CONTIGENCY			\$ 3,000.00	2.76%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL WITH PROVISIONAL SUM			\$ 108,612.72	100.00%	\$ 33,929.44	31.24%	\$ 3,915.73	3.61%	\$ 37,845.17	34.84%

PREPARA HUSI :



Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico
Beé no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P


Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Porjecto Edificio Publico
Beé no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

VERIFIKA HUSI :


Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico,
Agua e Saneamento ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI :


Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e

ANEXO C1 (LO-19) Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun ba Pre Escolar Ira - Ara iha Aldeia Lospala Suco
Fuiluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem
No. kontratu :

Data Inspesaun : 13/07/2022, 27/07/2022

Fatin Inspesaun : Lautem, Lospalos-Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.5245, Latetude : 127.0065

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1. Inocencio dos Reis Costa Maia

2. Quico Adelino Junior

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu servisu ba projetu refere iha
fulan ida ne'e maka : Agora dadauk too
ona iha servisu reboka/plesteran, ne'ebe
maka konsege finalija ona reboka iha parte
laran no sorin balu/metade husi reboka
parte liur.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXO C1 (LO-19)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun ba Pre Escolar Ira - Ara iha Aldeia Lospala Suco
Fuiluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

.....

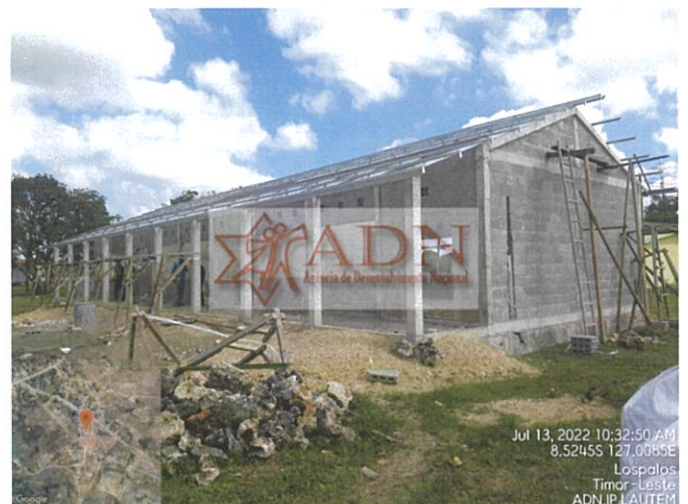



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXO C2 (LO-19)

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA PRE - ESCOLAR IRA - ARA
FATIN PROJEITO : LAUTEM, SUCO FUILORO
DONO DO PROJEITO : MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT				ADN PROGRESS REPORT					
NO	WORK ITEM DESCRIPTION	AMOUNTH	WEIGHTH	PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
				AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH
				USD	%	USD	%	USD	%
1	PRELIMINARIES	\$ 3,075.00	2.75%	\$ 2,237.50	2.00%	\$ -	0.00%	\$ 2,237.50	2.00%
2	GROUNDWORK (Pekerjaan Tanah)	\$ 3,132.45	2.80%	\$ 3,132.45	2.80%	\$ -	0.00%	\$ 3,132.45	2.80%
3	CONCRETE (Pekerjaan Beton)	\$ 13,919.82	12.46%	\$ 12,650.31	11.32%	\$ -	0.00%	\$ 12,650.31	11.32%
4	STONE MASONRY AND MASONRY BLOCKWORK (Pek. Pasangan batu dan pasang batako)	\$ 11,106.56	9.94%	\$ 11,106.56	9.94%	\$ -	0.00%	\$ 11,106.56	9.94%
5	STEEL ROOF STRUCTURE & CEILING (StructurAtap Baja dan Plafond)	\$ 11,027.94	9.87%	\$ 6,808.42	6.09%	\$ -	0.00%	\$ 6,808.42	6.09%
6	JOINERY FIXTURES	\$ 447.82	0.40%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
7	ROOFING (Pek. Atap)	\$ 6,082.52	5.44%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
8	WINDOWS (Pekerjaan Jendela)	\$ 2,726.00	2.44%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
9	DOORS AND HARDWARE (Pek. Pintu,Penggantung dan Pengunci)	\$ 2,485.00	2.22%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
10	FINISHES (Pek Finishing atau plesteran)	\$ 9,875.00	8.84%	\$ 1,493.99	1.34%	\$ 1,495.62	1.34%	\$ 2,989.62	2.68%
11	PAINTING (Pek. Pengecatan)	\$ 2,885.75	2.58%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
12	PLUMBING AND DRAINAGE (Pek. perpipaan)	\$ 2,733.57	2.45%	\$ 694.79	0.62%	\$ -	0.00%	\$ 694.79	0.62%
13	ELECTRICAL INSTALLATION (full installation)	\$ 2,275.59	2.04%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
14	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 30,616.44	27.40%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 102,389.45	91.64%	\$ 38,124.01	34.12%	\$ 1,495.62	1.34%	\$ 39,619.63	35.46%
B	OVERHEAD	\$ 6,340.00	5.674%	\$ 2,290.00	2.05%	\$ -	0.00%	\$ 2,290.00	2.05%
C	CONTIGENCY	\$ 3,000.00	2.685%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	TOTAL PROJECT COST	\$ 111,729.45	100.00%	\$ 40,414.01	36.17%	\$ 1,495.62	1.34%	\$ 41,909.63	37.51%

PREPARA HUSI :

VERIFIKA HUSI :


SERTIFIKA HUSI :

Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico,
Agua e Saneamento ADN, I.P

Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P

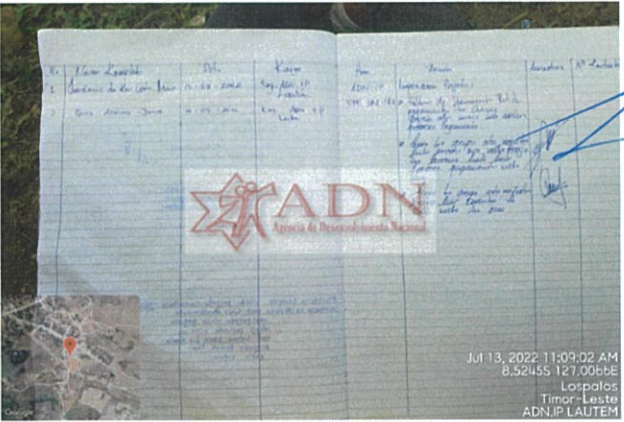 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					ANEXO D (LO-19) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Naran projeto : Rehabilitasaun ba Pre Escolar Ira - Ara iha Aldeia Lospala Suco Fuluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem								
Kompanha : GRUPO KOMUNITARIO								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	13/07/2022	Lautem/Lospalos-Vila	Inocencio dos Reis Costa Maia	Eng. Munisipio	1	Follow up dokumentus ba pedidu pagamentu iha owner projetu atu nune'e bele aselera prosesu pagamentu.		 
					2	Husu ba grupu atu nafatin halao servisu sira ne'ebe presija iha terrenu, hodi hein prosesu pagamentu ne'ebe iha.		
			3		Husu ba grupu atu nafatin servisu tuir dezenhu no BOQ ne'ebe iha ona			
			4					



#ANEXU C1 (LO-19) Back-up Data

Naran Projeto : R4d Rural Roads Spot Improvement Leuro - Sourulua Chainage 0 + 000 - 2 + 650.

No. kontratu : MPW - W - 210080

Data Inspesaun : 18/07/2022

Fatin Inspesaun : Leuro - Sourulua

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.5451095, Latetude : 8.3232926

End Point : Long : 126.5459543, Latetude : 8.3327853

Naran Inspector : 1. Geovanio M. X. C. Aleixo


2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araújo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Plump Concrete

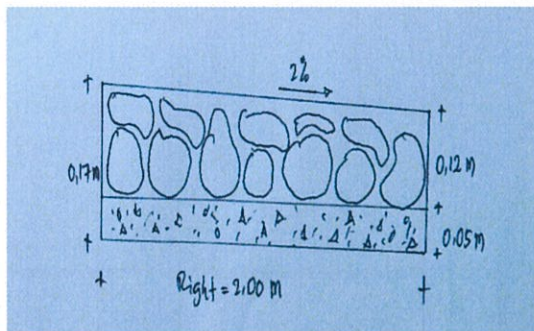

Panjang Plump Concrete = 450.1 m

Lebar Plump Concrete = 1.75 m

Tebal Lean Concrete = 0.05 m

Tebal Plump Concrete = 0.12 m

$$\text{Volume Plump Concret} = 450.1 \times 1.75 \times 0.12 \\ = 118.15 \text{ m}^3$$





#ANEXU C1 (LO-19) Back-up Data


Naran Projeto : R4d Rural Roads Spot Improvement Leuro - Sourulua Chainage 0 + 000 - 2
+ 650.

No. kontratu : MPW - W - 210080

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Plump Concrete

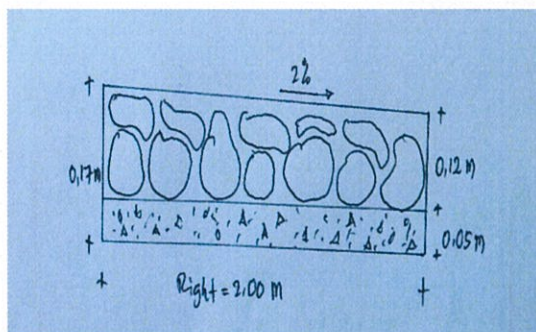



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LO-20)

Name of Project : R4D Rural Roads Spot Improvement Leuro - Sorulua
Chainage 0+000 - 2+650 in Lautem Municipality

Contractor KOMI - ARA UNIP. LDA

Contract No. : MPW - W - 210080

SUMMARY

No	Item Description	ORIGINAL CONTRACT		PREVIOUS		PROGRESS JULHO		TO DATE	PERCENTAGE (%)
		Amount Contract		Amount Previous	Percentage (%)	Amount This billing	Percentage (%)	Amount to Date	
R-01	General works	\$ 2,570.00		\$ 1,160.00	0.43%	\$ -	0.00%	\$ 1,160.00	0.43%
R-03	Earth work	\$ 64,131.36		\$ 27,866.40	10.26%	\$ -	0.00%	\$ 27,866.40	10.26%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 34,989.89		\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structures	\$ 104,852.76		\$ 58,841.58	21.66%	\$ 10,793.12	3.97%	\$ 69,634.70	25.63%
R-10	Dayworks	\$ 1,050.00		\$ 700.00	0.26%	\$ -	0.00%	\$ 700.00	0.26%
R-11	Routine maintenance	\$ 4,618.50		\$ 2,972.00	1.09%	\$ -	0.00%	\$ 2,972.00	1.09%
R-12	Cleaning	\$ 200.00		\$ 200.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ 200.00	0.07%
G-1	General Items	\$ 1,800.00		\$ 1,350.00	0.50%	\$ -	0.00%	\$ 1,350.00	0.50%
G-02	Project Work	\$ 13,170.00		\$ 9,727.50	3.58%	\$ -	0.00%	\$ 9,727.50	3.58%
G-03	Safety and protection	\$ 3,349.00		\$ 2,762.75	1.02%	\$ -	0.00%	\$ 2,762.75	1.02%
G-05	Meeting	\$ 360.00		\$ 360.00	0.13%	\$ -	0.00%	\$ 360.00	0.13%
G-06	Cerimonial Costs	\$ 600.00		\$ 300.00	0.11%	\$ -	0.00%	\$ 300.00	0.11%
G-07	Reinstatement	\$ 12,949.59		\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
G-12	Provisional sum	\$ 400.00		\$ 400.00	0.15%	\$ -	0.00%	\$ 400.00	0.15%
A	Construction Cost	\$ 212,812.51		\$ 92,139.98	33.92%	\$ 10,793.12	3.97%	\$ 102,933.10	37.89%
B	Profit (net cost x %) ; 10%	\$ 21,281.25		\$ 9,214.00	3.39%	\$ 1,079.31	0.40%	\$ 10,293.31	3.79%
C	General Items	\$ 32,228.59		\$ 14,500.25	5.34%	\$ -	0.00%	\$ 14,500.25	5.34%
D	Tax ((A +B + C) x 2 %)	\$ 5,326.45		\$ 2,317.08	0.85%	\$ 237.45	0.09%	\$ 2,554.53	0.94%
E	Grand Total:	\$ 271,648.79		\$ 118,171.32	43.50%	\$ 12,109.88	4.46%	\$ 130,281.19	47.96%

Inspeksaun Husi :

(Eng. Geovanio M.X.C.Aleixo)
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

(Eng. Eihino Junior Araujo Mota)
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

(Eng. Deamantino H. Lopes)
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projecto Infrastructura,
Transportes e Irigasaun ADN,IP

Certifika Husi :

(Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Da Unidade de Controlo E
Validação De Qualidade ADN,IP



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU D (LO-19)

Naran projeto : R4d Rural Roads Spot Improvement Leuro - Sourulua Chainage Sta. 0+000 - 2+650

Kompanha : Komi - Ara Unip. Lda

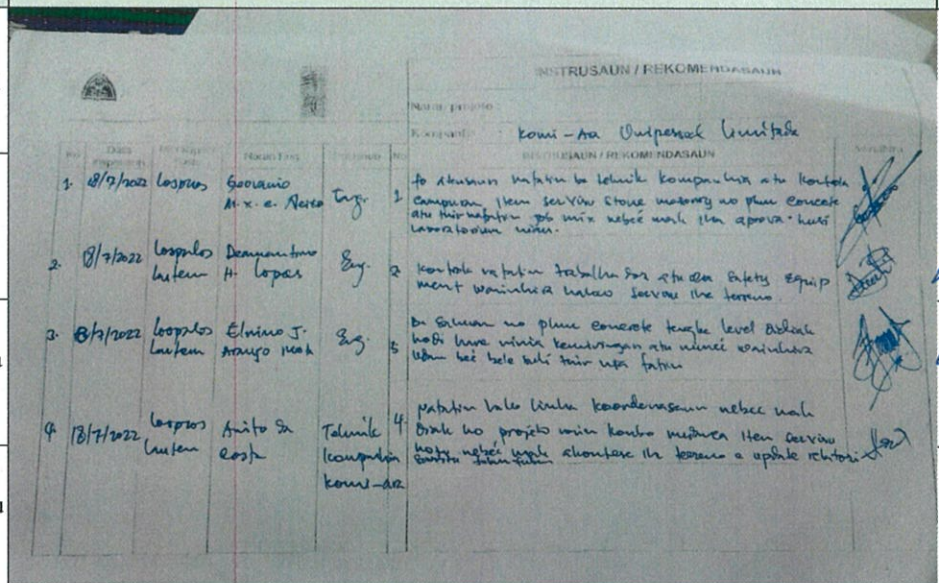No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/07/2022	Lospalos/Lautem	Geovanio M. X. C. Aleixo	Eng.	1	Fo atensaun nafatin ba Teknik Kompanhia atu kontrola badaen sira wainhira ba halo campuran item serbisu Stone Masonry no Plum Concrete atu tuir nafatin Job Mix nebe'e Aprova ona husi Equipa Laboratorium nian.	
			2		Kontrola Nafatin Trabalhador atu uza Safety Equipment wainhira hala'o servisu iha terreno		
			Deamantino H. Lopes		3	Ba Saluran no Plum Concrete tengke level didiak hodi hare nia kemiringan atu nune'e wainhira udan be'e bele suli tuir nia fatin	
			Elnino Junior Araujo Mota		4	Nafatin halo Koordenasaun nebe'e mak diak ho projeto nain konaba mudansa Item serbisu hotu nebe'e mak akontese iha terreno e Update relatoriu Fulan - Fulan.	

ANEXO C1 (LO-21)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba ESG Lere Anan Timur Lospalos iha Aldeia Kuluhun Suco Fuluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem**

No. kontratu :

Data Inspesaun : 13/07/2022

Fatin Inspesaun : Lautem, Lospalos-Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.32906832 , Latetude : 126.595566513

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2. Quico Adelino Junior

3.

4.


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progressu fijiku ba projeto ida ne'e iha fulan ida ne'e maka ; Ba Classroom C agora dadauk too ona iha servisu montajem besi beton ba top beam inklui mos ho nia bekesting.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

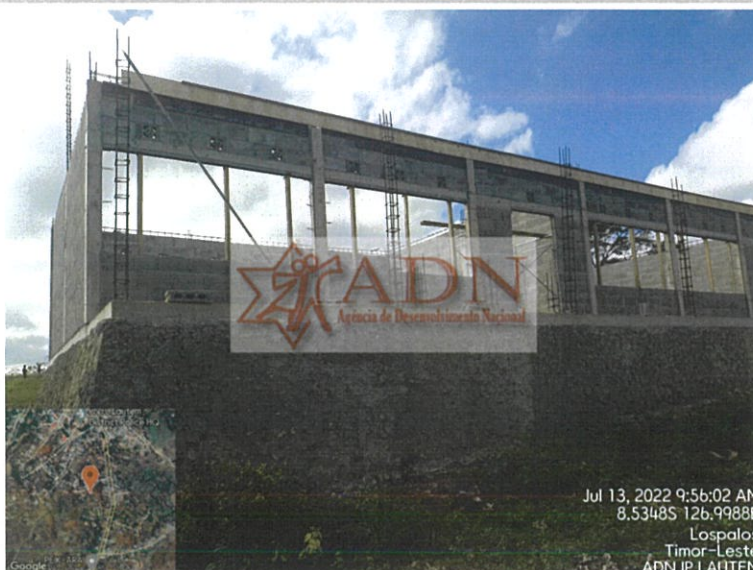

ANEXO C1 (LO-21)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba ESG Lere Anan Timur Lospalos iha Aldeia Kuluhun Suco Fuiluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem**


No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

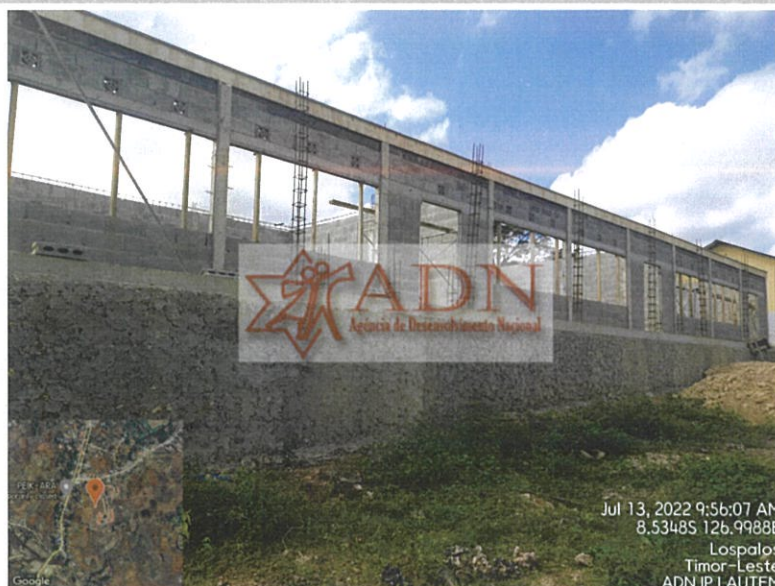


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

servisu Progressu fijiku ba projeto
ida ne'e iha fulan ida ne'e maka ;

Ba Teacher room agora dadauk
too ona iha servisu montajem besi
beton ba top beam.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

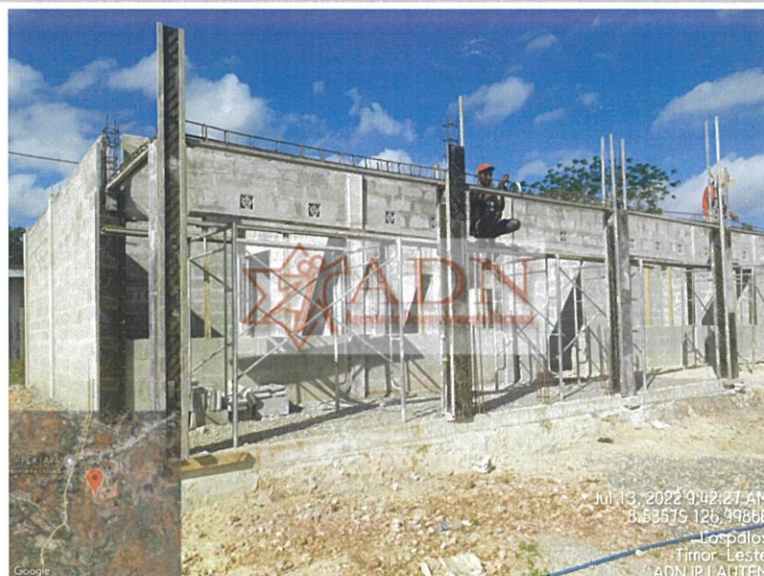



ANEXO C2 (LO-21)

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA SECUNDARIA GERAL PUBLICA LERE ANAN
TIMOR LOSPALOS

FATIN PROJEITO : LOSPALOS, SUCO FUILOORO

DONO DO PROJEITO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT						ADN PROGRESS REPORT					
						PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
NO	WORKS DESCRIPTION	PAGE NO		AMOUNT USD	WEIGHT %	AMOUNT USD	WEIGHT %	AMOUNT USD	WEIGHT %	AMOUNT USD	WEIGHT %
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3,075.00	1.47%	\$ 2,237.50	1.07%	\$ -	0.00%	\$ 2,237.50	1.07%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/40	(i)	\$ 61,752.61	29.54%	\$ 15,979.42	7.65%	\$ 1,475.82	0.71%	\$ 17,455.24	8.35%
III	TEACHER OFFICE	OF/52	(i)	\$ 87,038.68	41.64%	\$ 21,874.37	10.47%	\$ 4,536.28	2.17%	\$ 26,410.65	12.64%
IV	TOILET BUILDING Tb	TB/39	(i)	\$ 27,160.93	12.99%	\$ 10,547.74	5.05%	\$ 158.76	0.08%	\$ 10,706.50	5.12%
V	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	SW/33	(i)	\$ 20,650.56	9.88%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			\$ 199,677.79	95.53%	\$ 50,639.02	24.23%	\$ 6,170.86	2.95%	\$ 56,809.88	27.18%
B	OVERHEAD			\$ 6,340.00	3.03%	\$ 2,042.50	0.98%	\$ -	0.00%	\$ 2,042.50	0.98%
C	CONTINGENCY			\$ 3,000.00	1.44%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL WITH PROVISIONAL SUM			\$ 209,017.79	100.00%	\$ 52,681.52	25.20%	\$ 6,170.86	2.95%	\$ 58,852.38	28.16%

PREPARA HUSI :


Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico
Beé no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P



Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Porjecto Edificio Publico
Beé no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

VERIFIKA HUSI :


Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico,
Agua e Saneamento ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI :


Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P

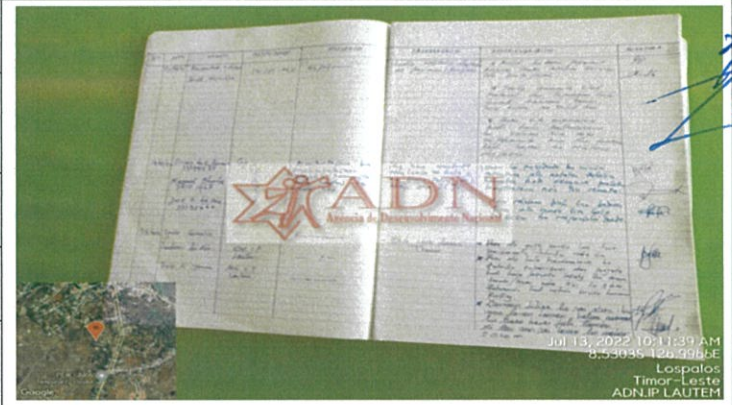 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					ANEXO D (LO-21) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Naran projeto : Rehabilitasaun ba ESG Lere Anan Timur Lospalos iha Aldeia Kuluhun Suco Fuluro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem								
Kompanha : Grupo Komunitario								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura
I	13/07/2022	Lautem/Lospalos-Vila	Inocencio dos Reis Costa Maia	Eng. Munisipio	1	Husu atu grupu servisu lao tuir procedimentu tekniku nebe iha		
					2	Husu atu halo kordenasaun ho tekniku supervizaun dono do projetu hodi hare'e assuntu safety iha area parede/moru ne'ebe a'as liu 2m. Rekomenda hodi instala railing.		
			Quico Adelino Junior		3	Atensaun didiak ho rai ateru iha uma laran tomak , balun nakonu liutenki hasai fali, tamba sei tau mos rai henek ho mahar 20cm		
					4			
					5			

ANEXO C1 (LO-22)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun Ba ESTV Laico Lospalos Munisipio Lautem**

No. kontratu : **CNB:013/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : 13/07/2022

Fatin Inspesaun : Lautem, Lospalos-Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.5042 , Latetude : 127.0069

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2. Quico Adelino Junior

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progressu fijiku ba projeto ida

ne'e iha fulan ida ne'e maka ;

Husi kuantidade uma Lima

ne'ene iha maioria ninian

progressu servisu too hotu ona iha

Top Beam.

Alein ida ne'e servisu reboka

ninian mos komesa halo ona.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXO C1 (LO-22)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun Ba ESTV Laico Lospalos Munisipio Lautem**

No. kontratu : **CNB:013/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Ba Komputer Room ninian
progressu agora dadauk too ona
iha montagem armadura ba iha
sopi-sopi ninian, inklui servisu
plesteran ka reboka ninian mos
halo ona

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXO C1 (LO-22)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun Ba ESTV Laico Lospalos Munisipio Lautem**

No. kontratu : **CNB:013/MEJD/DNA/2021**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXO C2 (LO-22)

Naran Projecto : Konstrusaun Sala de Aula 6 + Escritorio + Laboratorio +

Toilet + Fura Be Mos ESTV Laicu

Projecto Nain : Ministerio da Educasaun Juventude no Desporto

MAIN SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT					ADN.IP PROGRESS REPORT					
					PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
No	DESCRIPTION of WORK	PAGE NUMBER	TOTAL PRICE	WEIGHT %	AMOUNT USD	WEIGHT %	AMOUNT USD	WEIGHT %	AMOUNT USD	WEIGHT %
I	PRELIMINARIES	PP/3	\$ 6,070.00	1.53%	\$ -	0%	\$ 3,545.00	0.89%	\$ 3,545.00	0.89%
II	CLASSROOM BUILDING C (2 UNITS)	C/41 (i)	\$ 128,874.44	32.38%	\$ -	0%	\$ 53,158.20	13.36%	\$ 53,158.20	13.36%
III	TEACHER OFFICE	OF/52 (i)	\$ 93,217.76	23.42%	\$ -	0%	\$ 44,619.31	11.21%	\$ 44,619.31	11.21%
IV	LABORATORY COMPUTER	LC/33 (i)	\$ 42,434.65	10.66%	\$ -	0%	\$ 17,811.17	4.47%	\$ 17,811.17	4.47%
V	TOILET BUILDING Tb	TB/40 (i)	\$ 35,732.26	8.98%	\$ -	0%	\$ 20,676.91	5.19%	\$ 20,676.91	5.19%
VI	SITEWORKS	SW/32 (i)	\$ 44,088.85	11.08%	\$ -	0%	\$ 21,968.45	5.52%	\$ 21,968.45	5.52%
VII	OVERHEAD	OH/2	\$ 4,790.00	1.20%	\$ -	0%	\$ 3,190.00	0.80%	\$ 3,190.00	0.80%
A	CONSTRUCTION COST		\$ 355,207.96	89.24%	\$ -	\$0.00	\$ 164,969.03	41.45%	\$ 164,969.03	41.45%
B	PROFIT 10% x A		\$ 35,520.80	8.92%	\$ -	0%	\$ 16,496.90	4.14%	\$ 16,496.90	4.14%
C	TAX 2% x (A + B)		\$ 7,104.16	1.78%	\$ -	0%	\$ 3,299.38	0.83%	\$ 3,299.38	0.83%
D	TOTAL COST (A + B + C)		\$ 397,832.91	99.95%	\$ -	0%	\$ 184,765.31	46.42%	\$ 184,765.31	46.42%
E	CONTIGENCY		\$ 194.50	0.05%	\$ -	0%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
F	GRAND TOTAL WITH PROVISIONAL SUM		\$ 398,027.41	100.00%	\$ -	0%	\$ 184,765.31	46.42%	\$ 184,765.31	46.42%

PREPARA HUSI :

Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

VERIFIKA HUSI :

Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico,
Agua e Saneamento ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI :

Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P

ANEXO C1 (LO-23)

Back-up Data

Naran Projeto : **Complition Of Veteranus Houses – Lospalos Municipality Lautem**

No. kontratu : **NCB/010CD/ADN,IP/MPO/V/DILI/2022**

Data Inspesaun : 08/07/2022, 12/07/2022, 20/07/2022

Fatin Inspesaun : Lautem, Lospalos-Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.5059 , Latetude : 126.9835

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2. Quico Adelino Junior

3.

4.


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progressu fijiku ba projeto ida
ne'e iha fulan ida ne'e maka ;
Komesa ona ho montagem janela
tahan ba iha uma lima, inklui
servisu harii ai-riin elektrisidade
ninian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

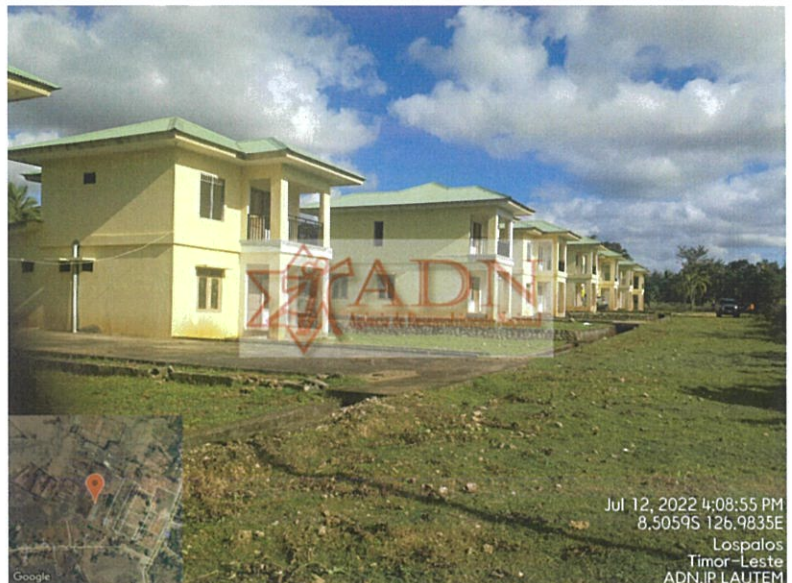

ANEXO C1 (LO-23)

Back-up Data

Naran Projeto : **Complition Of Veteranus Houses – Lospalos Municipality Lautem**

No. kontratu : **NCB/010CD/ADN,IP/MPO/V/DILI/2022**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Spring Bed no ninian asesosias ba
uma Ualu ninian mos iha ona
lokasi

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXO C2 (LO-23)

Project Name : Completion of New Veteran Houses
Location : Lospalos
Project Owner : MOP/AND

SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT				ADN.IP PROGRESS REPORT					
NO	WORK DESCRIPTION	AMOUNT USD	WEIGHTH	PREVIOUS MONTH		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
				AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH
				USD	%	USD	%	USD	%
1	PREPARATION WORKS	\$ 9,913.34	5.72%	\$ -	0.00%	\$ 4,256.67	2.46%	\$ 4,256.67	2.46%
2	HOUSES No.1 SECTION 2	\$ 4,599.93	2.65%	\$ -	0.00%	\$ 441.58	0.25%	\$ 441.58	0.25%
3	HOUSES No.2 SECTION 3	\$ 4,599.93	2.65%	\$ -	0.00%	\$ 441.58	0.25%	\$ 441.58	0.25%
4	HOUSES No.3 SECTION 5	\$ 4,599.93	2.65%	\$ -	0.00%	\$ 441.58	0.25%	\$ 441.58	0.25%
5	HOUSES No.4 SECTION 6	\$ 4,599.93	2.65%	\$ -	0.00%	\$ 441.58	0.25%	\$ 441.58	0.25%
6	HOUSES No.5 SECTION 8	\$ 4,599.93	2.65%	\$ -	0.00%	\$ 441.58	0.25%	\$ 441.58	0.25%
7	HOUSES No.6 SECTION 9	\$ 4,599.93	2.65%	\$ -	0.00%	\$ 441.58	0.25%	\$ 441.58	0.25%
8	HOUSES No.7 SECTION 11	\$ 4,439.43	2.56%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
9	HOUSES No.8 SECTION 12	\$ 4,439.43	2.56%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
10	EXTERNAL & FURNITURE	\$ 91,958.59	53.06%	\$ -	0.00%	\$ 48,191.60	27.81%	\$ 48,191.60	27.81%
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 138,350.39	79.83%	\$ -	0.00%	\$ 55,097.72	31.79%	\$ 55,097.72	31.79%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 13,835.04	7.98%	\$ -	0.00%	\$ 5,509.77	3.18%	\$ 5,509.77	3.18%
C	OVERHEAD	\$ 4,150.00	2.39%	\$ -	0.00%	\$ 1,975.00	1.14%	\$ 1,975.00	1.14%
D	TAX (2 % x (A+ B+ C))	\$ 3,126.71	1.80%	\$ -	0.00%	\$ 1,251.65	0.72%	\$ 1,251.65	0.72%
E	CONTIGENCY (10 % X A)	\$ 13,835.04	7.98%	\$ -	0.00%	\$ 5,509.77	3.18%	\$ 5,509.77	3.18%
F	GRAND TOTAL	\$ 173,297.17	100.00%	\$ -	0.00%	\$ 69,343.91	40.01%	\$ 69,343.91	40.01%

PREPARA HUSI :

Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico
Beé no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P




Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Porjecto Edificio Publico
Beé no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

VERIFIKA HUSI :

Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico,
Agua e Saneamento ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI :

Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P

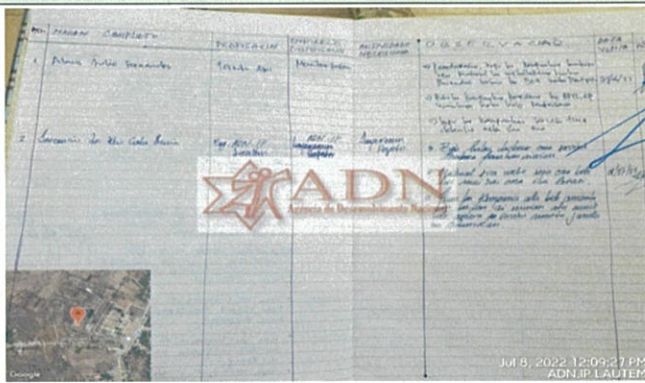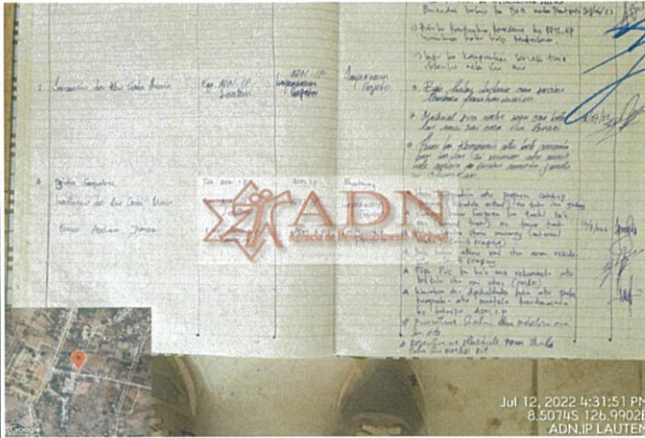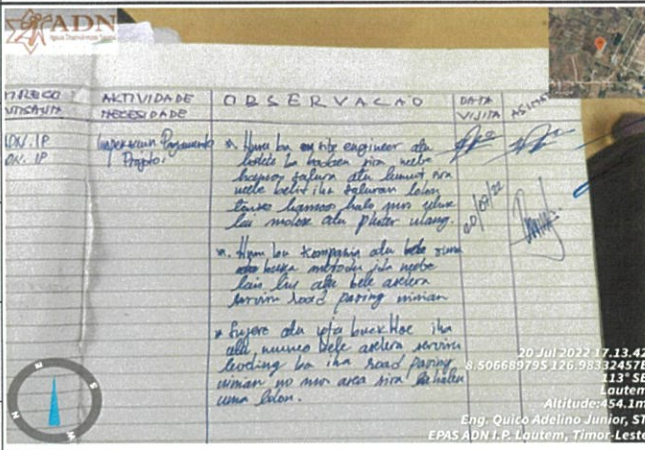 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					ANEXO D (LO-23) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Naran projeto : Complition Of Veteranus Houses – Lospalos Municipality Lautem								
Kompanha : VENJUS Unipessoal Lda.								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	7/08/2022	Lautem/Lospalos-Vila	Inocencio dos Reis Costa Maia	Eng. Munisipio	1	Bele hahu dadauk ona servisu tembok penahan ninian.		
					2	Material sira ne'ebe sosa ona bele lori mai rai ona iha lokal servisu		
					3	Husu ba kompania atu bele aumenta tan badaen ai- ninian atu nune'e bele aselera servisu montajem janela no odamatan tahan.		
					4			
					5			
II	7/12/2023	Lautem/Lospalos-Vila	Inocencio dos Reis Costa Maia	Eng. Munisipio	1	Husu ba kompania atu prepara catchup program (re-schedule) ba progressu actual no taka iha gudang.		
					2	Komesa hahu limpeza ba tangki be'e mos (ground tank) no tower tank.		
					3	Hahu servisu stone masonry (external works) no landscaping ninian.		
					4	Bele hahu ateru rai iha area residencia ninian		
			Quico Adelino Junior		5	Pipa PVC ba be'e mos ninian rekomena atu instala iha rai okos (Hakoi)		
					6	Wainhira iha difikuldades husu atu parte kompania atu matein koordinasaun ho tekniku ADN.IP		
					7	Furnituresira bele hahu mobilija dadauk ona mai iha site		
					8	Desenho no Schedule foun tenke taka iha Direksi Keet.		
III	20/07/2022	Lautem/Lospalos-Vila	Inocencio dos Reis Costa Maia	Eng. Munisipio	1	Husu b asite Engineer atu hateten ba badaen sira ne'ebe hamoos saluran, atu oinsa lumut sira ne'ebe iha saluran lolon tenke hamoos halo mos uluk lai molok atu lester ulang.		
					2	Husu ba kompania atu bele oinsa bele buka metodu ida ne'ebe lais liu atu bele aselera servisu paving ninian.		
			Quico Adelino Junior		3	Sujere atu uja backhoe ida atu nune'e bele aselera servisu leveling ba iha road paving ninian no mos area sira haleu uma lolon.		
					4			
					5			

#ANEXU C1 (LO - 24)

Back-up Data

Naran Projeto : **Road Maintenance Sections : Lospalos - Iliomar Section (A082 - 3)**
No. kontratu : **MPW-W-220015**

Data Inspesaun : 18/7/2022

Fatin Inspesaun : Lospalos to Iliomar

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.993215, Latetude : 8.522855

End Point : Long : 126.827346, Latetude : 8.7074

Naran Inspector : **1. Geovanio M.X.Carlos Aleixo**

2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araujo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Servisu item ba Reinforced Concrete Pipe Culvert
RCPC

- ✓ Panjang RCPC 1200 mm = 8.00 m
- ✓ Shoulder Clearing = 76800.00 ln.m
- ✓ Stone Masonry for Wall = 2 m3



#ANEXU C1 (LO - 24)


Back-up Data

Naran Projeto : **Road Maintenance Sections : Lospalos - Iliomar Section (A082 - 3)**

No. kontratu : **MPW-W-220015**

Sketch & Foto Desenho

Servisu item ba **Gabion Protection** (Ex. Macferry)
Left & Right

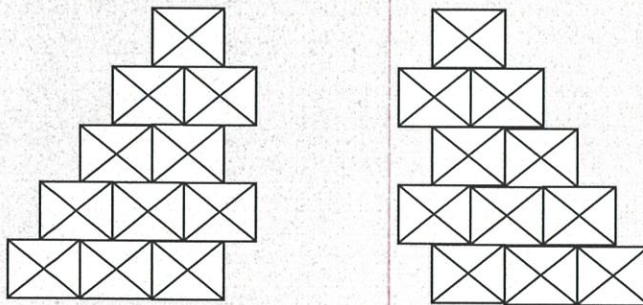

Panjang Gabion **Layer 1, 2, 3, 4, & 5** = 40 m

$$V1 = (40 \text{ m} \times 1.00 \text{ m} \times 1.00 \text{ m})$$

$$= 40.00 \text{ m}^3$$

$$V2 = (40 \text{ m} \times 2.00 \text{ m} \times 1.00 \text{ m})$$

$$= 80.00 \text{ m}^3$$

$$V3 = (40 \text{ m} \times 2.00 \text{ m} \times 1.00 \text{ m})$$

$$= 80.00 \text{ m}^3$$

$$V4 = (40 \text{ m} \times 3.00 \text{ m} \times 1.00 \text{ m})$$

$$= 120.00 \text{ m}^3$$

$$V5 = (40 \text{ m} \times 3.00 \text{ m} \times 1.00 \text{ m})$$

$$= 120.00 \text{ m}^3$$

EVVolume Gabion Layer 1, 2, 3, 4, & 5:


$$= V1 + V2 + V3 + V4 + V5$$

$$= 40.00 \text{ m}^3 + 80.00 + 80.00 + 120 + 120$$

$$= 40 + 80 + 80 + 120 + 120$$

$$= 440.00 \times 2 = 880.00 \text{ M}^3$$

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

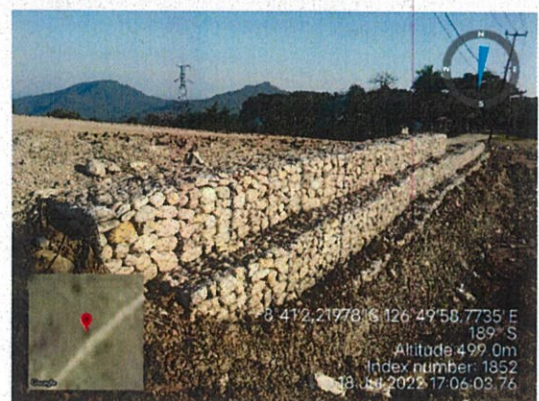



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (IL-2)

Back-up Data

Naran Projeto : **Additional Emergency Iliomar Roads**

No. kontratu : **SSS/140/MOPTC-2016**

Data Inspesaun : 18/07/2022

Fatin Inspesaun : Lospalos-Iliomar

Koordinadas :

Start Point : Long : 126.50'10,412", Latetude : 8.40'35,507"

End Point : Long : 126.50'29'727", Latetude : 8.37'45,841"

Naran Inspector : **1. Geovanio M.X.Carlos Aleixo**

2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araujo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Falta Retensaun 12%





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (IL-2)

Back-up Data


Naran Projeto : Additional Emergency Iliomar Roads

No. kontratu : SSS/140/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Falta Retensaun 12%

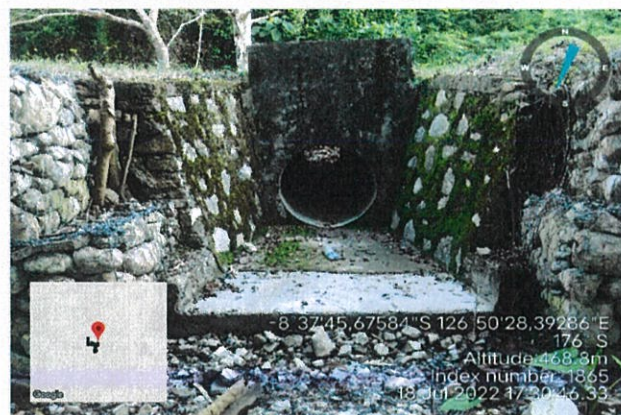

#ANEXU C1 (IL-03)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Health Post And Doctor House Building In Fuat, Lautem, Timor Leste**

No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-ICB-21-072**

p

Data Inspesaun : 18/07/2022

Fatin Inspesaun : Iliomar, Fuat

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.4055765 , Latetude : 126.5032712

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2. Quico Adelino Junior

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Ba Projetu refere, iha fulan ida ne'e ninia fijiku remata ona, agora dadauk tama ona ba iha instalasaun asesoria uma laran ninian no mos ekipamentus saude sira ne'ebe presija.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 (IL-03)

Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Health Post And Doctor House Building In Fuat, Lautem, Timor Leste**

No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-ICB-21-072**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....
Ba Doctor house ninian iha fulan
ida ne'e tama ona ba iha servisu
instalasaun furniture uma laran
ninian hanesan kama, armario,
sofa no sira seluk tan.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

#ANEXU C1 (IL-03)


Back-up Data

Naran Projeto : **New Construction Of Health Post And Doctor House Building In Fuat, Lautem, Timor Leste**

No. kontratu : **RDTL-MS-DNA-ICB-21-072**

Sketch Item servisu

.....

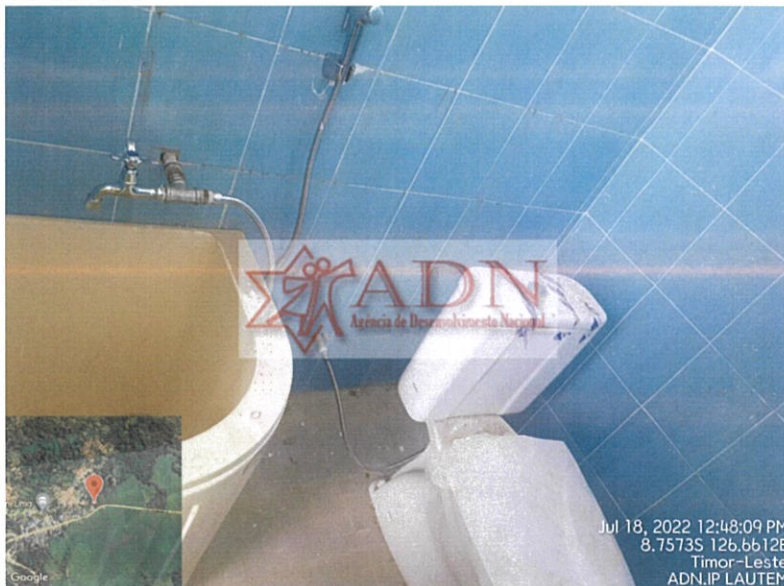

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXO C2 (IL-04)

SUMMARY

Project Name : NEW CONSTRUCTION OF HEALTH AND DOCTOR HOUSE IN FUAT, LAUTEM, TIMOR LESTE
Location : FUAT - LAUTEM MUNICIPALITY - TIMOR LESTE
Project Owner : MINISTRY OF HEALTH

ORIGINAL CONTRACT				PROGRESS REPORT BY ADN.IP					
				PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
NO	WORK DESCRIPTION	AMOUNT USD	BOBOT ORIGINAL (%)	AMOUNT USD	BOBOT (%)	AMOUNT USD	BOBOT (%)	AMOUNT USD	BOBOT (%)
A	HEALTH POST	\$ 128,995.94	54%	\$ 111,188.85	39.68%	\$ 12,736.06	4.55%	\$ 123,924.91	44.23%
1	PREPARATION WORKS	\$ 3,794.09	1.57%	\$ 3,044.09	1.09%	\$ 750.00	0.27%	\$ 3,794.09	1.35%
2	FUNDATION WORKS	\$ 5,086.03	2.11%	\$ 5,086.03	1.82%	\$ -	0.00%	\$ 5,086.03	1.82%
3	CONCRETE WORKS	\$ 19,467.69	8.07%	\$ 21,769.81	7.77%	\$ (2,302.13)	-0.82%	\$ 19,467.69	6.95%
4	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 22,217.82	9.21%	\$ 22,217.82	7.93%	\$ -	0.00%	\$ 22,217.82	7.93%
5	CARPENTER WORKS	\$ 8,003.74	3.32%	\$ 6,002.81	2.14%	\$ 2,000.94	0.71%	\$ 8,003.74	2.86%
6	ROOFING WORKS	\$ 19,692.02	8.16%	\$ 19,692.02	7.03%	\$ -	0.00%	\$ 19,692.02	7.03%
7	CEILING WORKS	\$ 8,813.21	3.65%	\$ 8,813.21	3.15%	\$ -	0.00%	\$ 8,813.21	3.15%
8	FLOOR TILE WORKS	\$ 7,744.64	3.21%	\$ 7,744.64	2.76%	\$ -	0.00%	\$ 7,744.64	2.76%
9	ELECTRICAL WORKS	\$ 8,244.90	3.42%	\$ 4,586.90	1.64%	\$ 3,658.00	1.31%	\$ 8,244.90	2.94%
10	SANITASI WORKS	\$ 8,212.18	3.40%	\$ 6,287.18	2.24%	\$ 1,925.00	0.69%	\$ 8,212.18	2.93%
11	PAINTING WORKS	\$ 3,879.56	1.61%	\$ 3,131.40	1.12%	\$ -	0.00%	\$ 3,131.40	1.12%
12	APRON & DRAINAGE WORKS	\$ 2,812.95	1.17%	\$ 2,812.95	1.00%	\$ -	0.00%	\$ 2,812.95	1.00%
13	TOWER WORKS	\$ 4,277.12	1.77%	\$ -	0.00%	\$ 4,277.12	1.53%	\$ 4,277.12	1.53%
14	PROVISIONAL SUM FOR FURNITURE	\$ 6,500.00	2.69%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
15	FINAL CLEARING	\$ 250.00	0.21%	\$ -	0.00%	\$ 125.00	0.04%	\$ 125.00	0.04%
B	DOCTOR HOUSE 2 UNIT	\$ 104,305.04	43%	\$ 51,597.04	18.41%	\$ 8,980.93	3.21%	\$ 60,577.96	21.62%
1	PREPARATION WORKS	\$ 438.00	0.18%	\$ 438.00	0.16%	\$ -	0.00%	\$ 438.00	0.16%
2	FUNDATION WORKS	\$ 2,289.60	0.95%	\$ 2,289.60	0.82%	\$ -	0.00%	\$ 2,289.60	0.82%
3	CONCRETE WORKS	\$ 8,141.47	3.37%	\$ 10,110.99	3.61%	\$ (1,969.52)	-0.70%	\$ 8,141.47	2.91%
4	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 8,063.52	3.34%	\$ 8,063.52	2.88%	\$ -	0.00%	\$ 8,063.52	2.88%
5	STAIRS WORKS	\$ 232.50	0.10%	\$ 232.50	0.08%	\$ -	0.00%	\$ 232.50	0.08%
6	CARPENTER WORKS	\$ 3,775.00	1.56%	\$ 1,918.75	0.68%	\$ 1,856.25	0.66%	\$ 3,775.00	1.35%
7	ROOFING WORKS	\$ 8,462.30	3.51%	\$ 8,462.30	3.02%	\$ -	0.00%	\$ 8,462.30	3.02%
8	CEILING WORKS	\$ 3,498.41	1.45%	\$ 3,498.41	1.25%	\$ -	0.00%	\$ 3,498.41	1.25%
9	TILE WORKS	\$ 2,420.46	1.00%	\$ 2,420.46	0.86%	\$ -	0.00%	\$ 2,420.46	0.86%
10	ELECTRICAL WORKS	\$ 4,037.00	1.67%	\$ 2,306.50	0.82%	\$ 1,730.50	0.62%	\$ 4,037.00	1.44%
11	SANITASI WORKS	\$ 5,209.27	2.16%	\$ 4,380.56	1.56%	\$ 828.71	0.30%	\$ 5,209.27	1.86%
12	PAINTING WORKS	\$ 1,434.99	0.59%	\$ 1,162.92	0.42%	\$ -	0.00%	\$ 1,162.92	0.42%
13	PROVISIONAL SUM FOR FURNITURE	\$ 4,000.00	1.66%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
14	FINAL CLEARING	\$ 150.00	0.06%	\$ -	0.00%	\$ 75.00	0.03%	\$ 75.00	0.03%
	TOTAL BUILDING B (1 UNIT DOCTOR HOUSE)	\$ 52,152.52	22%	\$ 23,960.72	16.16%	\$ 4,490.46	0.90%	\$ 28,451.18	17.06%
C	PROVISIONAL SUM FOR EXTERNAL WORKS	\$ 8,000.00	3%	\$ 2,000.00	0.71%	\$ -	0.00%	\$ 2,000.00	0.71%
I	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 241,300.98	100%	\$ 164,785.88	58.81%	\$ 21,716.99	7.75%	\$ 186,502.87	66.56%
II	CONTRACTOR FEE (10% x I)	\$ 24,130.10		\$ 16,478.59	5.88%	\$ 2,171.70	0.78%	\$ 18,650.29	6.66%
III	OVERHEAD	\$ 4,550.00		\$ 3,262.50	1.16%	\$ -	0.00%	\$ 3,262.50	1.16%
IV	TAX (2 % x (I + II + III))	\$ 5,399.62		\$ 3,690.54	1.32%	\$ 477.77	0.17%	\$ 4,168.31	1.49%
V	CONTINGENCY (2 % x I)	\$ 4,826.02		\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
VI	GRAND TOTAL	\$ 280,206.72		\$ 188,217.51	67.17%	\$ 24,366.46	8.70%	\$ 212,583.97	75.87%

PREPARA HUSI :


Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P




Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

VERIFIKA HUSI :


Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico,
Agua e Saneamento ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI :


Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P

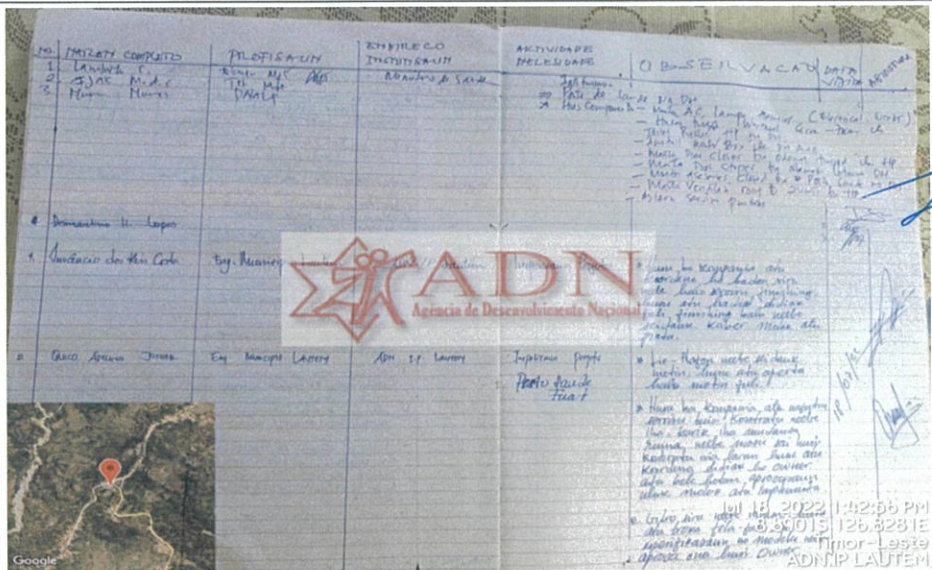 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (IL-04) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			
Naran projeto : NEW CONSTRUCTION OF HEALTH POST AND DOCTOR HOUSE BUILDING IN FUAT, LAUTEM, TIMOR LESTE								
Kompanha : Naesalobu Unipessoal, Lda.								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	18/07/2022	Lautem/Iliomar	Inocencio dos Reis Costa	Eng. Munisipio	1	Lis- Plafon ne'ebe seidaun metin, husu atu aperta halo metin fali		 
					2	Husu ba kompania atu koordena ho badaen sira ne'ebe halo servisu finishing, husu stu hadia didiak fali finishing balun ne'ebe seidaun kabeer molok atu pinta.		
			Quico Adelino Junior		3	Vidro ne'e sira ne'ebe rahun husu atu troka fila-fali, ho esepesifikasaun no modelu ne'ebe aprovona husi Owner.		
					4	Husu ba kompania atu nafatin servisu tuir kontratu ne'ebe iha, karik iha mudansa ruma ne'ebe mosu, sai husi kontratu nia laran husu atu koordena didiak ho owner atu bele hetan aprovasaun uluk molok atu implementa.		
					5			

ANEXO C1 (IL-04) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Ta - Besi Fera Nabem - Fuat iha Aldeia Acadiliro**
Suco Fuat Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem

Data Inspesaun : 18/07/2022

Fatin Inspesaun : Lautem, Iliomar Fuat

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.405823757 , Latetude : 126.50305074

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio Dos Reis Costa Maia**

2. Quico Adelino Junior

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu servisu ba projetu refere iha fulan


ida ne'e maka ; Servisu hada batako remata

no cor sopi-sopi remata ona agora dadauk

to'o komesa halao ona reboka ituan ba iha

moru parte laran.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

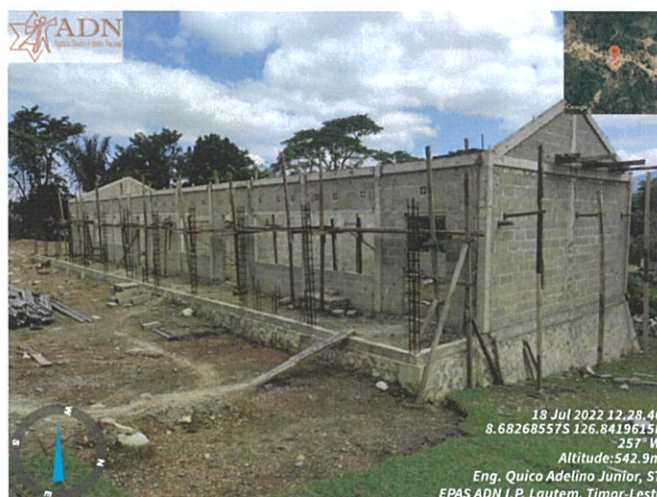




ANEXO C1 (IL-04) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Ta - Besi Fera Nabem - Fuat iha Aldeia Acadiliro
Suco Fuat Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu


Observasaun iha tereno no Foto Aktual

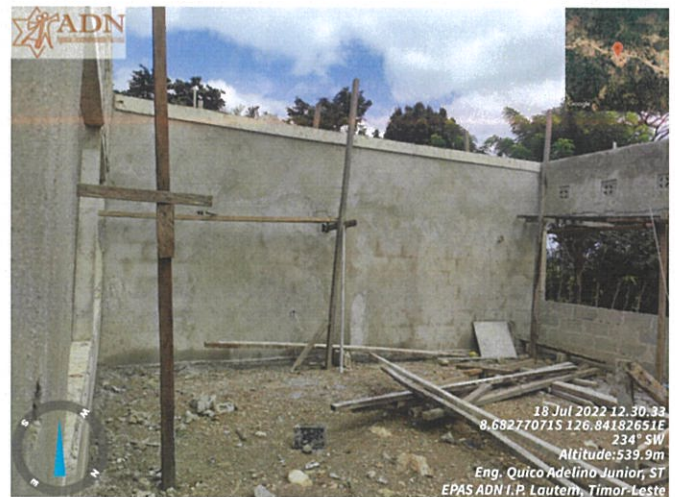

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

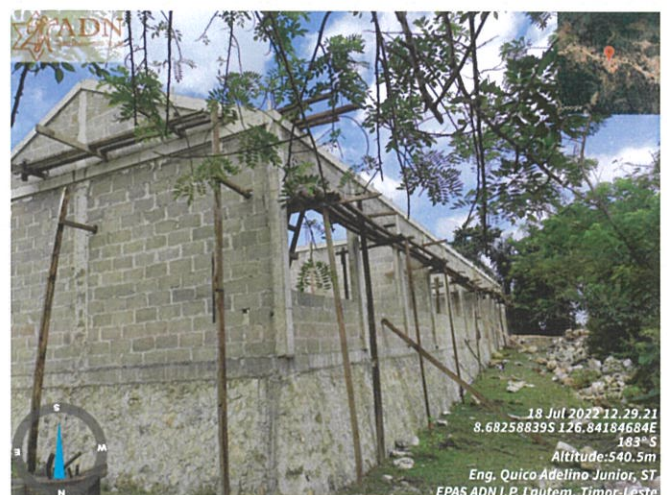



#ANEXO C2 (IL-04)

PROJECT NAME : Konstrusaun Foun ba EBF 1,2 Ta - Besi Fera Naben - Fuat iha Aldeia Acadiliro Suco Fuat Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem
PROJECT LOCATION : Munisipiu Lautem, Postu Administrativu Iliomar , Suco Fuat
OWNER : MEJD
RESPONSABLE BY : Grupu Komunitariu MEJD PKRIE EBF 1,2 TA BESI FERA NABEN-FUAT

SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT				ADN PROGRESS REPORT					
NO	WORK ITEM DESCRIPTION	AMOUNTH	WEIGHTH	PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
				AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH
				USD	%	USD	%	USD	%
1	PRELIMINARIES	\$ 3,075.00	3.81%	\$ 2,975.00	3.68%	\$ -	0.00%	\$ 2,975.00	3.68%
2	GROUNDWORK (Pekerjaan Tanah)	\$ 2,388.62	2.96%	\$ 2,388.62	2.96%	\$ -	0.00%	\$ 2,388.62	2.96%
3	CONCRETE (Pekerjaan Beton)	\$ 13,362.62	16.54%	\$ 6,013.18	7.44%	\$ 2,966.30	3.67%	\$ 8,979.48	11.12%
4	STONE MASONRY AND MASONRY BLOCKWORK (Pek. Pasangan batu dan pasang batako)	\$ 6,920.72	8.57%	\$ 5,966.64	7.39%	\$ 954.08	1.18%	\$ 6,920.72	8.57%
5	STEEL ROOF STRUCTURE & CEILING (StructurAtap Baja dan Plafond)	\$ 13,351.23	16.53%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
6	JOINERY FIXTURES	\$ 677.61	0.84%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
7	ROOFING (Pek. Atap)	\$ 7,309.24	9.05%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
8	WINDOWS (Pekerjaan Jendela)	\$ 3,596.40	4.45%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
9	DOORS AND HARDWARE (Pek. Pintu,Penggantung dan Pengunci)	\$ 1,278.36	1.58%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
10	FINISHES (Pek Finishing atau plesteran)	\$ 9,969.68	12.34%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
11	PAINTING (Pek. Pengecatan)	\$ 2,931.63	3.63%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
12	ELECTRICAL INSTALLATION (full installation)	\$ 2,794.09	3.46%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
13	PROVISIONAL SUM FOR SITEWOKS	\$ 3,773.48	4.67%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 71,428.69	88.44%	\$ 17,343.44	21.47%	\$ 3,920.38	4.85%	\$ 21,263.82	26.33%
B	OVERHEAD	\$ 6,340.00	7.850%	\$ 1,585.00	1.96%	\$ -	0.00%	\$ 1,585.00	1.96%
C	CONTINGENCY	\$ 3,000.00	3.714%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	TOTAL PROJECT COST	\$ 80,768.69	100.00%	\$ 18,928.44	23.44%	\$ 3,920.38	4.85%	\$ 22,848.82	28.29%

PREPARA HUSI :

Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

VERIFIKA HUSI :

Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico,
Agua e Saneamento ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI :

Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXO D (IL-04) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Ta - Besi Fera Nabem - Fuat iha Aldeia Acadiliro Suco Fuat Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem

Kompanha : Grupo Komunitario

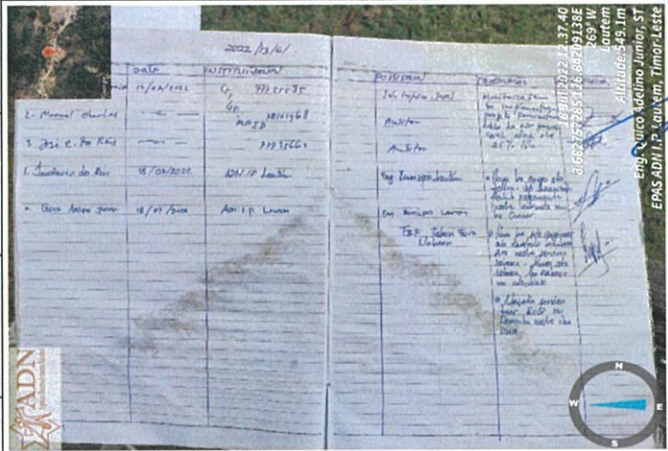No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/07/2022	Lautem/Iliomar	Inocencio Dos Reis Costa Maia	Eng. Munisipio	1	Husu ba grupu atu follow up dokumentus pedidu pagamentu ne'ebe submete ona ba owner	
			Inocencio Dos Reis Costa Maia		2	Husu ba site engineer atu kontrola badaen sira ne'ebe servisu reboka, husu atu reboka ho kabeer no didiak	
			Quico Adelino Junior		3	Nafatin servisu tuir BOQ no dezenhu ne'ebe iha ona	
			Quico Adelino Junior		4		

ANEXO C1 (IL-05)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Tirilolo iha Aldeia Tirilolo Suco Tirilolo Postu Administrativu Iliomar Munisipiu**

Data Inspesaun : 18/07/2022

Fatin Inspesaun : Lautem, Iliomar, Tirilolo

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.421122 , Latetude : 126.4843512

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2. Quico Adelino Junior

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progressu servisu ba projeitu ida ne'e iha fulan ida ne'e maka, too ona iha servisu nahe betaun ba plat lantai classroom nian no kuaze finaliza ona, no ba servisu seluk ne'ebe mak finaliza ona mak hanesan plasteran no mos pengecoran ba kolom no mos balok inklui balok sopi-sopi.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXO C1 (IL-05)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Tirilolo iha Aldeia Tirilolo Suco Tirilolo Postu Administrativu Iliomar Munisipiu**


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Iha parte servisu ba janela no mos
odamatan nian konsege monta ona
arus baja ba janela no mos
odamatan sira.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

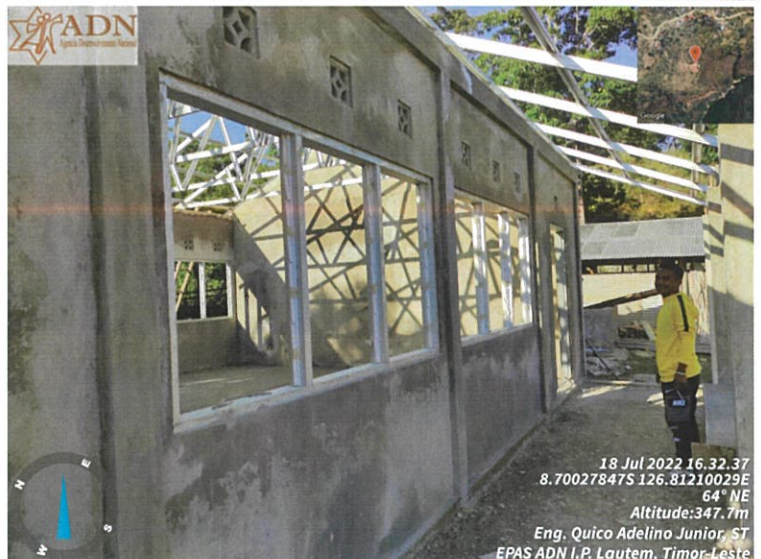

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXO C1 (IL-05)

Back-up Data


Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Tirilolo iha Aldeia Tirilolo Suco Tirilolo Postu
Administrativu Iliomar Munisipiu**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

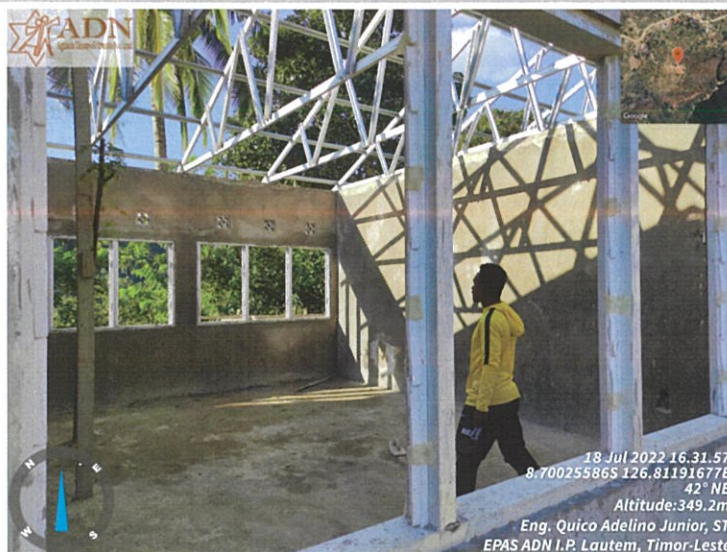

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXO C2 (IL-05)

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BAZICO FILIAL TIRILOLO ILIOMAR
FATIN PROJEITO : LAUTEM, SUCO TIRILOLO
DONO DO PROJEITO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO
KAER HUSI : GRUPO KOMUNITARIU PKRIE MEJD EBF TIRILOLO

SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT				ADN PROGRESS REPORT					
NO	WORK ITEM DESCRIPTION	AMOUNTH	WEIGHTH	PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
				AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH
				USD	%	USD	%	USD	%
1	PRELIMINARIES	\$ 3,075.00	3.78%	\$ 2,475.00	3.04%	\$ -	0.00%	\$ 2,475.00	3.04%
2	GROUNDWORK (Pekerjaan Tanah)	\$ 2,435.52	2.99%	\$ 2,435.52	2.99%	\$ -	0.00%	\$ 2,435.52	2.99%
3	CONCRETE (Pekerjaan Beton)	\$ 12,398.84	15.22%	\$ 3,099.71	3.81%	\$ 8,703.31	10.69%	\$ 11,803.02	14.49%
4	STONE MASONRY AND MASONRY BLOCKWORK (Pek. Pasangan batu dan pasang batako)	\$ 5,924.90	7.28%	\$ 2,913.60	3.58%	\$ 3,011.30	3.70%	\$ 5,924.90	7.28%
5	STEEL ROOF STRUCTURE & CEILING (StructurAtap Baja dan Plafond)	\$ 12,479.30	15.32%	\$ -	0.00%	\$ 7,006.01	8.60%	\$ 7,006.01	8.60%
6	JOINERY FIXTURES	\$ 659.64	0.81%	\$ -	0.00%		0.00%	\$ -	0.00%
7	ROOFING (Pek. Atap)	\$ 6,912.27	8.49%	\$ -	0.00%		0.00%	\$ -	0.00%
8	WINDOWS (Pekerjaan Jendela)	\$ 3,596.40	4.42%	\$ -	0.00%	\$ 2,632.50	3.23%	\$ 2,632.50	3.23%
9	DOORS AND HARDWARE (Pek. Pintu,Penggantung dan Pengunci)	\$ 1,267.16	1.56%	\$ -	0.00%	\$ 600.00	0.74%	\$ 600.00	0.74%
10	FINISHES (Pek Finishing atau plesteran)	\$ 9,252.37	11.36%	\$ -	0.00%	\$ 3,780.45	4.64%	\$ 3,780.45	4.64%
11	PAINTING (Pek. Pengecatan)	\$ 2,864.47	3.52%	\$ -	0.00%		0.00%	\$ -	0.00%
12	ELECTRICAL INSTALLATION (full installation)	\$ 2,794.09	3.43%	\$ -	0.00%		0.00%	\$ -	0.00%
13	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 8,437.95	10.36%	\$ -	0.00%		0.00%	\$ -	0.00%
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 72,097.95	88.53%	\$ 10,923.84	13.41%	\$ 25,733.57	31.60%	\$ 36,657.40	45.01%
B	OVERHEAD	\$ 6,340.00	7.785%	\$ 1,585.00	1.95%	\$ -	0.00%	\$ 1,585.00	1.95%
C	CONTIGENCY	\$ 3,000.00	3.684%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	TOTAL PROJECT COST	\$ 81,437.95	100.00%	\$ 12,508.84	15.36%	\$ 25,733.57	31.60%	\$ 38,242.40	46.96%

PREPARA HUSI :

Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

Eng. Quico Adelino Junior
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem,ADN,I.P

VERIFIKA HUSI :

Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico,
Agua e Saneamento ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI :

Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE </				
--	--	--	--	--

ANEXO C1 Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu
Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem**

No. kontratu :

Data Inspesaun : 18/07/2022

Fatin Inspesaun : Lautem, Iliomar 1

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.4245525, Latetude : 126.493473

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2. Quico Adelino Junior

3.


4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Progressu servisu ba projetu iha fulan ida
ne'e: to'o ona iha monta bekesting no mos
kesi besi ba sinta leten.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

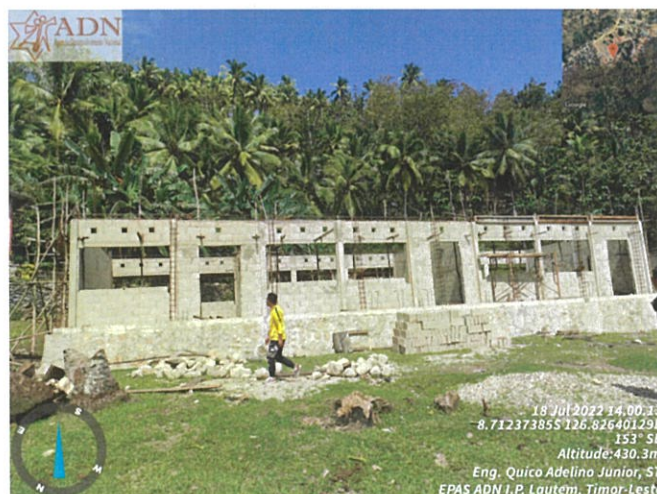

ANEXO C1 Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu
Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem**

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual


Sketch Item servisu



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

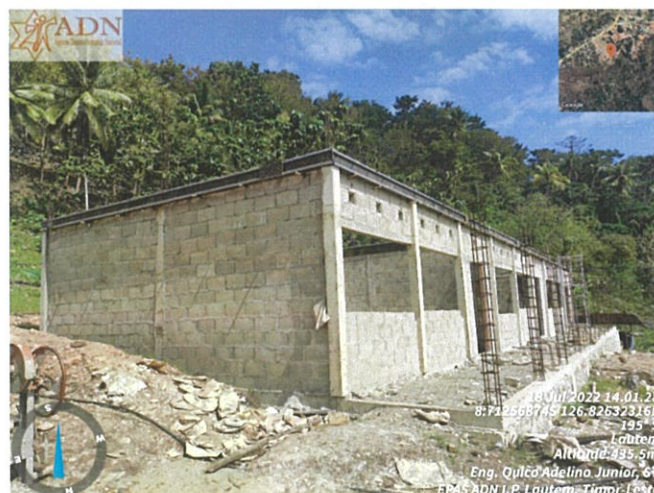

ANEXO C1 Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu
Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem**

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXO C2 (IL-6)

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA CENTRAL ILIOMAR FATIN
PROJEITO : LAUTEM, SUCO ILOMAR 1
DONO DO PROJEITO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

MAIN SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT						ADN PROGRESS REPORT					
						PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
NO	WORKS DESCRIPTION	PAGE NO		AMOUNT USD	WEIGHTH %	AMOUNT USD	WEIGHTH %	AMOUNT USD	WEIGHTH %	AMOUNT USD	WEIGHTH %
I	PRELIMINARIES	PP/3		\$ 3,075.00	2.63%	\$ 2,237.50	1.92%	\$ -	0.00%	\$ 2,237.50	1.92%
II	CLASSROOM BUILDING C	C/39	(i)	\$ 52,440.94	44.93%	\$ 13,174.02	11.29%	\$ 833.94	0.71%	\$ 14,007.96	12.00%
III	CLASSROOM & LIBRARY BUILDING CdI	CDL/36	(i)	\$ 46,942.69	40.21%	\$ 10,449.49	8.95%	\$ 1,651.42	1.41%	\$ 12,100.91	10.37%
IV	PROFESIONAL SUM FOR SITEWORKS	SW/13	(i)	\$ 4,931.12	4.22%	\$ -	0.00%		0.00%	\$ -	0.00%
A	CONSTRUCTION COST			\$ 107,389.75	92.00%	\$ 25,861.01	22.15%	\$ 2,485.36	2.13%	\$ 28,346.37	24.28%
B	OVERHEAD			\$ 6,340.00	5.43%	\$ 2,290.00	1.96%	\$ -	0.00%	\$ 2,290.00	1.96%
C	CONTIGENCY			\$ 3,000.00	2.57%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	GRAND TOTAL WITH PROVISIONAL SUM			\$ 116,729.75	100.00%	\$ 28,151.01	24.12%	\$ 2,485.36	2.13%	\$ 30,636.37	26.25%

PREPARA HUSI :


Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé
no Saneamento Municipio
Lautem, ADN, I.P


Eng. Quico Adelfino Junior
Eng. ba Projecto Edificio Publico
Beé no Saneamento Municipio
Lautem, ADN, I.P

VERIFIKA HUSI :


Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico, Agua e
Saneamento ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI :


Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario									
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura		
I	18/07/2022	Lautem/Iliomar	Inocencio dos Reis Costa Maia	Eng. Munisipio	1	Kontrola didiak bekesting sinta leten ninian tamba uma 2 ne nia bekesting la hanesan	 ADN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público ANEXO D (IL-6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem Kompanha : Grupo Komunitario <		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (TU-1) Back-up Data

Naran Projeto : Road Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850

Municipality Lautem

No. kontratu : SSS/063/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 7/7/2022

Fatin Inspesaun : Tutuala-Valu

Koordinadas :

Start Point : Long : 127.25505567, Latetude : 8.39535

End Point : Long : 127.2821187, Latetude : 8.40078

Naran Inspector : 1. Geovanio M. X. C. Aleixo


2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araújo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Inspeksaun ba pagamento #IPC5

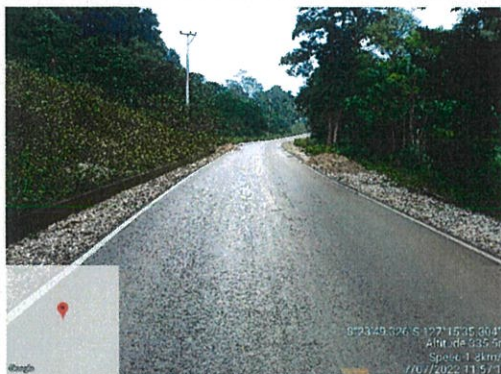



#ANEXU C1 (TU-1) Back-up Data

Naran Projeto : Road Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850
Municipality Lautem
No. kontratu : SSS/063/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ON GOING, maibe iha terrenu hetan
defeitos.





#ANEXU C1 (TU-1)

Naran Projeto : Road Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850
Municipality Lautem
No. kontratu : SSS/063/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ON GOING, maibe iha terrenu hetan defeitos.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU D (TU - 1)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran Projeto : Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850 Municipality Lautem

Kompanha : Consorcio Vacu-Hiamoinu Lda

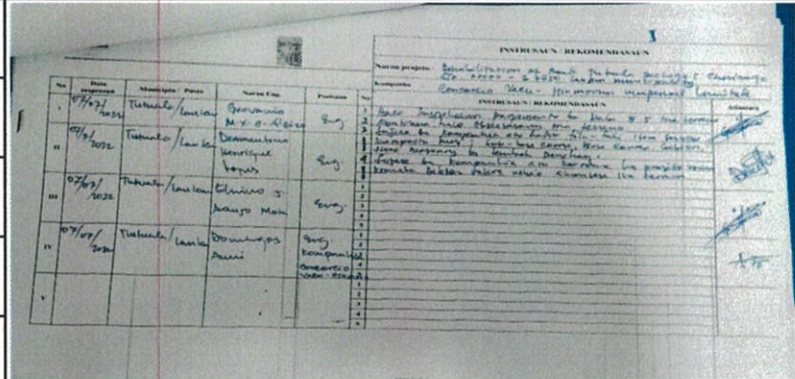No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	7/07/2022	Tutuala/Lautem	Geovanio M X C Aleixo	Eng.	1	Halo inspeksaun pagamento pagamento ba dala #5 iha terreno.		
					2	Kontinua halo observaun iha terreno.		
			Deamantino Henrique Lopes		3	Sujere ba kompanhia atu hadia fila - fali item servisu kompostu husi sub - base course, base course, gabion, stone masonry ba tembok penahan.		
					4	Sujere ba kompanhia atu koordena ho projeto nain konaba defeitos refere nebe'e akontese iha terreno.		
					5	Update relatoriu fulan-fulan nian.		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (TU-2) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation Road Section : Jct. Tutuala Roads (C2) Package 1 Sta.
3+850 - 7+725 Municipality Lautem**
No. kontratu : SSS/083/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 7/07/2022

Fatin Inspesaun : Tutuala - Valu

Koordinadas :

Start Point : Long : 127.2821183, Latetude : 8.400788

End Point : Long : 127.2998483, Latetude : 8.412501

Naran Inspector : 1. Geovanio M.X.Carlos Aleixo

2. Deamantino Henrique Lopes

3. Elnino Junior Araújo Mota

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Inspeksaun ba pagamentu #IPC5






#ANEXU C1 (TU-2) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation Road Section : Jct. Tutuala Roads (C2) Package 1 Sta.**
3+850 - 7+725 Municipality Lautem
No. kontratu : SSS/083/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

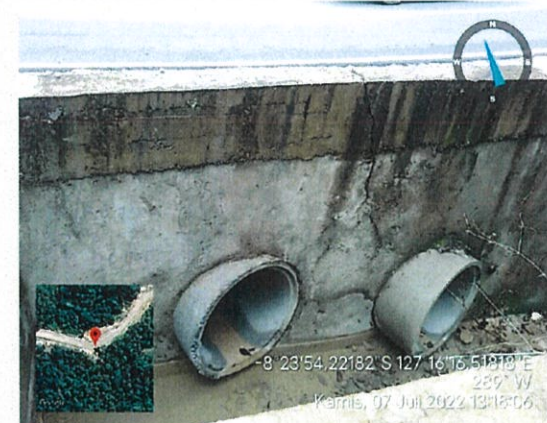

Inspeksaun ba pagamentu #IPC5





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (TU-2)

Name of Project : Rehailitation Road Section : Jct. Tutuala Valu Roads (C2) Package 1
(Sta.3+850 - Sta - 7+ 725) Lautem Municipality

Contractor : Hamutuk Unipessoal Lda

SUMMARY

No	ORIGINAL CONTRACT		VARITION ORDER #1	PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS JULHO		TO DATE	
	Item Description	Amount Contract		Amount Previous	Percentage (%)	Amount This billing	Percentage (%)	Amount to Date	PERCENTAGE (%)
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 11,531.00	\$ 11,531.00	\$ 5,140.50	0.17%	\$ -	0.00%	\$ 5,140.50	0.17%
200	EARTHWORKS	\$ 1,108,583.50	\$ 470,281.75	\$ 344,102.79	11.36%	\$ -	0.00%	\$ 344,102.79	16.00%
300	SUB BASE AND BASE COURSE	\$ 341,363.89	\$ 485,275.39	\$ 385,991.45	11.79%	\$ -	0.00%	\$ 385,991.45	10.91%
400	SURFACE COURSE AND PAVEMENT WORKS	\$ 644,267.13	\$ 1,066,956.22	\$ 55,958.53	11.38%	\$ 660,722.66	15.35%	\$ 716,681.18	24.14%
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 29,367.68	\$ 10,765.29	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 536,637.68	\$ 499,816.35	\$ 281,701.75	10.66%	\$ -	0.00%	\$ 281,701.75	9.49%
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 9,667.53	\$ 101,611.96	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 2,681,418.41	\$ 2,646,237.96	\$ 1,072,895.02	45.36%	\$ 660,722.66	15.35%	\$ 1,733,617.67	60.70%
B	Construction Fee & Overhead (10% of A)	\$ 268,141.84	\$ 264,623.80	\$ 107,289.50	4.54%	\$ 66,072.27	1.54%	\$ 173,361.77	6.07%
C	Construction Tax (2% of A + B)	\$ 58,991.21	\$ 58,217.24	\$ 23,603.69	1.00%	\$ 14,535.90	0.34%	\$ 38,139.59	1.34%
D	Grand Total (A + B +C)	\$ 3,008,551.46	\$ 2,969,079.00	\$ 1,203,788.21	50.89%	\$ 741,330.82	17.23%	\$ 1,945,119.03	68.11%

Inspeksaun Husi :


(Eng. Geovânio M.X.C. Aleixo)
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P


(Eng. Deamantino H. Lopes)
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

Verifika Husi :


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projecto Infrastructura,
Transportes e Irigasaun ADN,I.P

Sertifika Husi :


(Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Da Unidade de Controlo E
Validação De Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU D (TU - 2)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran Projeto : Rehabilitation Road Section: Jct. Tutuala Roads (C2) Package 1 Sta. 3+850 - 7+725 Municipality Lautem

Kompanha : Hamutuk Unipessoal Lda.

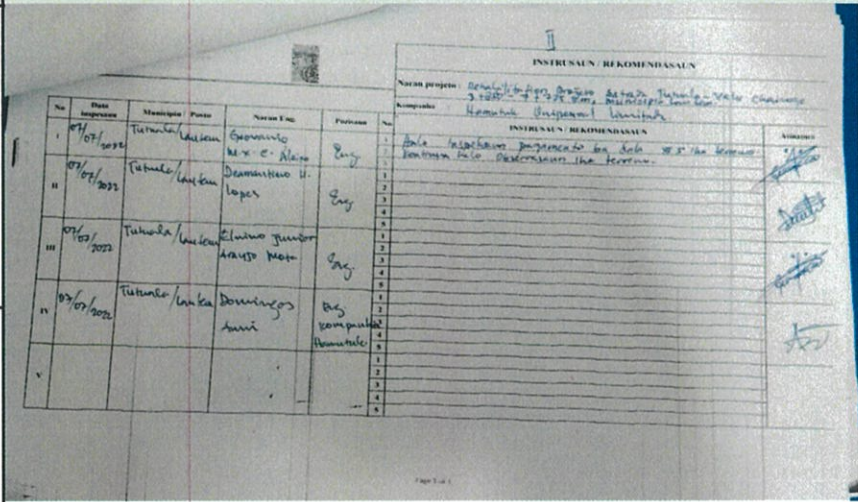No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	7/07/2022	Tutuala/Lautem	Geovanio M X C Aleixo	Eng.	1	Halo inspeksaun pagamento ba dala #5 iha terreno.	
			Deamantino H. Lopes		2	Halo observaun servisu iha terreno	



ANEXO C1 (TU-03)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba EBC Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem**

Data Inspesaun : 07/07/2022

Fatin Inspesaun : Lautem, Tutuala, Loiquero

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.2426145 , Latetude : 126.1136692

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progressu servisu ba projeitu ida ne'e


iha fulan ida ne'e maka :

To'o ona iha montajem armadura ba iha

top-beam inklui montajem kaixa ka

begesting ba top beam ninian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

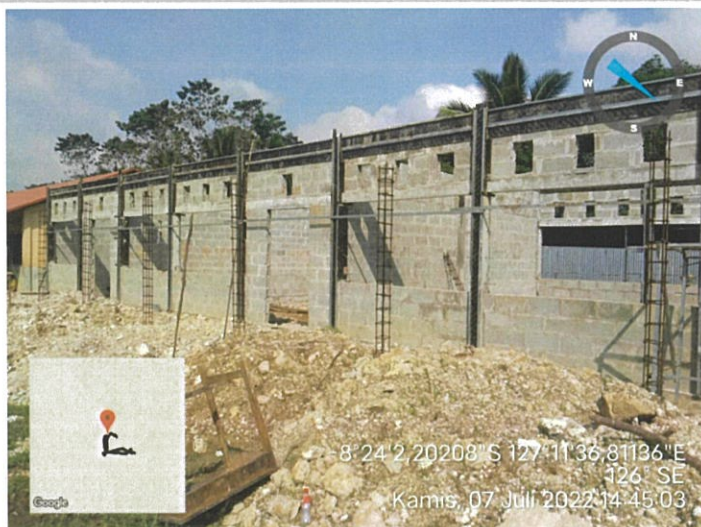



ANEXO C1 (TU-03)

Back-up Data


Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba EBC Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

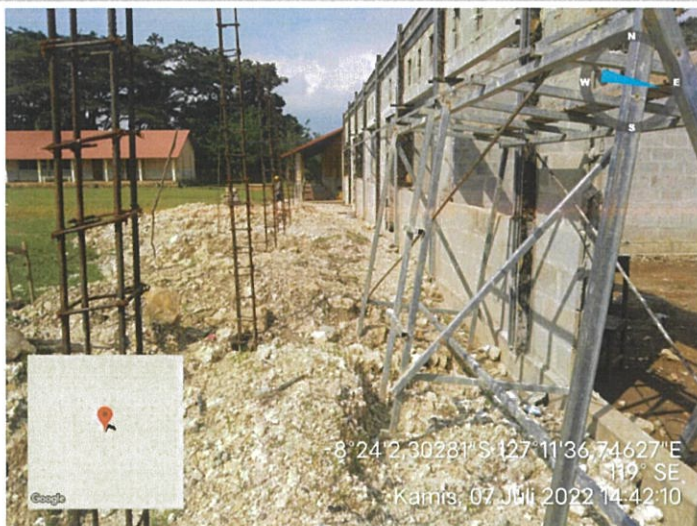

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXO C2 (TU-03)

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA BASICA CENTRAL MEHARA
FATIN PROJEITO : LOSPALOS, SUCO MEHARA
DONO DO PROJEITO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT				ADN PROGRESS REPORT					
NO	WORK ITEM DESCRIPTION	AMOUNTH	WEIGHTH	PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
				AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH
				USD	%	USD	%	USD	%
1	PRELIMINARIES	\$ 3,075.00	4.59%	\$ 2,475.00	3.69%	\$ -	0.00%	\$ 2,475.00	3.69%
2	GROUNDWORK (Pekerjaan Tanah)	\$ 2,787.74	4.16%	\$ 2,787.74	4.16%	\$ -	0.00%	\$ 2,787.74	4.16%
3	CONCRETE (Pekerjaan Beton)	\$ 11,544.38	17.23%	\$ 6,543.50	9.77%	\$ 910.49	1.36%	\$ 7,453.99	11.13%
4	STONE MASONRY AND MASONRY BLOCKWORK (Pek. Pasangan batu dan pasang batako)	\$ 6,256.52	9.34%	\$ 5,553.16	8.29%	\$ 142.56	0.21%	\$ 5,695.72	8.50%
5	STEEL ROOF STRUCTURE & CEILING (StructurAtap Baja dan Plafond)	\$ 10,081.10	15.05%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
7	ROOFING (Pek. Atap)	\$ 5,501.65	8.21%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
8	WINDOWS (Pekerjaan Jendela)	\$ 2,597.40	3.88%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
9	DOORS AND HARDWARE (Pek. Pintu,Penggantung dan Pengunci)	\$ 960.00	1.43%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
10	FINISHES (Pek Finishing atau plesteran)	\$ 7,494.43	11.19%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
11	PAINTING (Pek. Pengecatan)	\$ 2,127.73	3.18%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
12	ELECTRICAL INSTALLATION (full installation)	\$ 2,294.62	3.43%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
13	PROVISIONAL SUM FOR SITEWOKS	\$ 2,935.00	4.38%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 57,655.57	86.06%	\$ 17,359.40	25.91%	\$ 1,053.05	1.57%	\$ 18,412.45	27.48%
B	OVERHEAD	\$ 6,340.00	9.463%	\$ 1,585.00	2.37%	\$ -	0.00%	\$ 1,585.00	2.37%
C	CONTIGENCY	\$ 3,000.00	4.478%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	TOTAL PROJECT COST	\$ 66,995.57	100.00%	\$ 18,944.40	28.28%	\$ 1,053.05	1.57%	\$ 19,997.45	29.85%

PREPARA HUSI :

Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Lautem,ADN,I.P

VERIFIKA HUSI :

Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico, Agua e
Saneamento ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI :

Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade ADN, I.P



#ANEXO C1 (TU-4) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba EPE Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu
Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem**

No. kontratu :

Data Inspesaun : 07/07/2022

Fatin Inspesaun : Lautem, Iliomar 1

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.235922359, Latetude : 127.11972709

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : **1. Inocencio dos Reis Costa Maia**

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

.....

Progressu servisu ba projetu ida ne'e,
to'o on iha servisu preparasaun
armadura ba iha top beam ninian,
inklui preparasaun kaixa ka begesting
ba iha top beam.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXO C1 (TU-4) Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitasaun ba EPE Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu
Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem**

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

.....

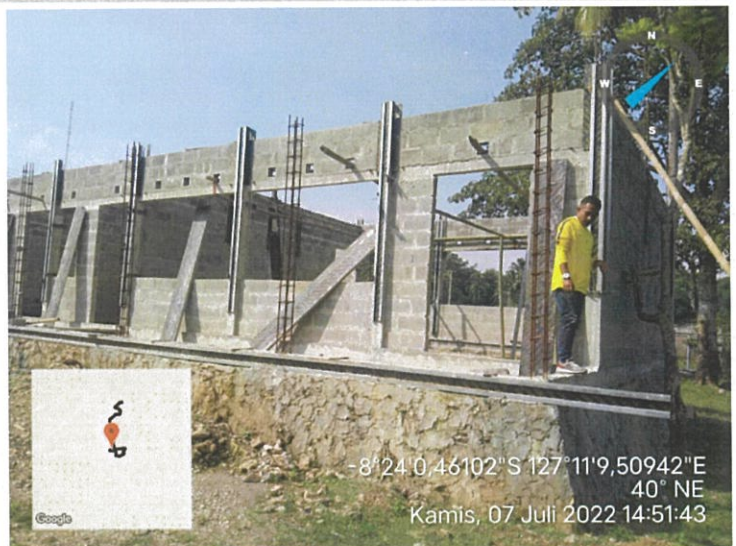



#ANEXO C2 (TU-04)

TÍTULO DO PROJEITO : NOVA CONSTRUÇÃO ESCOLA PRE - ESCOLAR MEHARA
FATIN PROJEITO : TUTUALA, SUCO MEHARA
DONO DO PROJEITO : MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

SUMMARY

ORIGINAL CONTRACT				ADN PROGRESS REPORT					
NO	WORK ITEM DESCRIPTION	AMOUNTH	WEIGHTH	PREVIOUS MONTH PROGRESS		THIS MONTH PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
				AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH	AMOUNTH	WEIGHTH
				USD	%	USD	%	USD	%
1	PRELIMINARIES	\$ 3,075.00	3.36%	\$ 2,475.00	2.70%	\$ -	0.00%	\$ 2,475.00	2.70%
2	GROUNDWORK (Pekerjaan Tanah)	\$ 3,716.75	4.06%	\$ 3,716.75	4.06%	\$ -	0.00%	\$ 3,716.75	4.06%
3	CONCRETE (Pekerjaan Beton)	\$ 13,919.82	15.21%	\$ 7,228.82	7.90%	\$ 1,607.60	1.76%	\$ 8,836.41	9.66%
4	STONE MASONRY AND MASONRY BLOCKWORK (Pek. Pasangan batu dan pasang batako)	\$ 11,106.56	12.14%	\$ 10,063.69	11.00%	\$ 369.41	0.40%	\$ 10,433.10	11.40%
5	STEEL ROOF STRUCTURE & CEILING (StructurAtap Baja dan Plafond)	\$ 11,027.94	12.05%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
6	JOINERY FIXTURES	\$ 447.82	0.49%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
7	ROOFING (Pek. Atap)	\$ 6,082.52	6.65%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
8	WINDOWS (Pekerjaan Jendela)	\$ 2,726.00	2.98%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
9	DOORS AND HARDWARE (Pek. Pintu, Penggantung dan Pengunci)	\$ 2,485.00	2.72%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
10	FINISHES (Pek Finishing atau plesteran)	\$ 9,875.00	10.79%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
11	PAINTING (Pek. Pengecatan)	\$ 2,885.75	3.15%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
12	PLUMBING AND DRAINAGE (Pek. perpipaan)	\$ 2,733.57	2.99%	\$ 691.47	0.76%	\$ -	0.00%	\$ 691.47	0.76%
13	ELECTRICAL INSTALLATION (full installation)	\$ 2,275.59	2.49%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
14	PROVISIONAL SUM FOR DEMOLITION	\$ 424.98	0.46%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
15	PROVISIONAL SUM FOR SITEWORKS	\$ 9,387.89	10.26%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 82,170.19	89.79%	\$ 24,175.72	26.42%	\$ 1,977.01	2.16%	\$ 26,152.73	28.58%
B	OVERHEAD	\$ 6,340.00	6.928%	\$ 1,585.00	1.73%	\$ -	0.00%	\$ 1,585.00	1.73%
C	CONTIGENCY	\$ 3,000.00	3.278%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	TOTAL PROJECT COST	\$ 91,510.19	100.00%	\$ 25,760.72	28.15%	\$ 1,977.01	2.16%	\$ 27,737.73	30.31%

PREPARA HUSI :


Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Lautem, ADN, I.P

VERIFIKA HUSI :

Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projeto Edificio Publico, Agua e
Saneamento ADN, I.P

SERTIFIKA HUSI :

Engª. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P

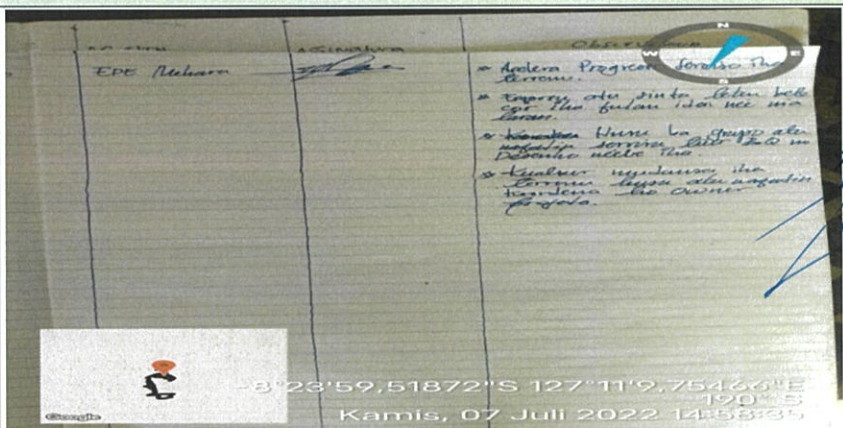 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					ANEXO D (TU-4) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Naran projeto : Rehabilitasaun ba EPE Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem							
Kompanha : Grupo Komunitario							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	7/07/2022	Lautem/Tutuala	Inocencio dos Reis Costa Maia	Eng. Munisipio	1	Aselera progressu servisu iha terrenu tamba tarde oituan ona.	
					2	Esforsu atu sinta leten bele cor iha fulan ida ne'e nia laran	
					3	Husu ba grupu atu nafatin servisu tuir BoQ no Desenho ne'ebe iha	
					4	Kualker mudansa iha terrenu husu atu nafatin koordena ho owner projetu.	
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (IL -1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Ailebere to Pujiara, Arafalun and Ledo Ira, Illiomar - Lautem Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000363

Data Inspesaun : 28 - 07 - 2022

Fatin Inspesaun : Ailebere, Pujiara, Arafalun, Ledo Ira - illiomar

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.71475322S, Latetude : 126.62107446E

End Point : Long : 8.72949511S, Latetude : 126.80140628E

Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Poste 12 m Pinta mos ona & pondasi nakfera

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (IL -1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Ailebere to Pujiara,
Arafalun and Ledo Ira, Illiomar - Lautem Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000363

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Treckschoor mamar & Pondasi rahun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Pinta mos ona & Pondasi rahun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (IL -1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Ailebere to Pujiara,
Arafalun and Ledo Ira, Illiomar - Lautem Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000363

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Poste 12 halis / kleuk & tesi ai nebe besik iha
linha

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Poste 9 m pinta mos ona, Poste kleuk/halis &
Pondasi rahun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LU-1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Ailembere, and Liarafa, Luro - Lautem Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000432

Data Inspesaun : 28 – 07 - 2022

Fatin Inspesaun : Wanira, Wairoke, ulukisi, Ailembere & Liarafa

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.48813293S, Latetude : 126.77757264E

End Point : Long : 8.52963339S, Latetude : 126.78465938E

Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Poste 12 m kleuk / halis

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LU-1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Ailembere, and Liarafa, Luro - Lautem Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000432

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Uja Pipa galvanized ba ending JTR

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Warning sign no climber protection trafo nin
seidauk Installa & Poste Pinta mos ona

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

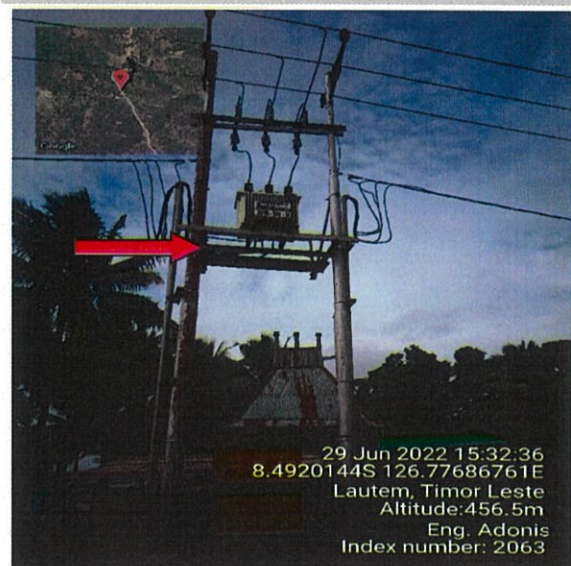



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LU-1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Ailembere, and Liarafa, Luro - Lautem Municipality


No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000432

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Treckschoor mamar & poste halis /kleuk

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

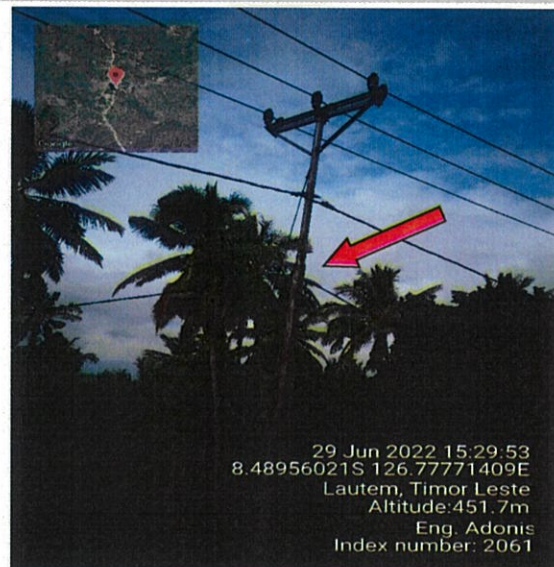

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Poste 12 m kleuk / halis

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM

Naran Eng.	Inocencio dos Reis Costa Maia
------------	-------------------------------

Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS
-----------	----------------------------

2022

JULHO

Obs

[illegible]

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Naran Eng.	Inocencio dos Reis Costa Maia						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JULHO																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ILIOMAR (IL)	3	New Construction of Health Post and Doctor Hause Building in Fuat Iliomar, Lautem Municipality Lautem	Naesalobu	RDTL-MS-DNA-ICB-21-072	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Actual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu
Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu
Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili
Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :



(Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Lautem,
ADN,I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN,I.P

Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN,I.P

2022

✓

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																																
Naran Eng.	Deamantino Henrique Lope						2022																																
Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JULHO																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ILIOMAR (IL)	6	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - BARIKAFI CHAINAGE 0+000-7+000 LAUTEM MUNICIPALITY	Lili Unip. Lda.	MPW - W 210079	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - KOTAMUTU - LAKAWA CHAINAGE 0+000-6+500	ILIE CHAO, UNIPESSOAL LDA	MPW - W - 210077	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Additional Emergency Iliomar Roads	Resister Unip.Lda	SSS/140/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
TUTUALA (TU)	1	Road Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850 Municipality Lautem	Consorcio Vacu-Hiamoinu Lda	SSS/063/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Rehabilitation Road Section : Jct. Tutuala Roads (C2) Package 1 Sta. 3+850 - 7+725 Municipality Lautem	Hamutuk Unipessoal, Lda	SSS/083/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

	Plano Periode inspesaun iha tereinu		Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu		Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili		Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu
---	-------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Prepara Husi :


Eng. Deamantino Henrique Lopes
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN,I.P

Aprova Husi :


(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN,I.P

PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM

Naran Eng.	Deamantino H. Lopes
------------	---------------------

Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS
-----------	----------------------------

2022

[illegible]

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOV.º RNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																																
Naran Eng.	Deamantino H. Lopes						2022																																
Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JULHO																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ILIOMAR (IL)	6	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - BARIKAF A CHAINAGE 0+000+7+000 LAUTEM MUNICIPALITY	Lili Unip. Lda.	MPW - W 210079	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - KOTAMUTU - LAKAWA CHAINAGE 0+000-6+500	ILIE CHAO, UNIPESSOAL LDA	MPW - W - 210077	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
2	Additional Emergency Iliomar Roads	Resister Unip.Lda	SSS/140/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actual																																	
TUTUALA (TU)	1	Road Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850 Municipality Lautem	Consorcio Vacu-Hiamoinu Lda	SSS/063/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Rehabilitation Road Section : Jct. Tutuala Roads (C2) Package 1 Sta. 3+850 - 7+725 Municipality Lautem	Hamutuk Unipessoal, Lda	SSS/083/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

	Plano Periode inspesaun iha tereinu		Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu		Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili		Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu
---	-------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Prepara Husi :



Eng. Deamantino H. Lopes
Eng. ba Projeto Infrastrutura e Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN,I.P

Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN,I.P

2022

[illegible]

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																																
Naran Eng.	Geovanio M.X.C. Aleixo						2022																																
Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JULHO																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ILIOMAR (IL)	6	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - BARIKAPA CHAINAGE 0+000+7+000 LAUTEM MUNICIPALITY	Lili Unip. Lda.	MPW - W 210079	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	7	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - KOTAMUTU - LAKAWA CHAINAGE 0+000-6+500	ILIE CHAO, UNIPESSOAL LDA	MPW - W - 210077	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
2	Additional Emergency Iliomar Roads	Resister Unip.Lda	SSS/140/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actual																																	
TUTUALA (TU)	1	Road Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850 Municipality Lautem	Consorcio Vacu-Hiamoinu Lda	SSS/063/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Rehabilitation Road Section : Jct. Tutuala Roads (C2) Package 1 Sta. 3+850 - 7+725 Municipality Lautem	Hamutuk Unipessoal, Lda	SSS/083/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu
Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu
Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili
Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu


Prepara Husi :



Eng. Geovanio M.X.C. Aleixo

Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Lautem, ADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN,I.P

Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Guterres)


Adjunto Director Executivo ADN,I.P

2022



 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOV'NO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																																	
Naran Eng.	Geovanio M.X.C. Aleixo						2022																																	
Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JULHO																															OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ILIOMAR (IL)	6	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - BARIKAFA CHAINAGE 0+000+7+000 LAUTEM MUNICIPALITY	Lili Unip. Lda.	MPW - W 210079	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	7	R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT LURO - KOTAMUTU - LAKAWA CHAINAGE 0+000-6+500	ILIE CHAO, UNIPESSOAL LDA	MPW - W - 210077	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	2	Additional Emergency Iliomar Roads	Resister Unip.Lda	SSS/140/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
TUTUALA (TU)	1	Road Rehabilitation From Tutuala to Valu Chainage 0+000 - 3+850 Municipality Lautem	Consorcio Vacu-Hiamoinu Lda	SSS/063/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	2	Rehabilitation Road Section : Jct. Tutuala Roads (C2) Package 1 Sta. 3+850 - 7+725 Municipality Lautem	Hamutuk Unipessoal, Lda	SSS/083/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
TOTAL PROJETO ON-GOING																																								

Note:

	Plano Periode inspesaun iha tereinu		Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu		Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili		Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu
---	-------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Prepara Husi :


Eng. Geovanio M.X.C. Aleixo
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e Irigasaun Municipi Lautem, ADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN,I.P

Aprova Husi :


(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN,I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOV^o RNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Naran Eng.	Inocencio dos Reis Costa Maia						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Municipio	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JULHO																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ILIOMAR (IL)	3	New Construction of Health Post and Doctor Hause Building in Fuat Iliomar, Lautem Municipality Lautem	Naesalobu	RDTL-MS-DNA-ICB-21-072	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Note:

 Plano Periode inspesaun iha tereinu
  Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu
  Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili
  Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :


 (Eng. Inocencio dos Reis Costa Maia)
 Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio
 Lautem, ADN,I.P

Sertifika Husi :


 (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN,I.P

Aprova Husi :



 (Eng. Januario Maia Guterres)
 Adjunto Director Executivo ADN,I.P

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																																
Naran Eng.	Quico Adelino Junior							2022																																
Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JULHO																															OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LAUTEM (LA)	7	MEJD PKRIE EBF 1.2 Euquise	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	8	MEJD PKRIE EBF Tasi Ibun	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
LOSPALOS (LO)	2	Konstrusaun Edificio PGR Municipio Lautem	Cambota	RDTL-D.FeO/APRO/PGR/19.001/2019	LM	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	4	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Lautem, Ministry of Health, Timor Leste	Parapa Bemiziuu Star Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-189	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	15	Konstrusaun Fatin Izolamentu iha CHC Lospalos Municipiu Lautem	RICS Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-253	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	17	Projetu Konstrusaun Foun ESTV Lospalos	Lero Company, Lda	NCB:14/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	18	MEJD PKRIE EBF 1.2 Lospalos	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	19	MEJD PKRIE Pre-Escolar Ira Ara	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	21	MEJD PKRIE ESG Publico Lere Anan Timur Lospalos	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	22	Konstrusaun Foun ba ESTV Laico Lospalos Municipio Lautem	Salve, Unip. Lda	CNB:013/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	23	Complition of Veteranus Houses - Lospalos Municipality Lautem	Venjus Unip. Lda	NCB/010CD/ADN/IP/MPOV/DILI/2022	LM	NCB/010CD/ADN/IP/MPOV/DILI/2022	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
LURO (LU)	8	MEJD PKRIE EBF Abere	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	9	MEJD PKRIE Pre-Escolar Amaira Luro	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	10	MEJD PKRIE EBF 1.2 Baricafa	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	11	MEJD PKRIE EBC 1.2.3 Luro	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	12	MEJD PKRIE ESGPF Fernando Lasama Luro	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING
	13	MEJD PKRIE EBF Ussuvasu	Grupo Comunitario	-	TP	MINISTERIO EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	
							Actual																																	ON GOING



 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPESAUN GERAL PROJECTO MUNICIPIO LAUTEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Naran Eng.	Quico Adelino Junior							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Município	MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JULHO																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ILIOMAR (IL)	3	New Construction of Health Post and Doctor Hause Building in Fuat Iliomar, Lautem Municipality Lautem	Naesalobu	RDTL-MS-DNA-ICB-21-072	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Actual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Note:

 Plano Periode inspesaun iha tereinu

 Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

 Relatoriu avaliasaun mensal iha Dili

 Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :



(Eng. Quico Adelino Junior)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Lautem,
ADN,I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade , ADN,I.P



Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo ADN,I.P

Naran Eng.		Adonis Julio Fernandes						2022																															
Municipio		MUNICIPIO LAUTEM NO POSTOS																																					
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JULHO																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
LAUTEM (LA)	1	Konstrusaun Edificio PGR Municipio Lautem	Cambota	RDTL-D.FeO/APRO/PGR/19.001/2019	LM-CD	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	Plan																																
							Actula																																
	2	Projectu Konstrusaun Turismu Komunitariu iha COM, Postu Administrativu Lautem	Joli Toni Unip Lda	17/CNEFP?XI/2016	LM-BS	SEFOPE	Plan																																
							Actula																																
	3	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Euquisi iha Aldeia Barlio Suco Euquisi Postu Administrativu Lautem Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 EUQUISI	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
	4	Rehabilitasaun ba EBF Tasi Ibutun Lautem iha Aldeia Lautem Suco Parlamento Postu Administrativu Lautem Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EBF TASI IBUN LAUTEM	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
	5	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Lautem, Ministry of Health, Timor Leste	Parapa Bemizuiun Star Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-189	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actula																																
LOSPALOS (LO)	1	Rehabilitasaun ba ESG Lere Anan Timur Lospalos iha Aldeia Kuluhun Suco Fuliuro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE ESG LERE ANAN TIMOR LOSPALOS	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
	2	Rehabilitasaun ba Pre Escolar Ira - Ara iha Aldeia Lospala Suco Fuliuro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE PRE ESCOLAR IRA-ARA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
	3	Rehabilitasaun ba EBF No-2 Lospalos iha Aldeia Central Suco Fuliuro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EBF NO2 LOSPALOS	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																																
	4	Konstrusaun Fatin Izolamentu iha CHC Lospalos Municipiu Lautem	RICS Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-253	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actula																																
	5	New Construction Of Houses For Veteran 17 Unit	Davinci	001/RDTL/MP/IE/AND/DIL/VI/2016	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																
							Actula																																
6	Konstrusaun Muru Haleu Edifisiu Administasaun Munisipiu no Jardim Municipiu Lautem	Marvong Construction Unip.Lda	02/KML-PDIM/SMA/X/2021	PDIM	ESTATAL	Plan																																	
						Actual																																	
7	Rehabilitasaun Residencia Adminitrador + Muru no Jardim Municipio Lautem	Marvong Construction Unip.Lda	01/KML-PDIM/SMA/X/2021	PDIM	ESTATAL	Plan																																	
						Actual																																	
LURO (LU)	1	Rehabilitasaun ba ESG Fernando Lasama de Luro iha Aldeia Amahira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE LURO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	2	Rehabilitasaun ba EBF Ussuvasu iha Aldeia Ussufasu Suco Baricafa Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EBF USSUVASU	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	3	Rehabilitasaun ba EBC Luro iha Aldeia Amaira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EBC LURO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	4	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Barikafa iha Aldeia Sarelari Suco Baricafa Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 BARIKAFA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	5	Rehabilitasaun ba Pre Escolar Amaira Luro iha Aldeia Amaira Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE PRE ESCOLAR AMAIRA LURO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
6	Rehabilitasaun ba EBF Abere iha Aldeia Abere Suco Luro Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EBF ABERE	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
						Actual																																	
7	New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Ailembere, and Liarafo, Luro - Lautem Municipality	Vairoque Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000432	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actula																																	
	1	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Ta - Besi Fera Naben - Fuat iha Aldeia Acadiliro Suco Fuat Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 TA BESI FERA NABEN-FUAT	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actula																													Servisu Electricidade seidauk			

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JULHO																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	ILIOMAR (IL)	2	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Tiriolo iha Aldeia Tiriolo Suco Tiriolo Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 TIRILOLO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</


Note: Plano Periode inspesaun iha tereinu Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Hasi

(Adonis Julio Fernandes)
Eng. hã Projéitu ME,ADN,IP

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN,I.P

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN,I.P

2022



Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	JULHO																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ILIOMAR (IL)	2	Rehabilitasaun ba EBF 1,2 Tiriolo iha Aldeia Tiriolo Suco Tiriolo Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EBF 1,2 TIRILOLO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actua																																
	3	Rehabilitasaun ba EBC de Iliomar iha Aldeia Ara- ara Suco Iliomar I Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EBC DE ILIOMAR	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actua																																
	6	New Installation MV, LV Line and House Connection from Alebere to Pujara, Arafalun and Ledo Ira, Iliomar - Lautem Municipality	Lor Construction Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI- PEN : 00000363	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actua																																
7	New Construction of Health Post and Doctor House Building in Fuat Iliomar, Lautem Municipality Lautem	Naesalobu	RDTL-MS-DNA-ICB-21-072	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
						Actua																																	
TUTUALA (TU)		Rehabilitasaun ba EBC Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EBC MEHARA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actua																																
		Rehabilitasaun ba EPE Mehara iha Aldeia Loiquero Suco Mehara Postu Administrativu Tutuala Munisipiu Lautem	MEJD PKRIE EPE MEHARA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actua																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note: Plano Periode inspesaun iha tereinu Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Preparat Husi :

(Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projeto ME,ADN.IP

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade , ADN,I.P


Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN,I.P
