



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU MANATUTO

SETEMBRO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO MANATUTO

SETEMBRO 2022

Prepara Husi :




(Eng. Aleixo da Costa Andrade)

Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P



(Eng. Jose R. Carlos Gusmão)

Eng. ba Projeto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P



(Eng. Fabiano F.M Madeira)

Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P



(Eng Domingos da Costa e Silva)

Eng. ba Projeto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P



(Eng. Adonis Julio Fernandes)

Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P

Verifika Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Publiku no Beé
Saneamentu, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeitu Infraestrutura e
Irigasaun, ADN, I.P


(Eng. Deolindo de F. Marques)
Chefe Seksaun ba Projeitu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO.....	1
INDICE	3
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Manatuto.....	3
1.3. Lista Projectos.....	7
II. PROGRESU FISIKU	25
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan.....	25
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	26
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	26
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	27
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	27

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.....	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto.....	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto	6
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamentos	7
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Manatuto Por Sectores.....	11
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Manatuto Por Ministerio.....	18
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto	25

I. INTRODUSAUN.


1.1.Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Presidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu asegura katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeńu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria

1.2. Perfil Municipio Manatuto

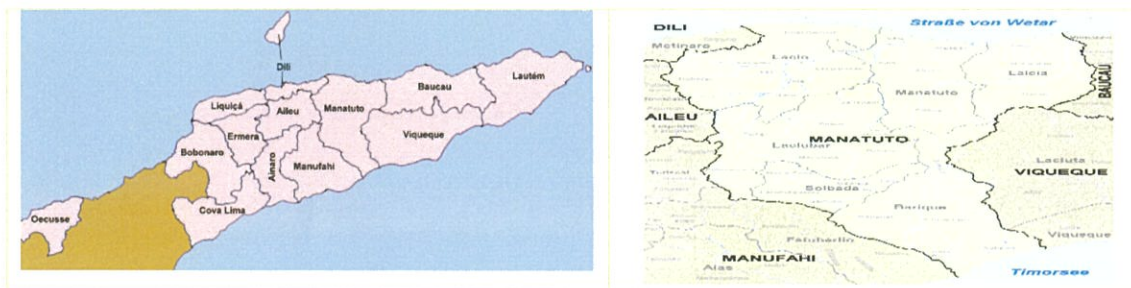

Mapa 2 hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Manatuto iha luan 1,706 km² ho populasan nain 42,742 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Manatutoiha Postos Administrativos nen (6), Sukus 29 no aldeias 99 , mak hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Natarbora		Laclo		Laklubar		Laleia	
Sukus	Aldeia	Sukus	Aldei	Suku	Aldeia	Sukus	Aldeias
Aubeon	2	Hohorai	4	Batara	4	Cairui	7
Barique	2	Locomesak	5	Hatu ma quere k	3	Hatulara n	3
Fatuwaque	2	Uma kaduak	3	Funar	4	Lifau	3
Manehat	3	Uma naruk	4	Mane lima	6		
Uma Boco	2			-	8		
				Sanan a Na'i	4		
Total	11		18		30		13

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 69

Manatuto		Soibada	
sukus	Aldeia	sukus	aldeias
Ailili	2	Fatuma querek	2
Aitekas	4	Leo-hat	2
Cribas	5	Manlala	2
Iliheu	5	Maun Fahe	2
Ma'abat	2	Somoro	2
Sau	2		
	22		10

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Manututu								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	3	3				3	
2	Administrasaun no Financas	0	0				0	
3	Motorista	1	1				1	
4	Seguransa	0	0				0	
Total		4					4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto.

ASET ADN,IP MUNICIPIO MANATUTO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1	1					
2	Kareta	1	1					
3	Desktop HP / Monitor	1	1					
4	Laptop HP	1	1					
5	Printer Cannon	1	1					
6	UPS	1	1					
7	Armario File	2	2					
8	Armario Tau hena	3	3					
9	Meja escritorio	1	1					
10	Meja han	1	1					
11	Meja TV (kiik)	1	1					
12	Kadeira escritorio	6	6					
13	Kadeira han	4	4					
14	Sofa	1 Set	1 Set					
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3	3 Set	3 Set					
16	Jeleira	1	1					
17	Water Dispenser	1	1					
18	TV + Parabola	1 Set	1 Set					
19	AC	4	4					
20	Kipas Angin	4	4					
21	Kompor	1	1					
22	Kompor Gas	1	1					

23	Rack sepatu	3	3					
24	Rack Piring	1	1					
25	Lampu	11	11					
26	Water Pump Sanyo	1	1					

1.3 : Lista Projectos

Projetu hotu ne'ebe akumula iha lista ne'e bazeia ba dadus projetu ne'ebe sei lao hela no mos projeto ne'ebe abandona ona tinan barak, projeto hirak ne'e fahe tuir lista 1.3.1 Projeto Por Fundus Finansiamentos, 1.3.2 Projeto Por Sectors no 1.3.3 Projeto Por Ministerios.

1.3.1 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamentos

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI+Fundu Covid-19+LM-BS+LM-CD+LM-TP+PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	11	\$ 2,449,084.64	27.81%
2	Laclo	9	\$ 49,767,971.56	87.58%
3	Laclubar	11	\$ 36,930,495.47	80.42%
4	Laleia	4	\$ 534,417.22	31.32%
5	Manatuto Villa	21	\$ 45,928,020.17	80.38%
6	Soibada	7	\$ 4,470,048.98	77.36%
	Grand Total	63	\$ 140,080,038.04	81.75%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique			
2	Laclo	3	\$ 48,698,873.04	87.85%
3	Laclubar	2	\$ 35,075,150.37	82.49%
4	Laleia			
5	Manatuto Villa	7	\$ 44,188,670.20	81.61%
6	Soibada	1	\$ 3,553,954.20	85.91%
	Grand Total	13	\$ 131,516,647.81	84.27%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique			
2	Laclo			
3	Laclubar			
4	Laleia			
5	Manatuto Villa	4	\$ 665,658.27	54.77%
6	Soibada			
	Grand Total	4	\$ 665,658.27	54.77%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	2	\$ 404,938.08	54.93%
2	Laclo	1	\$ 50,745.00	34.95%
3	Laclubar	2	\$ 675,432.39	29.86%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	1	\$ 29,275.84	15.92%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	6	\$ 1,160,391.31	38.48%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	7	\$ 1,849,648.24	12.49%
2	Laclo	2	\$ 646,243.79	84.96%
3	Laclubar	2	\$ 661,982.34	28.68%
4	Laleia	2	\$ 305,588.74	2.60%
5	Manatuto Villa	1	\$ 175,266.63	0.00%
6	Soibada	4	\$ 630,201.31	30.30%
	Grand Total	18	\$ 4,268,931.05	27.38%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique			
2	Laclo	1	\$ 98,147.27	0.00%
3	Laclubar	2	\$ 202,223.29	12.92%
4	Laleia	1	\$ 86,883.29	0.00%
5	Manatuto Villa	5	\$ 382,490.63	12.03%
6	Soibada	1	\$ 102,512.31	0.00%
	Grand Total	10	\$ 872,256.79	8.27%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	Barique	2	\$ 194,498.32	78.34%
2	Laclo	2	\$ 273,962.46	86.79%
3	Laclubar	3	\$ 315,707.08	54.07%
4	Laleia	1	\$ 141,945.19	100.00%
5	Manatuto Villa	3	\$ 486,658.60	48.40%
6	Soibada	1	\$ 183,381.16	100.00%
	Grand Total	12	\$ 1,596,152.81	70.28%

1.3.2 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Sectors

NO	POR SECTOR	TOTAL MUNICIPIO MANATUTO		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370,511.25	15.83%
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 162,377.94	41.85%
3	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	84.29%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	9	\$ 1,430,360.48	36.80%
5	EDUKASAUN	12	\$ 1,236,740.28	32.62%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1,076,003.44	78.57%
7	ESTRADAS	19	\$ 13,075,209.38	68.31%
8	FLOOD CONTROL	1	\$ 242,560.14	63.68%
9	IMPRESTIMO	4	\$ 115,112,106.35	85.00%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157,560.52	41.96%
12	PONTES	1	\$ 3,553,954.20	85.91%
13	SAUDE	7	\$ 840,178.96	64.25%
14	TURISMO	2	\$ 305,556.27	28.66%
	Grand Total	63	\$ 140,080,038.04	81.75%

NO	POR SECTOR	Barique		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370,511.25	15.83%
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 162,377.94	41.85%
3	COMERCIO			
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 408,460.73	26.02%
5	EDUKASAUN			
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
7	ESTRADAS	3	\$ 913,115.74	8.25%
8	FLOOD CONTROL	1	\$ 242,560.14	63.68%
9	IMPRESTIMO			
10	JUVENTUDE NO DESPORTU			
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157,560.52	41.96%
12	PONTES			
13	SAUDE	2	\$ 194,498.32	78.34%
14	TURISMO			
	Grand Total	11	\$ 2,449,084.64	27.81%

NO	POR SECTOR	Laclo		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	AGUA E SANEAMENTO			
3	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	84.29%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 170,765.07	73.64%
5	EDUKASAUN	1	\$ 98,147.27	0.00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 380,582.61	72.08%
7	ESTRADAS	3	\$ 649,558.35	84.99%
8	FLOOD CONTROL			
9	IMPRESTIMO	1	\$ 48,314,975.87	87.98%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU			
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
12	PONTES			
13	SAUDE			
14	TURISMO			
	Grand Total	9	\$ 49,767,971.56	87.58%

NO	POR SECTOR	Laclubar		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	AGUA E SANEAMENTO			
3	COMERCIO			
4	EDIFICIOS PUBLICOS			
5	EDUKASAUN	2	\$ 202,223.29	12.92%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 695,420.83	82.11%
7	ESTRADAS	4	\$ 1,337,414.73	42.58%
8	FLOOD CONTROL			
9	IMPRESTIMO	1	\$ 34,379,729.54	82.49%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU			
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
12	PONTES			
13	SAUDE	3	\$ 315,707.08	54.07%
14	TURISMO			
	Grand Total	11	\$ 36,930,495.47	80.42%

NO	POR SECTOR	Laleia		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	AGUA E SANEAMENTO			
3	COMERCIO			
4	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 419,275.62	33.85%
5	EDUKASAUN	1	\$ 86,883.29	0.00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
7	ESTRADAS	1	\$ 28,258.31	90.00%
8	FLOOD CONTROL			
9	IMPRESTIMO			
10	JUVENTUDE NO DESPORTU			
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
12	PONTES			
13	SAUDE			
14	TURISMO			
	Grand Total	4	\$ 534,417.22	31.32%

NO	POR SECTOR	Manatuto Villa		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	AGUA E SANEAMENTO			
3	COMERCIO			
4	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 364,960.55	41.77%
5	EDUKASAUN	6	\$ 563,592.96	34.42%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
7	ESTRADAS	5	\$ 9,583,559.45	78.13%
8	FLOOD CONTROL			
9	IMPRESTIMO	2	\$ 32,417,400.94	83.24%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
12	PONTES			
13	SAUDE	2	\$ 329,973.56	65.69%
14	TURISMO	2	\$ 305,556.27	28.66%
	Grand Total	21	\$ 45,928,020.17	80.38%

NO	POR SECTOR	Soibada		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA			
2	AGUA E SANEAMENTO			
3	COMERCIO			
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 66,898.51	0.00%
5	EDUKASAUN	2	\$ 285,893.47	64.14%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
7	ESTRADAS	3	\$ 563,302.80	39.33%
8	FLOOD CONTROL			
9	IMPRESTIMO			
10	JUVENTUDE NO DESPORTU			
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
12	PONTES	1	\$ 3,553,954.20	85.91%
13	SAUDE			
14	TURISMO			
	Grand Total	7	\$ 4,470,048.98	77.36%

1.3.3 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Ministerios

NO	POR MINISTERIO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	4	\$ 567,521.53	59.48%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 370,511.25	15.83%
3	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29,275.84	15.92%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	30	\$ 133,379,771.97	83.20%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	13	\$ 1,303,638.79	30.95%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277,330.43	0.00%
7	MINISTERIO SAUDE	9	\$ 1,175,863.67	58.48%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204,687.39	72.06%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 408,460.73	26.02%
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
Grand Total		63	\$ 140,080,038.04	81.75%

NO	POR MINISTERIO	Barique		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 370,511.25	15.83%
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	7	\$ 1,475,614.34	24.66%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
7	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 194,498.32	78.34%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	1	\$ 408,460.73	26.02%
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU			
	Grand Total	11	\$ 2,449,084.64	27.81%

NO	POR MINISTERIO	Laclo		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 120,020.07	90.00%
2	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 49,345,116.83	87.81%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 98,147.27	0.00%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
7	MINISTERIO SAUDE			
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204,687.39	72.06%
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL			
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU			
	Grand Total	9	\$ 49,767,971.56	87.58%

NO	POR MINISTERIO	Laclubar		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	6	\$ 36,412,565.10	81.02%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 202,223.29	12.92%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
7	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 315,707.08	54.07%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL			
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU			
	Grand Total	11	\$ 36,930,495.47	80.42%

NO	POR MINISTERIO	Laleia		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 141,945.19	100.00%
2	MINISTERIO AGRİKULTURA E PESCAS			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	1	\$ 28,258.31	90.00%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 86,883.29	0.00%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277,330.43	0.00%
7	MINISTERIO SAUDE			
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL			
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU			
	Grand Total	4	\$ 534,417.22	31.32%

NO	POR MINISTERIO	Manatuto Villa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 305,556.27	28.66%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS			
3	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29,275.84	15.92%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	7	\$ 42,000,960.39	82.07%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	6	\$ 563,592.96	34.42%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
7	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 665,658.27	54.77%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL			
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
	Grand Total	21	\$ 45,928,020.17	80.38%

NO	POR MINISTERIO	Soibada		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAZEN EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL			
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PASCAS			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	4	\$ 4,117,257.00	79.53%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	3	\$ 352,791.98	51.98%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU			
7	MINISTERIO SAUDE			
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA			
9	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL			
10	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU			
	Grand Total	7	\$ 4,470,048.98	77.36%

1.4. Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0- 14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Barique	5,833	1,924	1,617	1,183	1,109
Laclo	8,193	2,250	2,185	1,919	1,838
Laclubar	12,777	3,445	3,571	2,924	2,836
Laleia	3,930	1,181	1,189	817	743
Manatuto	15,446	4,741	4,609	3,109	2,987
Soibada	3,511	237	213	239	259

Fontes : Projeksaun Populasaun bazea ba Census Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1. Progressu Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan nia laran, husi lista #anexu B hatudu progresu aktual fulan ida ne'e ho nia presentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu prentangen aktual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu husi prosentu antrior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare iha #anexu B, detallu ba back-up #anexu C, no Instrusaun Servisu #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1. Obtáclo Servisu iha Terenu

Observasaun geral ba projeto hirak nebe mak implementa iha Munisipio Manatuto

1. Projeto Lao la tuir tempo nebee asina entre parte rua
2. Laiha tekniko supervisaun husi projeto nain atu halo kontrolo diaramente
3. Tekniko kompanha la iha tereno
4. Skill badaen neebe mak la dun professional

Obstalku teknik A.D.N hasoru

1. Distansia ne'ebe dook difikulta teknik atu servisu lalais
2. Kondisaun estrada neébe a'at
3. Kontraktor sira ne'ebe mak servisu iha terreno barak mak la tuir Spesifikasaun ne'ebe iha kontartu laran.
4. Planu Mapamentu Engenheiro Munisipiu la konsege realiza tuir planu tamba hare hosi nia distansia ne'ebe dook.
5. Sistema dropbox iha Munisipiu dala ruma iha problema lina internet


IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Presija tebes atu aumenta ema iha Munisipiu atu nune bele halo servisu ba administrasaun ne'ebe efektivu.
2. Sebele sistema dropbox tau mos iha dekstop Munisipiu para la bele atraja ami nia servisu.

Note: Asinatura Husi Eng. Municipio Manatuto

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Manatuto						
No	Deskrisaun	Identidade				Asinatura
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	
1	Enjineiru	Aleixo da C. Andrade	081	Enjineiru EPAS		
		José R. Carlos Gusmão	168	Enjineiru ITI		
		Domingos da Costa e Silva	250	Enjineiru ITI		

		Fabiano F.M Madeira	235	Enjineiru EPAS		
		Adonis Julio Fernandes	152	Enjineiru ME		
2	Enjineira	Olivia Soares	112	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Timoteo da Silva Morais	120	Motorista		

#ANEXU A

MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	\$ 2,561,405.06	Aug. 25, 2018	63.80%	57.33%	\$ 1,468,479.04	\$ 1,092,926.02	ON-GOING	
2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	\$ 3,029,514.40	Aug. 25, 2017	89.20%	79.82%	\$ 2,418,275.38	\$ 611,239.02	ON-GOING	
3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipessoal, Lda	\$ 2,362,976.44	June 30, 2015	82.08%	76.00%	\$ 1,795,843.89	\$ 567,132.55	ON-GOING	
4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	\$ 28,011,854.94	Feb. 10, 2014	93.93%	84.72%	\$ 23,733,008.75	\$ 4,278,846.19	ON-GOING	
5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	\$ 4,405,546.00	Sept. 3, 2014	73.76%	73.76%	\$ 3,249,684.75	\$ 1,155,861.25	ON-GOING	
6	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Ralan Unip. Lda	\$ 181,102.33	Oct. 10, 2019	91.59%	81.70%	\$ 147,966.23	\$ 33,136.10	ON-GOING	
7	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	\$ 79,155.54	Dec. 18, 2019	88.07%	79.26%	\$ 62,737.67	\$ 16,417.87	ON-GOING	
8	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	\$ 226,400.73	Dec. 18, 2019	43.70%	10.97%	\$ 24,834.32	\$ 201,566.41	ON-GOING	
9	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 29,275.84	March 1, 2020	15.92%	15.92%	\$ 4,660.85	\$ 24,614.99	ON-GOING	
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda	\$ 66,989.91	Jan. 7, 2021	95.34%	94.75%	\$ 63,474.73	\$ 3,515.18	ON-GOING	
11	Sumase River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Forte, Unip. Lda	\$ 1,486,885.83	Sept. 7, 2017	100.00%	98.72%	\$ 1,467,902.28	\$ 18,983.55	ON-GOING	Falta Retensaun
12	Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Ilalun, Lda	\$ 2,330,487.53	July 25, 2016	96.42%	84.85%	\$ 1,977,323.53	\$ 353,164.00	ON-GOING	
13	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip.Lda	\$ 262,983.65	09-Dec-20	91.97%	58.29%	\$ 153,284.47	\$ 109,699.18	ON-GOING	
14	New Construction of Gabions Tower No. 4 Section Manatuto - Baucau Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Giovania Unip. Lda	\$ 175,266.63		98.50%	88.65%	\$ 155,381.81	\$ 19,884.82	ON-GOING	
15	New Construction of Fence at Isolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	K-6, UNIPessoal LDA	\$ 257,748.51	Jan. 12, 2022	88.89%	57.34%	\$ 147,793.69	\$ 109,954.82	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Setembro Aumenta 8.32%
16	Supply and Installtion Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Fraternity Unipessoal Lda	\$ 77,936.20	Jan. 12, 2022	92.28%	0.00%	\$ -	\$ 77,936.20	ON-GOING	
17	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	\$ 62,996.83	Oct. 15, 2021	31.90%	24.62%	\$ 15,507.66	\$ 47,489.17	ON-GOING	
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF RENTAU	\$ 64,383.50	Oct. 15, 2021	18.98%	24.73%	\$ 15,921.64	\$ 48,461.86	ON-GOING	
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE PE REMBOR	\$ 88,918.34	Oct. 15, 2021	19.35%	0.00%	\$ -	\$ 88,918.34	ON-GOING	
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF OBRATO	\$ 66,144.65	Oct. 15, 2021	22.03%	22.03%	\$ 14,570.40	\$ 51,574.25	ON-GOING	

NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	\$ 100,047.31	Oct. 15, 2021	16.16%	0.00%	\$ -	\$ 100,047.31	ON-GOING	
22	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip.Lda	\$ 277,330.43	July 18, 2019	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 277,330.43	ON-GOING	
23	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	Hare Unip.Lda	\$ 141,945.19	Oct. 8, 2019	98.92%	100.00%	\$ 141,945.19	\$ -	ON-GOING	
24	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	\$ 28,258.31	June 10, 2021	99.86%	90.00%	\$ 25,432.48	\$ 2,825.83	ON-GOING	
25	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laleia	Manatuto	MEJD PKRIE EP CAIRUI	\$ 86,883.29	Oct. 15, 2021	23.18%	0.00%	\$ -	\$ 86,883.29	ON-GOING	
26	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	\$ 695,420.83	June 7, 2016	91.52%	82.11%	\$ 571,034.27	\$ 124,386.56	ON-GOING	Progreso Fisiko iha Tereno ba Fulan Setembro Aumenta 0.28%
27	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	\$ 34,379,729.54	Nov. 20, 2014	91.66%	82.49%	\$ 28,360,730.61	\$ 6,018,998.93	ON-GOING	
28	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Ladlamba Unip. Lda	\$ 112,967.53	Sept. 23, 2019	22.06%	19.85%	\$ 22,429.62	\$ 90,537.91	ON-GOING	
29	Konstrusaun Rezidencia Pesoa Iha iha Suku Funar - Laklubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Tonijo Unip. Lda	\$ 81,776.84	Oct. 8, 2019	100.00%	86.50%	\$ 70,740.86	\$ 11,035.98	ON-GOING	
30	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 481,029.67	Aug. 25, 2020	54.37%	11.80%	\$ 56,774.87	\$ 424,254.80	ON-GOING	Progreso Fisiko iha Tereno ba Fulan Setembro Aumenta 41.26%
31	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 194,402.72	Dec. 20, 2019	82.83%	74.55%	\$ 144,924.09	\$ 49,478.63	ON-GOING	
32	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	\$ 448,209.39	June 10, 2021	95.04%	82.05%	\$ 367,756.59	\$ 80,452.80	ON-GOING	
33	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	\$ 213,772.95	June 10, 2021	3.59%	0.00%	\$ -	\$ 213,772.95	ON-GOING	Progreso Fisiko iha Tereno ba Fulan Setembro Aumenta 3.59%
34	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 120,962.71	July 28, 2019	71.23%	64.11%	\$ 77,547.51	\$ 43,415.20	ON-GOING	
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BATARA	\$ 102,060.99	Oct. 15, 2021	23.39%	25.60%	\$ 26,125.75	\$ 75,935.24	ON-GOING	
36	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	\$ 100,162.30	Oct. 15, 2021	18.68%	0.00%	\$ -	\$ 100,162.30	ON-GOING	
37	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct. Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESSOAL LDA	\$ 3,553,954.20	Feb. 27, 2017	100.00%	85.91%	\$ 3,053,097.27	\$ 500,856.93	ON-GOING	
38	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 183,381.16	Sept. 23, 2019	100.00%	100.00%	\$ 183,381.18	\$ (0.02)	ON-GOING	
39	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	\$ 164,154.00	March 25, 2020	70.00%	70.00%	\$ 114,907.80	\$ 49,246.20	ON-GOING	
40	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 203,036.57	June 10, 2021	46.07%	41.78%	\$ 84,819.65	\$ 118,216.92	ON-GOING	
41	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 196,112.23	June 10, 2021	18.73%	11.11%	\$ 21,792.83	\$ 174,319.40	ON-GOING	
42	Projetu Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 66,898.51	Nov. 26, 2021	78.97%	0.00%	\$ -	\$ 66,898.51	ON-GOING	
43	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	MEJD PKRIE EBC WEAIHUdik	\$ 102,512.31	Oct. 15, 2021	25.15%	0.00%	\$ -	\$ 102,512.31	ON-GOING	
44	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	\$ 242,560.14	Oct. 24, 2019	70.75%	63.68%	\$ 154,455.92	\$ 88,104.22	ON-GOING	

NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	DATA KONT.	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
45	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	\$ 370,511.25	Sept. 13, 2016	17.59%	15.83%	\$ 58,645.87	\$ 311,865.38	Abandona	Abandona
46	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	\$ 15,875.56	Jan. 7, 2017	100.00%	87.26%	\$ 13,853.09	\$ 2,022.47	ON-GOING	
47	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	\$ 116,914.88	Sept. 23, 2019	71.10%	63.99%	\$ 74,817.23	\$ 42,097.65	ON-GOING	
48	Construction of Residence for Health Staff in Suku Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Macucuren Unip. Lda	\$ 77,583.44	Oct. 8, 2019	99.96%	99.96%	\$ 77,556.13	\$ 27.31	FHO	Projecto ne Finaliza ona
49	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	\$ 162,377.94	Oct. 8, 2019	46.50%	41.85%	\$ 67,961.57	\$ 94,416.37	ON-GOING	
50	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 141,684.96	Aug. 25, 2019	41.78%	36.88%	\$ 52,260.01	\$ 89,424.95	ON-GOING	
51	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We"coi Unipessoal Lda	\$ 343,111.47	June 10, 2021	44.31%	21.97%	\$ 75,370.79	\$ 267,740.68	ON-GOING	
52	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	\$ 269,211.81	June 10, 2021	1.09%	0.00%	\$ -	\$ 269,211.81	ON-GOING	
53	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	\$ 300,792.46	July 10, 2021	60.81%	0.00%	\$ -	\$ 300,792.46	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Setembro Aumenta 1.28%
54	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Barique	Manatuto	Senizu	\$ 408,460.73	Oct. 18, 2021	84.16%	26.02%	\$ 106,266.80	\$ 302,193.93	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Setembro Aumenta 45.66%
55	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacio	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	\$ 380,582.61	Sept. 1, 2016	95.99%	72.08%	\$ 274,330.03	\$ 106,252.58	ON-GOING	
56	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Sahan I Unip.Lda	\$ 3,314.56	Sept. 27, 2016	100.00%	90.00%	\$ 2,983.11	\$ 331.45	ON-GOING	
57	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lacio	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Ailili Const. Unip. Lda	\$ 120,020.07	Oct. 8, 2019	100.00%	90.00%	\$ 108,017.87	\$ 12,002.20	PHO	Falta Retensaun
58	Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Egana, Unip. Lda	\$ 223,843.79	Dec. 13, 2019	68.89%	56.58%	\$ 126,647.74	\$ 97,196.05	ON-GOING	
59	For Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of "Municipio Roads" Package 9 : Lacio to Lacio Town Road	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	PT. Bikarma Jv Aureum Solis Consultant Unip Lda	\$ 422,400.00	April 25, 2020	100.00%	100.00%	\$ 422,400.00	\$ -	ON-GOING	
60	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Esa-Un	\$ 50,745.00	May 2, 2016	38.83%	34.95%	\$ 17,736.12	\$ 33,008.88	PENDENTE	
61	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacio	Manatuto	Surprise Unip. Lda	\$ 153,942.39	Sept. 12, 2016	97.16%	84.29%	\$ 129,753.97	\$ 24,188.42	ON-GOING	
62	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacio	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	\$ 48,314,975.87	May 3, 2016	87.98%	87.98%	\$ 42,506,027.78	\$ 5,808,948.09	ON-GOING	
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lacio	Manatuto	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	\$ 98,147.27	Oct. 15, 2021	21.75%	0.00%	\$ -	\$ 98,147.27	ON-GOING	
TOTAL												\$ 114,509,175.69	\$ 25,570,862.35		

1. Eng. Aleixo da Costa Andrade
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P

3. Eng. Fabiano Fitalis Maria Madeira
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P

2. Eng. Jose Roberto C. Gusmão
Eng. ba Projecto Infrastrutura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

4. Eng. Domingos D. X. Silva
Eng. ba Projecto Infrastrutura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

5. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projecto ME, ADN, I.P

Certifica Husi:
Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De Qualidade ADN, I.P

LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN



Sep-22												
Sep-22												
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Komulativo Progress
1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	\$ 2,561,405.06	Aug. 25, 2018	63.80%		63.80%
2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	\$ 3,029,514.40	Aug. 25, 2017	89.20%		89.20%
3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipessoal, Lda	\$ 2,362,976.44	June 30, 2015	82.08%		82.08%
4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	\$ 28,011,854.94	Feb. 10, 2014	93.93%		93.93%
5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	\$ 4,405,546.00	Sept. 3, 2014	73.76%		73.76%
6	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Ralan Unip. Lda	\$ 181,102.33	Oct. 10, 2019	91.59%		91.59%
7	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	\$ 79,155.54	Dec. 18, 2019	88.07%		88.07%
8	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	\$ 226,400.73	Dec. 18, 2019	43.70%		43.70%
9	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisiupi Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 29,275.84	March 1, 2020	15.92%		15.92%
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda	\$ 66,989.91	Jan. 7, 2021	95.34%		95.34%
11	Sumase River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Forte, Unip. Lda	\$ 1,486,885.83	Sept. 7, 2017	100.00%		100.00%
12	Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Ilatur, Lda	\$ 2,330,487.53	July 25, 2016	96.42%		96.42%
13	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip.Lda	\$ 262,983.65	09-Dec-20	91.97%		91.97%
14	New Construction of Gabions Tower No. 4 Section Manatuto - Baucau Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Giovanio Unip. Lda	\$ 175,266.63	02-Aug-21	98.50%		98.50%
15	New Construction of Fence at Izolation Covid-19 in Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	K-6, UNIPESOAAL LDA	\$ 257,748.51	Jan. 12, 2022	80.57%	8.32%	88.89%
16	Supply and Installation Main Power For Isolation and Laboratorium Building Ma'abat Manatuto Municipality	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Fraternity Unipessoal Lda	\$ 77,936.20	Jan. 12, 2022	92.28%		92.28%
17	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	\$ 62,996.83	Oct. 15, 2021	31.90%		31.90%
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF RENTAU	\$ 64,383.50	Oct. 15, 2021	18.98%		18.98%
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE PE REMBOR	\$ 88,918.34	Oct. 15, 2021	19.35%		19.35%
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF OBRATO	\$ 66,144.65	Oct. 15, 2021	22.03%		22.03%
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	\$ 100,047.31	Oct. 15, 2021	16.16%		16.16%
22	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip.Lda	\$ 277,330.43	July 18, 2019	0.00%		0.00%
23	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	Hare Unip.Lda	\$ 141,945.19	Oct. 8, 2019	98.92%		98.92%
24	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	\$ 28,258.31	June 10, 2021	99.86%		99.86%
25	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laleia	Manatuto	MEJD PKRIE EP CAIRUI	\$ 86,883.29	Oct. 15, 2021	23.18%		23.18%
26	New Installation Mv. Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	\$ 695,420.83	June 7, 2016	91.24%	0.28%	91.52%
27	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co., LTD	\$ 34,379,729.54	Nov. 20, 2014	91.66%		91.66%
28	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Ladiama Unip. Lda	\$ 112,967.53	Sept. 23, 2019	22.06%		22.06%
29	Konstrusaun Rezidencia Pesoaal Iha iha Suku Funar - Laklubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Tonijo Unip. Lda	\$ 81,776.84	Oct. 8, 2019	100.00%		100.00%
30	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 481,029.66	Aug. 25, 2020	13.11%	41.26%	54.37%
31	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 194,402.72	Dec. 20, 2019	82.83%		82.83%
32	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	\$ 448,209.39	June 10, 2021	95.04%		95.04%
33	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	\$ 213,772.95	June 10, 2021	0.00%	3.59%	3.59%
34	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 120,962.71	July 28, 2019	71.23%		71.23%
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF BATARA	\$ 102,060.99	Oct. 15, 2021	23.39%		23.39%
36	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Laclubar	Manatuto	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	\$ 100,162.30	Oct. 15, 2021	18.68%		18.68%
37	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct. Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESOAAL LDA	\$ 3,384,214.14	Feb. 27, 2017	100.00%		100.00%
38	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 183,381.16	Sept. 23, 2019	100.00%		100.00%
39	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Sjarplan Utama Konsultan	\$ 164,154.00	March 25, 2020	70.00%		70.00%
40	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 203,036.57	June 10, 2021	46.02%		46.07%
41	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 196,112.23	June 10, 2021	18.73%		18.73%
42	Projeto Rehabilitasaun Ensinu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada, Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 66,898.51	Nov. 26, 2021	78.97%		78.97%
43	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	\$ 102,512.31	Oct. 15, 2021	25.15%		25.15%
44	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	\$ 242,560.14	Oct. 24, 2019	70.75%		70.75%

LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN										Sep-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	LOKALIZASAUN PROJETU		NARAN COMPANHA	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Komulativo Progress
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU						
45	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	\$ 370,511.25	Sept. 13, 2016	17.59%		17.59%
46	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	\$ 15,875.56	Jan. 7, 2017	100.00%		100.00%
47	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	\$ 116,914.88	Sept. 23, 2019	71.10%		71.10%
48	Construction of Residence for Health Staff in Suku Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Macucuren Unip. Lda	\$ 77,583.44	Oct. 8, 2019	99.96%		99.96%
49	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	\$ 162,377.94	Oct. 8, 2019	46.50%		46.50%
50	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 141,684.96	Aug. 25, 2019	41.78%		41.78%
51	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We"coi Unipessoal Lda	\$ 343,111.47	June 10, 2021	44.31%		44.31%
52	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	\$ 296,211.82	June 10, 2021	1.09%		1.09%
53	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	\$ 300,792.46	July 10, 2021	59.53%	1.28%	60.81%
54	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Barique	Manatuto	Senizu	\$ 408,460.73		38.50%	45.66%	84.16%
55	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacio	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	\$ 380,582.61	Sept. 1, 2016	95.99%		95.99%
56	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Sahan I Unip.Lda	\$ 3,314.56	Sept. 27, 2016	100.00%		100.00%
57	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lacio	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Ailili Const. Unip. Lda	\$ 120,020.07	Oct. 8, 2019	100.00%		100.00%
58	Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	Egana, Unip. Lda	\$ 223,836.50	Dec. 13, 2019	68.89%		68.89%
59	For Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of "Municipio Roads" Package 9 : Lacio to Lacio Town Road	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacio	Manatuto	PT. Bikarma Jv Aureum Solis Consultant Unip Lda	\$ 422,400.00	April 25, 2020	100.00%		100.00%
60	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacio	Manatuto	Esa-Un	\$ 50,745.00	May 2, 2016	38.83%		38.83%
61	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacio	Manatuto	Surprise Unip. Lda	\$ 153,942.39	Sept. 12, 2016	97.16%		97.16%
62	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01 01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacio	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	\$ 48,314,975.87	May 3, 2016	87.98%		87.98%
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lacio	Manatuto	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	\$ 98,147.27	Oct. 15, 2021	21.75%		21.75%

Prepara Husi:

1. Eng. Aleixo da Costa Andrade
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

3. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Porjecto ME, ADN, I.P

2. Eng. Jorge R.C. Gusmão
Eng. ba Porjecto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

4. Eng. Domingos D.X.Silva
Eng. ba Porjecto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

5. Eng.Febiano Fitalis Maria Madeira
Eng. ba Porjecto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :

Eng. Remigio da c.s dos Santos
Eng. Senior ba Porjecto Insfrasturctura e Irigasaun, ADN, I.P

Eng/Arch.Francisco Xavier de D. Jeronimo
Eng. Senior ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento,ADN,I.P

Eng. Deolindo da Fatima Marques
ChefeSeksau ME& ITC, ADN, I.P

Certifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validacao De Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in
Manatuto Municipality Manatuto

No. kontratu : SSS/062/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 11/ 09/ 2022

Fatin Inspesaun : Manatuto Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : 126,041,478, Latetude : -8,518,704

End Point : Long : 126,014,554, Latetude : -8,509,156


Naran Inspector : 1. Eng. Jose R.C. Gusmão

2. Domingos D,X, Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha ona iha tereinu
tanba projetu refere remata ona no nia
fiziku 100% no hein Rekomendasaun
ikus husi MOP, tamba ne'e teknik
Munisipiu anexu foto anterior.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

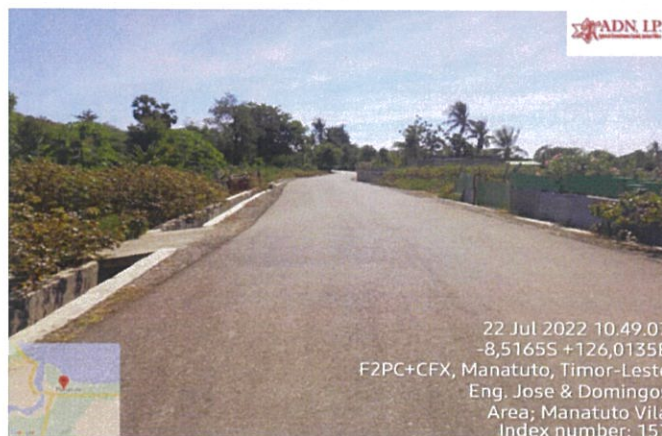



#ANEXU C1 (MV-2)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau
Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto

No. kontratu : SSS/061/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 11/ 09/ 2022

Fatin Inspesaun : Manatuto Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : 126,019,530, Latetude: -8,514,341

End Point : Long : 126,007,849, Latetude: -8516389

Naran Inspector : 1. José Roberto, C. Gusmão

2. Domingos DX. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha ona iha tereinu
tanba projetu refere remata ona no nia
fiziku 100% no hein Rekomendasaun
ikus husi MOP, tamba ne'e teknik
Munisipiu anexu foto anterior.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



KADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-2) Back-up Data

Naran Projeto

: Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau
Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto

No. kontratu

: SSS/061/MOPTC-2017

Sketch Item servisu laiha ona iha tereinu
tanba projetu refere remata ona no nia
fiziku 100% no hein Rekomendasaun
ikus husi MOP, tamba ne'e teknik
Munisipiu anexu foto anterior.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-6) Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitasaun Ensinnu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada,
Manatuto

No. kontratu :

Data Inspesaun : 28 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Manlala, Soibada

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.8602S,

Latetude : 125,9393E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : 1. Aleixo Da Costa Andrade

2. Fabiano Fitalis Maria Madeira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Item servisu Monta

Ajuleju, odamatna no plafon



28/09/22 14.02
8,8604S 125,9393E
Manatuto
Eng. Manatuto



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-6) Back-up Data

Naran Projeto

: Rehabilitasaun Ensinnu Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada,
Manatuto

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Item servisu Monta

Ajuleju, odamatna,

plafon, acian





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-6)

Back-up Data

Naran Projeto

: Rehabilitasaun Ensину Sekundariu Tekniku Vokasional Soibada,
Manatuto

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item Servisu demolish iha
parte oin





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara
No. kontratu :

Data Inspesaun : 14 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aisiuun Laclubar

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.7762S,

Latetude : 125,9238E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : 1. Aleixo Da Costa Andrade

2. Fabiano Fitalis Maria Madeira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

serbisu fondasi, bloko, kolom,
lintelbeam, no ringbalok





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-10)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara

No. kontratu


:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Serbisu hada blocko, kolom,
lintelbeam no ringbalok.

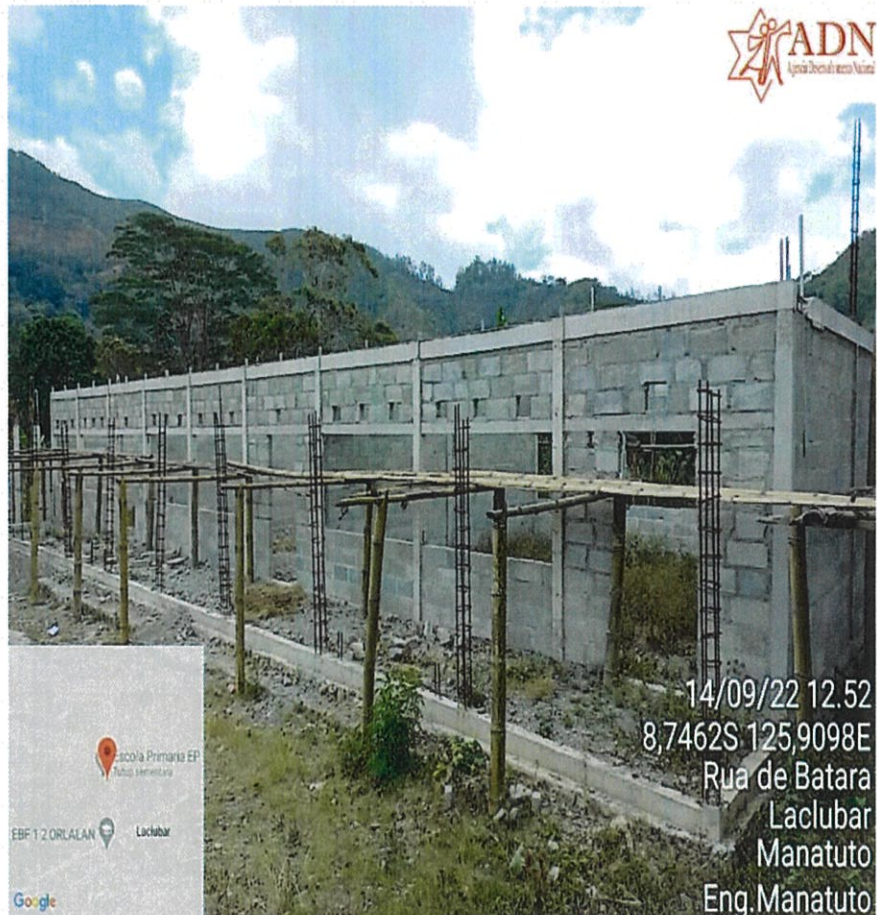



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-10)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

Serbisu fondasi, sinta rai, kolom,
no servisu ateru rai ba parte haris
fatin.





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-12)

Back-up Data

Naran Projeto : **Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu, Manatuto Municipality**

No. kontratu : **SSS/115/MOPTC-2016**

Data Inspesaun : **11/ 09/2022**

Fatin Inspesaun : **Manatuto Villa**

Koordinadas :

Start Point : Long : 126,021,108, Latetude : -8,518,339

End Point : Long : 126,003,775, Latetude : -8,517,000


Naran Inspector : **1. Eng. José Roberto, C. Gusmão**

2. Eng. Domingos DX.Silva

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu laiha ona iha tereinu
tanba projetu refere remata ona no nia fiziku
100% no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP, tamba ne'e teknik Munisipiu anexu
foto anterior.

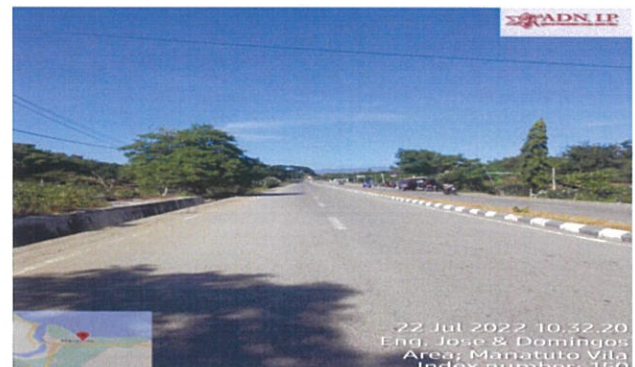



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-17)

Back-up Data

Naran Projeto : Reabilitação do Escritório, ID Emis - 1096
No. kontratu :

Data Inspesaun : 08 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Kampung baru, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5349S, Latetude : 126,0101E

End Point : Long : Latetude :


Naran Inspector : 1. Aleixo Da Costa Andrade
2. Fabiano F.M Madeira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Item serbisu Steel roof no
demolish iha parte oin

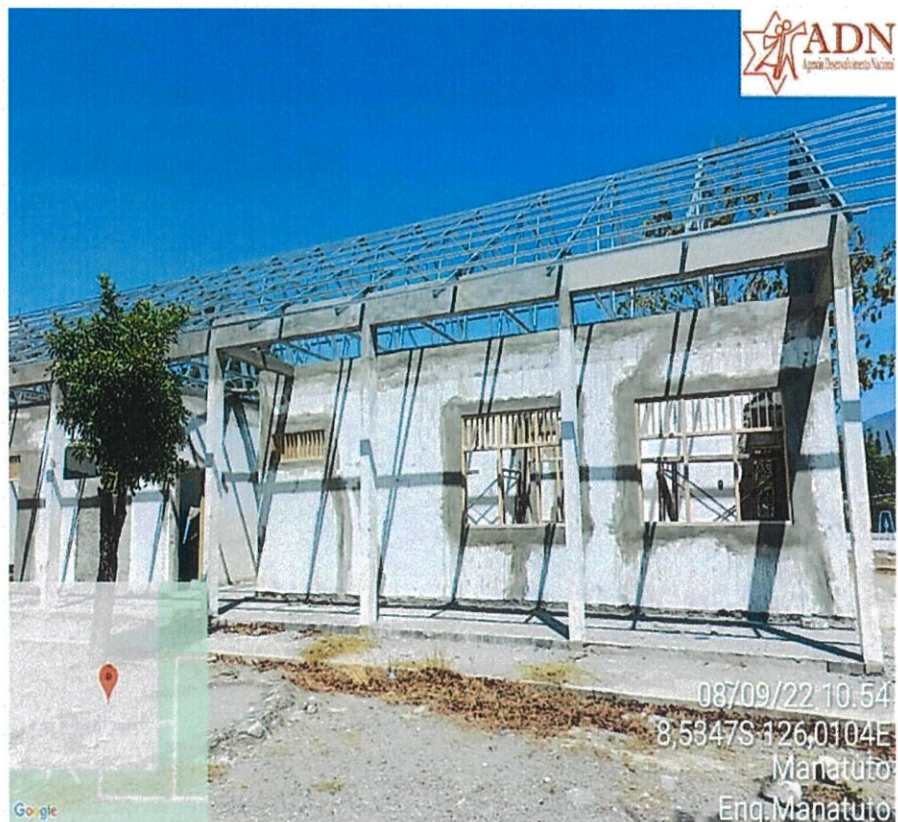



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-17)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Reabilitação do Escritório, ID Emis - 1096
:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Item servisu Windows Frame





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-17)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Reabilitação do Escritório, ID Emis - 1096
:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item serbisu Steel Roof





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-18)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau
No. kontratu :

Data Inspesaun : 08 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Aiteas Manatuto

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5103S,

Latetude : 126,0157E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : 1. Aleixo Da Costa Andrade

2. Fabiano Fitalis Maria Madeira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Item servisu Fondasi, Sloof, Block
wall no Lintelbeam





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-18)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau

No. kontratu


:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Item servisu Block Wall, sopi-sopi
no Lintelbeam

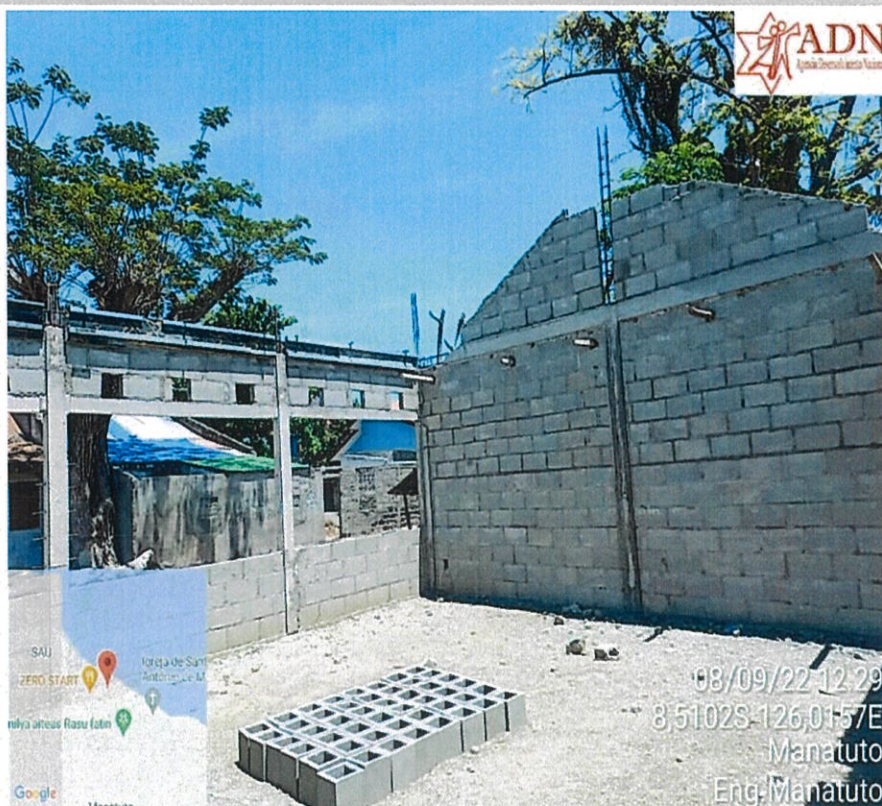



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-18)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau

No. kontratu


:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item servisu block wall, bekisting
kolom no Bekisting lintelbeam

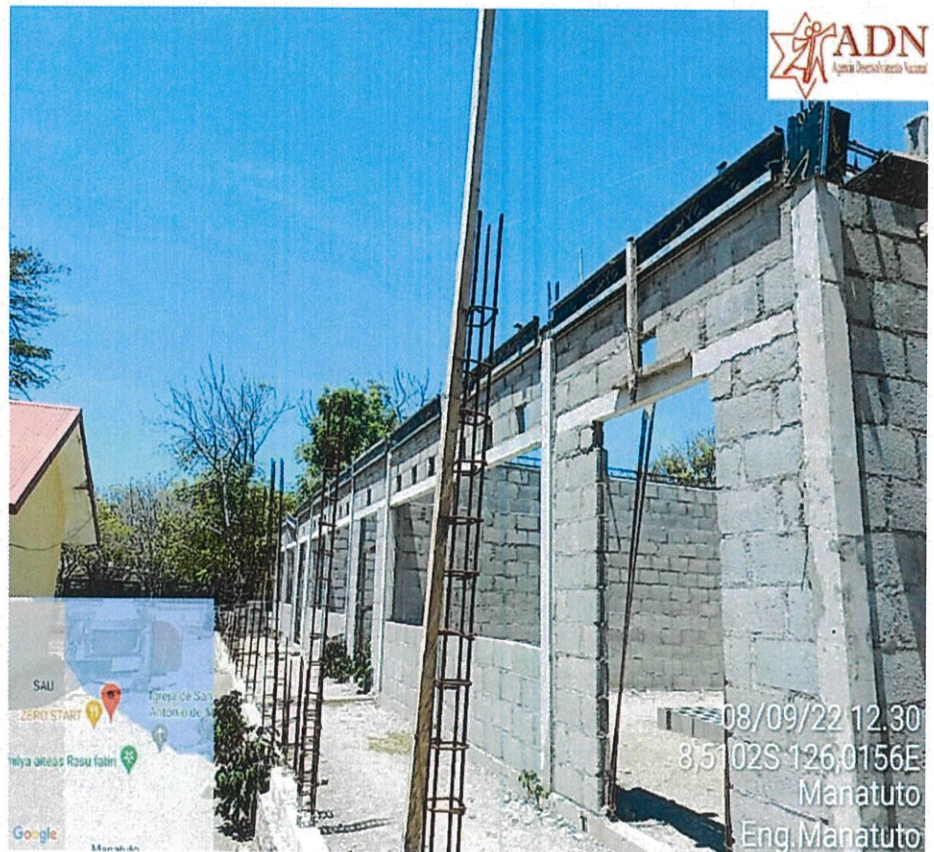



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-19)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor
No. kontratu :

Data Inspesaun : 15 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Rembor, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5103S,

Latetude : 126,0157E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : 1. Aleixo Da Costa Andrade

2. Fabiano Fitalis Maria Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Item servisu Monta Formwork ba
koluna, Lintel bema

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-19)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor
:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Item serbisu Pembesian no monta
Bekesting, kontinua ho kor iha
koluna





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-19)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor

No. kontratu

:


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item Monta Formwork ba Lintel

Beam no cor

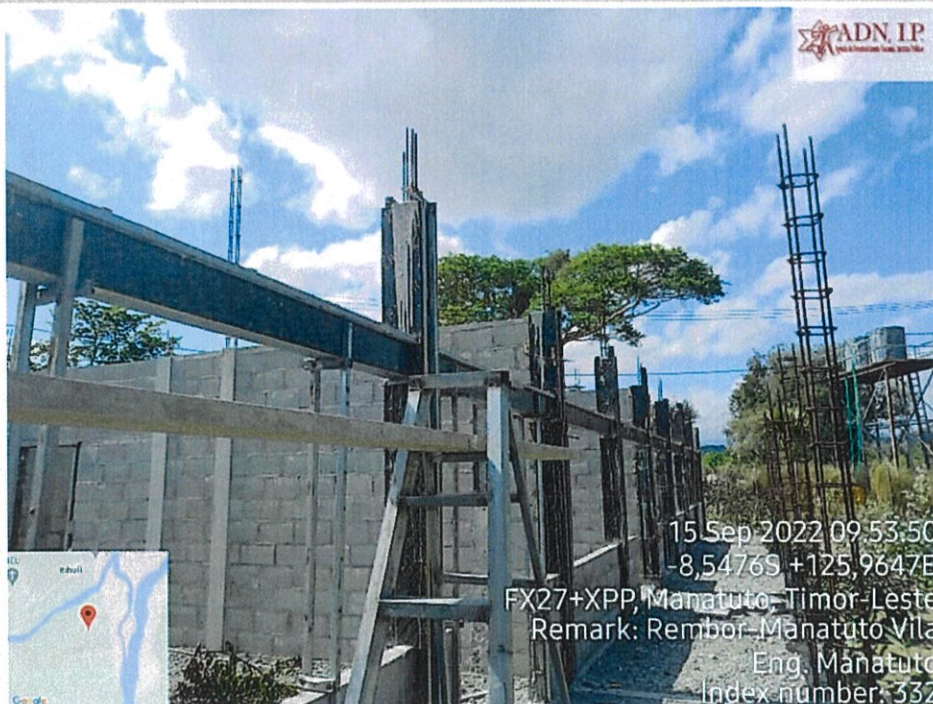



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-20)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato
No. kontratu :

Data Inspesaun : 8 September 2022

Fatin Inspesaun : Obrato, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5072S, Latetude : 125,9953E

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1. Aleixo Da Costa Andrade

2. Fabiano Fitalis Maria Madeira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Item servisu Sloof, Batako no Pembesian
ba Ringbalok





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-20)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato

No. kontratu


:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Item servisu Fondasi,Sloof no Lintelbeam

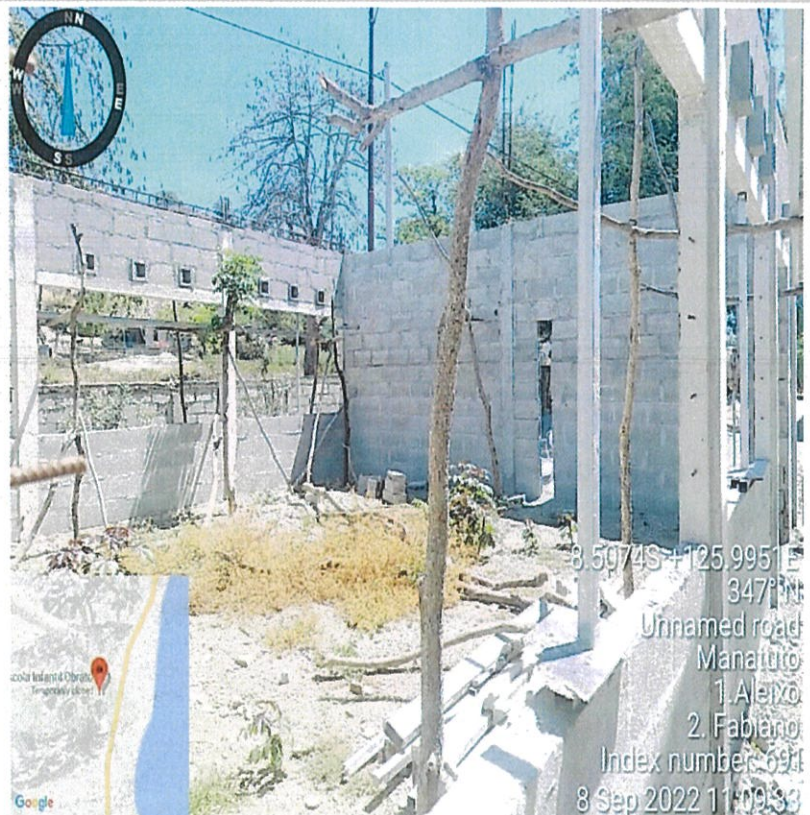



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-20)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item servisu Fondasi,Sloof no Lintelbeam





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence
No. kontratu :

Data Inspesaun : 16 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Beadi Aiteas, Manatuto

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5390S,

Latetude : 126,017E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Aleixo Da Costa Andrade
Fabiano Fitalis Maria Madeira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Item serbisu pambesian no monta
formwork/bekeasting





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-21)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: New Construction Fence
:

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Item serbisu las tralis ba moru parte oin





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-21)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Fence


No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item serbisu reboka parte sorin

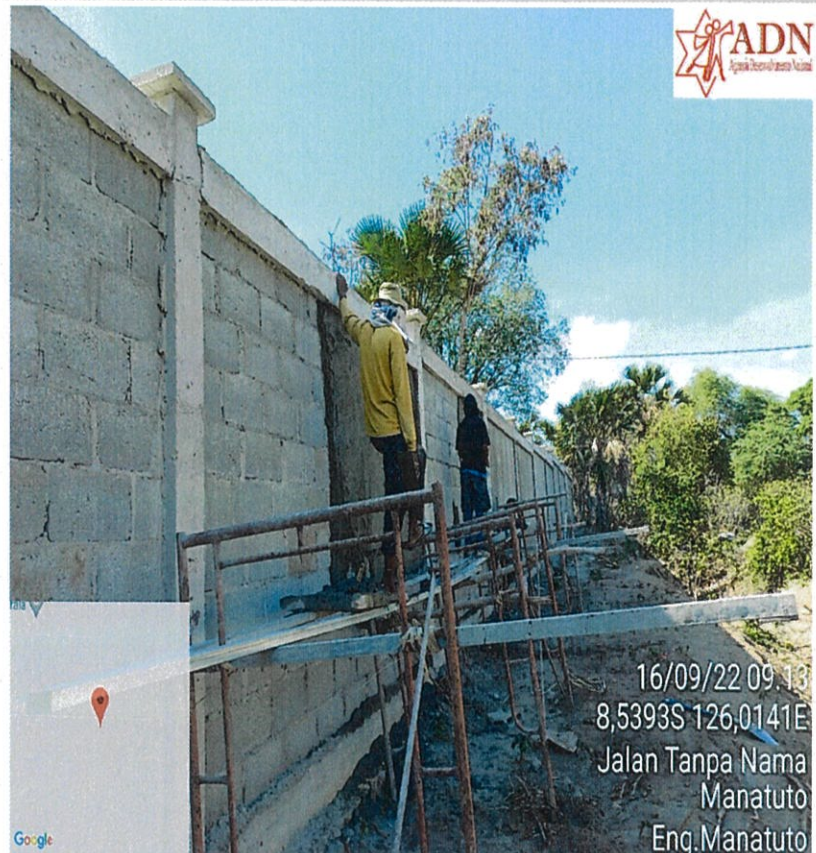



#ANEXU C2 (MV-21)
SUMMARY BOQ

Project Name : NEW CONSTRUCTION FENCE
Location : MA'ABAT MANATUTU MUNICIPALITY - TIMOR LESTE
Project Owner : MINISTRY OF HEALTH

NO	DESCRIPTION	AMOUNT \$	PROGRESS BY A D N					
			PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS SEPTEMBER		PROGRESS TO DATE	
			AMOUNT (US\$)	WEIGHT (%)	AMOUNT (US\$)	WEIGHT (%)	AMOUNT (US\$)	WEIGHT (%)
I	PREPARATION WORKS	\$ 3.104,30	\$ 2.729,30	1,06%	\$ -	0,00%	\$ 2.729,30	1,06%
II	FUNDATION WORKS	\$ 12.548,99	\$ 12.548,99	4,87%	\$ -	0,00%	\$ 12.548,99	4,87%
III	CONCRETE WORKS	\$ 101.240,97	\$ 101.240,97	39,28%	\$ -	0,00%	\$ 101.240,97	39,28%
IV	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 86.559,00	\$ 33.577,96	13,03%	\$ 19.102,76	7,41%	\$ 52.680,72	20,44%
V	OTHERS WORKS	\$ 3.727,08	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
VI	FINAL CLEARING	\$ 175,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 207.355,34	\$ 150.097,22	58,23%	\$ 19.102,76	7,41%	\$ 169.199,98	65,65%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 20.735,53	\$ 15.009,72	5,82%	\$ 1.910,28	0,74%	\$ 16.920,00	6,56%
C	OVERHEAD	\$ 4.775,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	TAX (2% x (A+B+C)	\$ 4.147,11	\$ 3.302,14	1,28%	\$ 420,26	0,16%	\$ 3.722,40	1,44%
E	CONTINGENCY (10% X A)	\$ 20.735,53	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
F	GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	\$ 257.748,51	\$ 168.409,08	65,34%	\$ 21.433,29	8,32%	\$ 189.842,38	73,65%

Prepara husi :

1. (Eng. Aleixo Da Costa Andrade)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento
Município Manatuto,ADN,I.P

2. (Eng. Fabiano Fitalis Maria Madeira)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no Saneamento
Município Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (MV-21)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction Fence

Kompanha : K6 Unipessoal, Lda

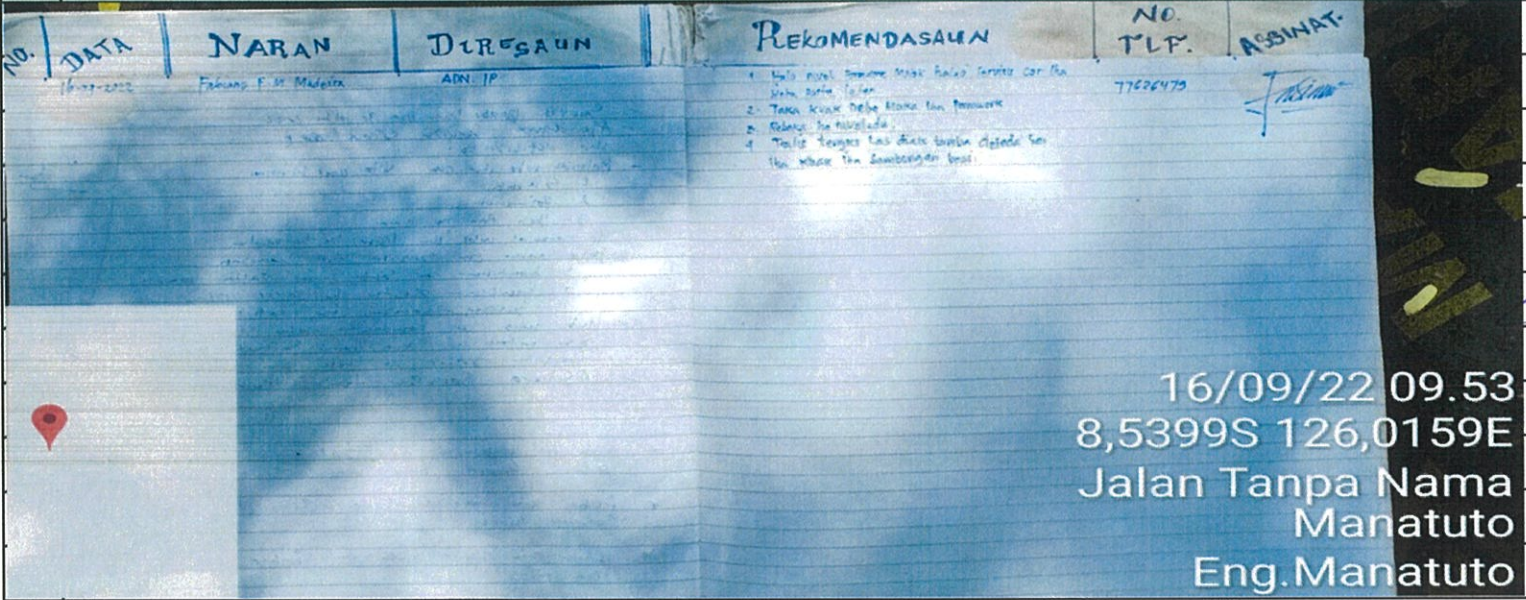No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	16/09/2022	Manatuto Vila	Aleixo Da Costa Andrade	Tek A D N, IP			
II			Fabiano F.M Madeira		1	Halo nivel formwork molok halao servisu cor iha sinta parte leten	
					2	Taka kuak iha parte formwork	
					3	Reboka ho niveladu	
					4	Tralis tengki las diak tamba deteta sei iha kuak iha parte sambungan besi	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAL-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui
No. kontratu :

Data Inspesaun : 08 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Cairui, Laleia

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.6063S,

Latetude : 126,1422E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : 1. Aleixo Da Costa Andrade


2. Fabiano F.M Madeira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Item servisu monta Formwork ba sopi-sopi

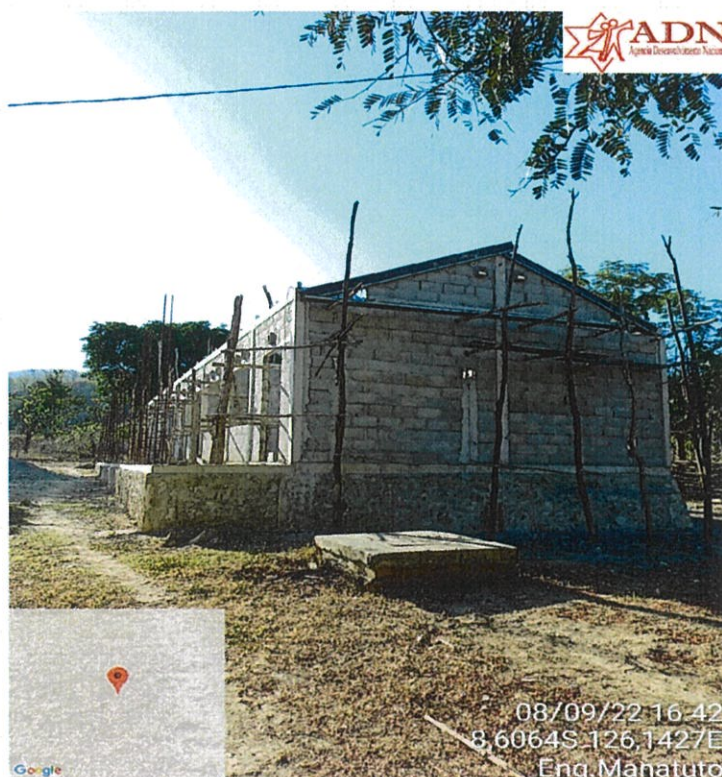



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAL-4)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu


: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui
:

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Item servisu cor Formwork ba Ringbalok

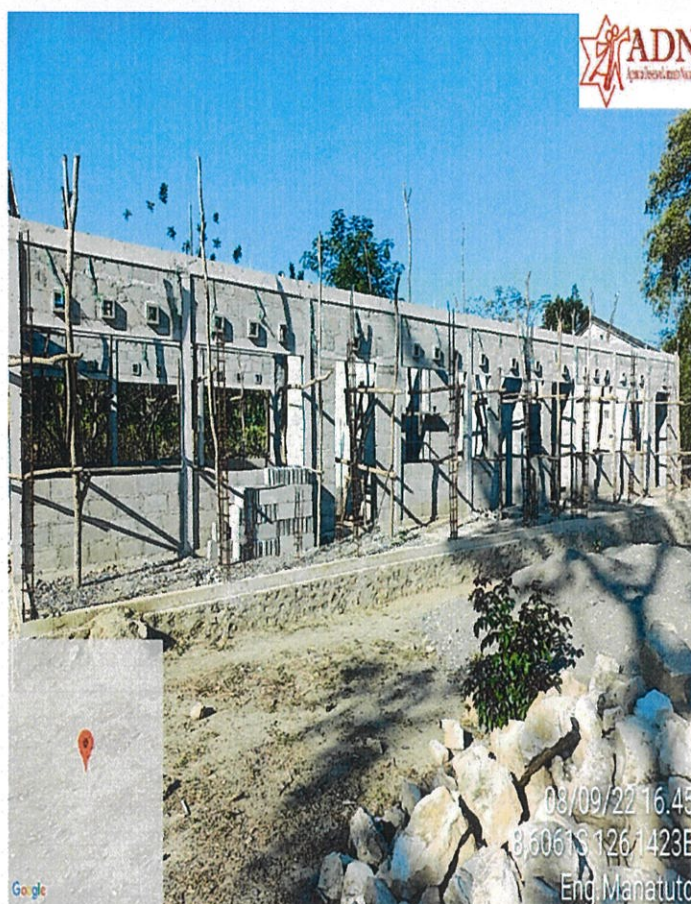



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAL-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item servisu monta besi no cor iha ringbalok





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Sta;
0+000 - 27+000
No. kontratu : MPW-W-NCB-R-190035

Data Inspesaun : 11/09/2022

Fatin Inspesaun : Laclubar, Manatuto

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.7484S. Latetude ; 125.9052E


End Point : Long : 8.7477S Latetude ; 125.9041E

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmão


2. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu cutting no hamos Estrada ne'ebe hetan estragus husi udan no agora dadaun kompania la servisu iha tereinu. Tamba ne'e husi parte teknik uja deit foto anterior.

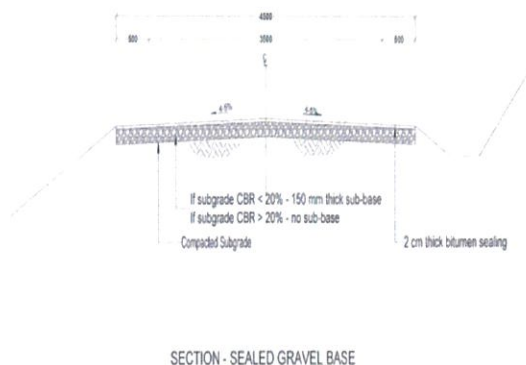

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

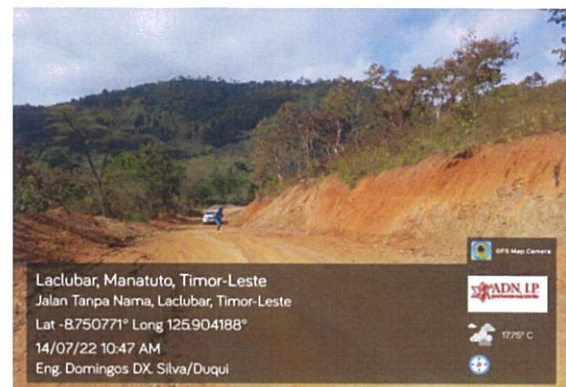



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-5)

Back-up Data

Naran Projeto

: Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Sta;
0+000 - 27+000

No. kontratu

: MPW-W-NCB-R-190035





#ANEXU C2 (LAC - 5)

Project Name : R4D Rural Periodic Maintenance Roads From Suco, Orlala-Funar - Fatuk Makerek Sta: 0+000 - 27+000
Contract Number : MPW - W - NCB - R -190034
Contractor Name : Hatu Wari Unip. Lda

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)						
R-01	General Protection	\$ 30,164.77	\$ 175.00	0.04%	\$ 625.00	0.16%	\$ 800.00	0.20%
R-02	Drainage	\$ 64.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-03	Earth work	\$ 17,633.73	\$ 1,198.29	0.25%	\$ 137,130.38	34.89%	\$ 138,328.67	35.14%
R-05	Sub-base, base and pavement	\$ 34,463.52	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structures	\$ 273,115.47	\$ 38,183.06	7.94%	\$ -	0.00%	\$ 38,183.06	7.94%
R-10	Dayworks	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 29,386.60	\$ 9,459.69	1.97%	\$ 5,445.30	1.39%	\$ 14,904.99	1.97%
R-13-01	General expenses	\$ 7,870.00	\$ 2,522.50	0.52%	\$ -	0.00%	\$ 2,522.50	0.52%
R-15	Provisional sum	\$ 300.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 392,998.09	\$ 51,538.55	10.71%	\$ 143,200.68	36.44%	\$ 194,739.23	45.77%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 39,299.81	\$ 5,153.85	1.07%	\$ 14,320.07	3.64%	\$ 19,473.92	4.58%
C	Overheads (supervision and risk) net cost x % ; 10%	\$ 39,299.81	\$ 5,153.85	1.07%	\$ 1,432.01	0.36%	\$ 6,585.86	0.46%
D	Tax ((net cost + profit + Overheads))* 2 %)	\$ 9,431.95	\$ 1,236.93	0.26%	\$ 317,905.51	0.81%	\$ 4,415.98	1.02%
E	Grand Total (A + B + C)	\$ 481,029.68	\$ 63,083.18	13.11%	\$ 162,131.81	41.26%	\$ 225,214.99	54.37%

Inspeksaun Husi:



1. (Domingos DX. Silva)

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P


2. (José R. Carlos Gusmão)

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :


Eng. Remigio da C. dos Santos.
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irrigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC - 6)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto
Municipality (162)

No. kontratu : MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020

Sketch Item servisu la iha tamba
kompania durante ne'e la servisu iha
tereinu projeto refere tama kategoria
abandona



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu la iha tamba kompania
durante ne'e la servisu iha tereinu projeto
refere tama kategoria abandona.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC - 6)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)

No. kontratu : MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020

Data Inspesaun : 14/09/2022

Fatin Inspesaun : Laclubar, Manatuto

Koordinadas :

Start Point : Long 8.7554S, Latetude : 125.9598E

End Point : Long : 8.7529S Latetude : 125.9194E

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmão

2. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu la iha tamba kompania durante ne'e la servisu iha tereinu projeto refere tama kategoria abandona.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC- 7)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage
12+000 - 27+000

No. kontratu : MPW-W-210057

Data Inspesaun : 11/ 09 /2022

Fatin Inspesaun : Laclubar - Fatuk Makerek, Manatuto

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.7484S, Latetude : 125.9052E


End Point : Long : 8.7804S, Latetude : 125.77.14E

Naran Inspector : 1. Eng. Jose Roberto. C Gusmão

2. Eng. Domingos DX. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu la iha tamba kompania sedauk hahu servisu item Routine maintenance, no kompania foin organiza trabalhador atu hahu iha fulan Septembru no Outobru, tamba ne'e teknik uja nafatin foto anterior.

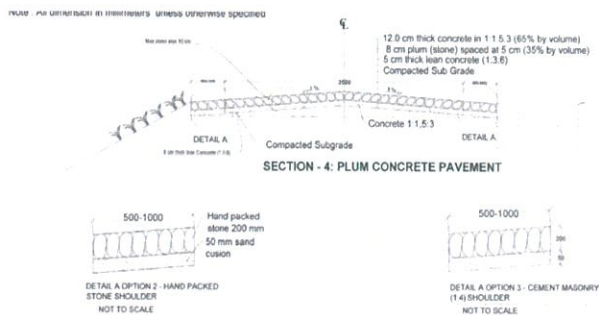

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC- 7) Back-up Data

Naran Projeto

: R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage
12+000 - 27+000

No. kontratu

: MPW-W-210057



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu la iha tamba kompania sedauk hahu servisu item Routine maintenance, no kompania foin organiza trabalhador atu hahu iha fulan Septembru no Outobru, tamba ne'e teknik uja nafatin foto anterior.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC- 7)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage
12+000 - 27+000
No. kontratu : MPW-W-210057

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu la iha tamba kompania sedauk hahu servisu ba item Routine maintenance, no kompania foin organiza trabalhador atu hahu iha fulan Septembru no Outobru, tamba ne'e teknik uja nafatin foto anterior.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (LAC - 8)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000

No. kontratu : MPW-W-210056

Data Inspesaun : 14/09/2022

Fatin Inspesaun : Laclubar

Koordinadas :-

Start Point : Long : -8.747020°, Latetude : 125.915538°

End Point : Long : -8.750884°, Latetude : 125.904335°

Naran Inspector : 1. Jose R.Carlos Gusmão

2. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu line drain ne'ebe TRABALHADOR sira halo iha tereinu la tuir ona dezenhu original kontratu husi projeto nain MOP ba item stone masonry (line drain) ho ida ne'e teknik A.D.N.I.P orienta TRABALHADOR sobu no hadia fila fali.




Drain Type - I

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



#ANEXU C1 (LAC - 8) Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000
No. kontratu : MPW-W-210056

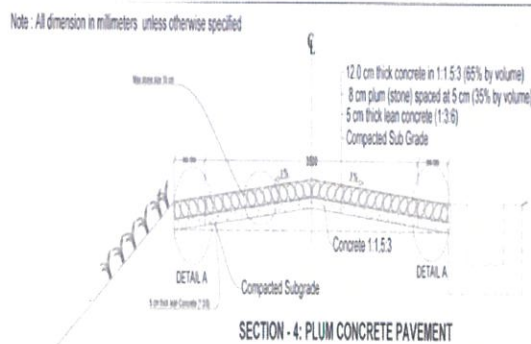

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu line drain ne'ebe trabalhalador sira halo iha tereinu la tuir ona dezenhu original kontratu husi projeto nain MOP ba item stone masonry (line drain) ho ida ne'e teknik A.D.N.I.P orienta trabalhador sobu no hadia fila fali.

Observasaun iha tereno no Foto Atual





#ANEXU C1 (LAC - 8)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000


No. kontratu : MPW-W-210056

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu line drain ne'ebe trabalhalador sira halo iha terenu la tuir ona dezenhu original kontratu husi projeto nain MOP ba item stone masonry (line drain) ho ida ne'e teknik A.D.N.I.P orienta trabalhador sobu no hadia fila fali.



Observasaun iha tereno no Foto Aktual

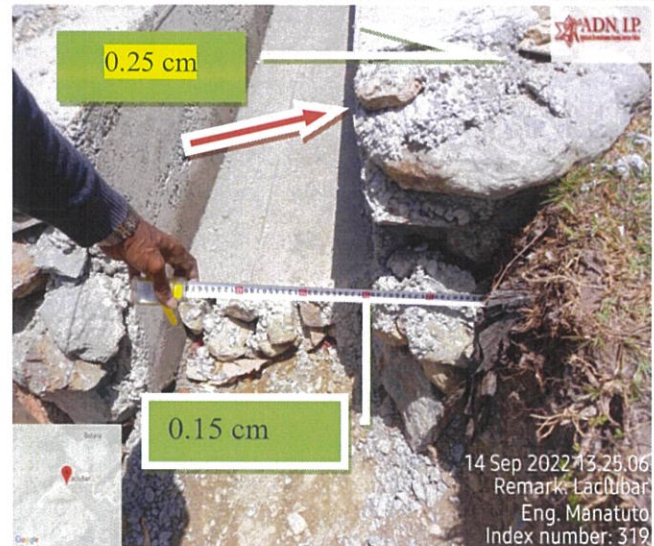

Drain Type - I



#ANEXU C2 (LAC - 8)

Road Name : Funar-Fatumaquerec Chainage start 12+000
Municipality : Manatuto Chainage end 12+000
Postu : Laclubar Length 12.0 Km
Sukos : Orlalan, Funar and Fatumaquerec

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 2,540.00	\$ -	0.00%	\$ 2,150.00	1.01%	\$ 2,150.00	1.01%
R-03	Earth Work	\$ 13,840.22	\$ -	0.00%	\$ 638.40	0.30%	\$ 638.40	0.30%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 25,228.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R - 08	Structure	\$ 102,977.97	\$ -	0.00%	\$ 1,463.80	0.68%	\$ 1,463.80	0.68%
R-10	Dayworks	\$ 175.00	\$ -	0.00%	\$ 175.00	0.08%	\$ 175.00	0.08%
R-11	Routine Maintenance	\$ 16,784.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional Sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 161,745.19	\$ -	0.00%	\$ 4,427.20	2.1%	\$ 4,427.20	2.07%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 16,174.52	\$ -	0.00%	\$ 442.72	0.21%	\$ 442.72	0.21%
C	General Item	\$ 31,661.61	\$ -	0.00%	\$ 2,651.50	1.24%	\$ 2,651.50	1.24%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 4,191.63	\$ -	0.00%	\$ 150.43	0.07%	\$ 150.43	0.07%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 213,772.95	\$ -	0.00%	\$ 7,671.85	3.59%	\$ 7,671.85	3.59%

Inspetores Husi:

1. (Eng. José R Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação, Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

2. (Eng. Domingos D.X. Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação, Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. Remigio da C. Dos Santos
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público						#ANEXU D (LAC-8)	
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN							
Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000							
Kompanha : Adahiak Orlao Unipessoal Lda							
No	Data inspesaun	Munisipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/09/2021	Manatuto/ Laclubar	José R. Carlos Gusmão	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Eng. Munisipiu la prese buku tamu ho rajaun kompania sedauk prepara iha tereinu.	
II	14/09/2021	Manatuto/ Laclubar	Domingos D.X. Silva	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	2	Eng. Munisipiu la prese buku tamu ho rajaun kompania sedauk prepara iha tereinu.	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river,
jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste

No. kontratu : SSS/013/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 21/ 09/ 2022

Fatin Inspesaun : Soibada, Fatucamanau.

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.864667917S Latetude : 125.95837902E


End Point : Long : -8.86475834S, Latetude : 125.95738057E

Naran Inspector : 1. Eng. José Roberto, C. Gusmão


2. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu la iha ona tamba servisdu remata iha tereinu, projeto refere kategoria PHO,tamba teknik rekomenada ona pagamento iha fulan Septembro.

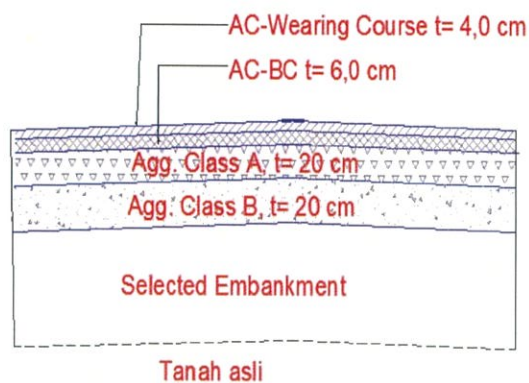

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

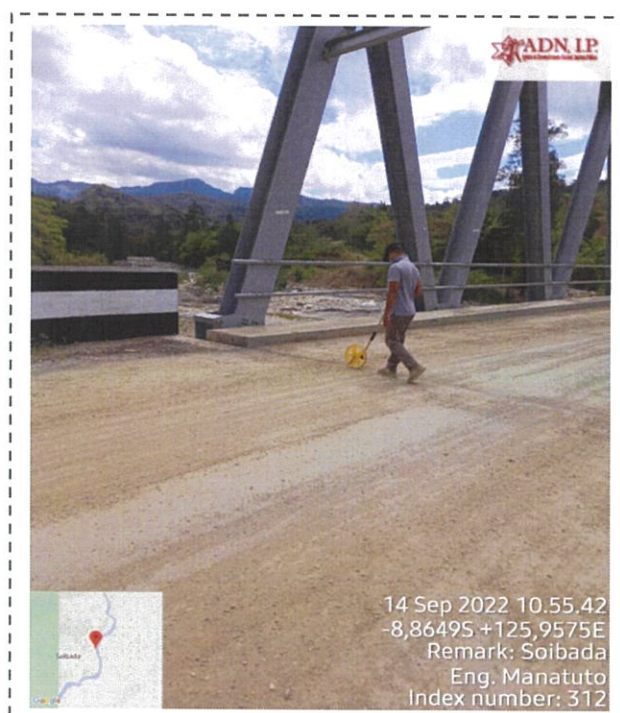



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-1)




Back-up Data

Naran Projeto : Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river,
jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste

No. kontratu : SSS/013/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu la iha ona tamba
servisdu remata iha tereinu, projeto refere
kategoria PHO.

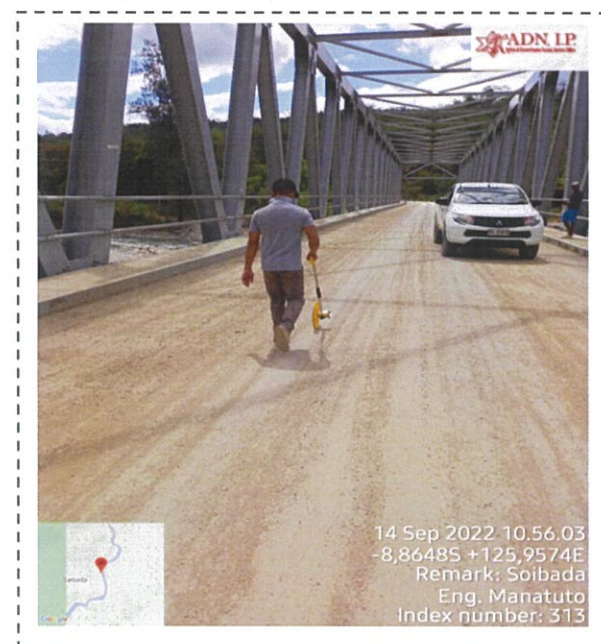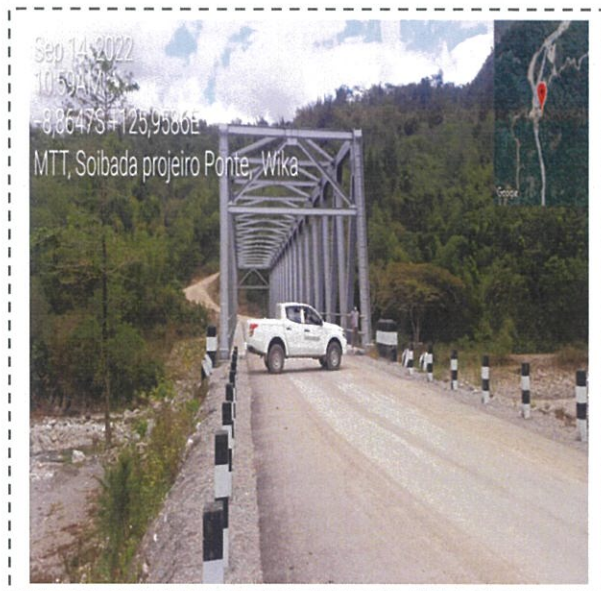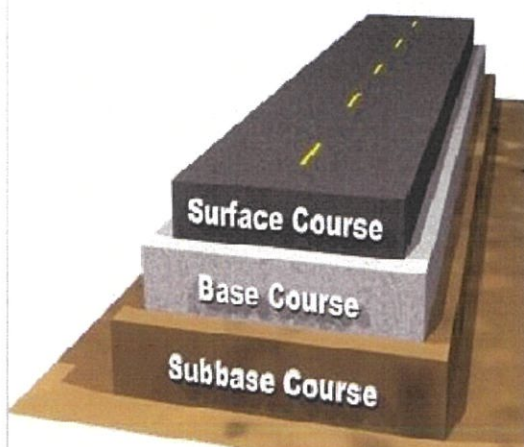



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (SO-1)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau,
Soibada, Timor Leste

Kompanha : FIRDO UNIPESOAAL LDA

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	14/09/2022	Manatuto/ Soibada	José R. Carlos Gusmão	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Eng. Munisipiu halao Monitorizasaun kompanhia laiha iha Tereinu tamba servisu iha tereinu remata ona tamba ne'e husi parte Eng Munisipiu la asina buku tamu.	
II	14/09/2022	Manatuto/ Soibada	Domingos D.X.Silva	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada
Chainage 0+000-2+000

No. kontratu : MPW-W-210059

Data Inspesaun : 17/08/2022

Fatin Inspesaun : Soibada, Buah Rahun

Koordinadas :

Start Point : Long : 8,8399S Latetude: 125,9171E

End Point : Long : 8,82990S Latetude: 125,9223E

Naran Inspector : 1. Eng. Jose Roberto Carlos Gusmão

2. Eng. Domingos D.X Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Line Drain, husi parte teknik uja foto anterior tamba projeto refere sedauk lao iha tereinu.



Drain Type - I

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


#ANEXU C1 (SO - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada
Chainage 0+000-2+000

No. kontratu : MPW-W-210059

Sketch Item servisu Line Drain, husi parte
teknik uja foto anterior tamba projeito refere
sedauk lao iha tereinu.

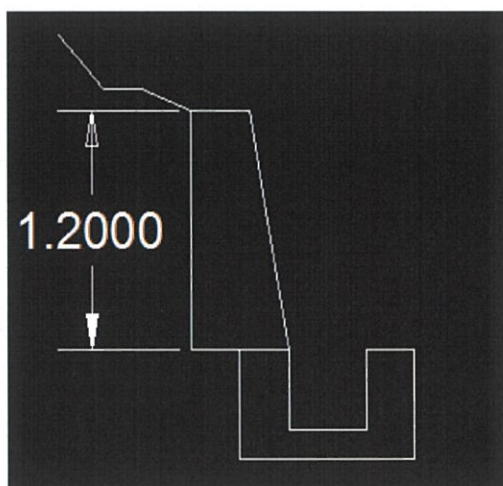

Dados:

$$P = 85 \text{ m}, A = (0,30+0,50/2) * (1,20)$$

$$V = 51 \text{ m}^3$$





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Ki'ik) - Soibada
Chainage 0+000-2+000

No. kontratu : MPW-W-210059

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Stone Masonry



Drain Type - II



17 Agu 2022 13.45.47
8.8329S +125.9219E
Remark: Sarlala-Manufahi ki'ik
Eng. Jose & Dugui
Index number: 262



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-5)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage
8+000-10+700

No. kontratu : MPW-W-210057

Data Inspesaun : 17/ 09 /2022

Fatin Inspesaun : Soibada, Fatuk Makerek

Koordinadas :

Start Point : Long : 8,8510S Latetude : 125,8697E

End Point : Long : 8,8683S Latetude : 125,8736E

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. C. Gusmão

2. Eng. Domingos DX. da Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu iha tereinu la iha tamba
kompania la servisu iha tereinu ho ida ne'e
preojeito refere tama katogoria Abandona
ou (paradu).

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-5) Back-up Data

Naran Projeto

: R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage
8+000-10+700

No. kontratu

: MPW-W-210057



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu iha tereinu la iha tamba
kompania la servisu iha tereinu ho ida ne'e
preojeito refere tama katogoria Abandona
ou (paradu).

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Weaihudik
No. kontratu :

Data Inspesaun : 28 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Weaihudik

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.8515S,

Latetude : 125,9308E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Aleixo Da Costa Andrade

Fabiano F.M Madeira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

serbisu hada blocko, monta formwork, no
pembesian ba ringbalok





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Weaihudik
No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item

serbisu hada blocko, monta formwork, no
pembesian ba ringbalok no monta pipa ba
toilet





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-7)

Back-up Data

Naran Projeto

: Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Weaihudik

No. kontratu

:

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

serbisu hada blocko, monta formwork, no
pembesian ba ringbalok no monta pipa ba
toilet





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto
(MPW-W-190157) (162)
No. kontratu : MPW-W-190157

Data Inspesaun : 28.09.2022

Fatin Inspesaun : Natarbora

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.99274046, Latetude : 126.01725,686


End Point : Long : -8.99480123, Latetude : 126.0165592,

Naran Inspector : 1. Jose R.C. Gusmão
2. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tamba projeto
refere Abandona. Ami mos utiliza nafatin
foto fulan agosto nian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

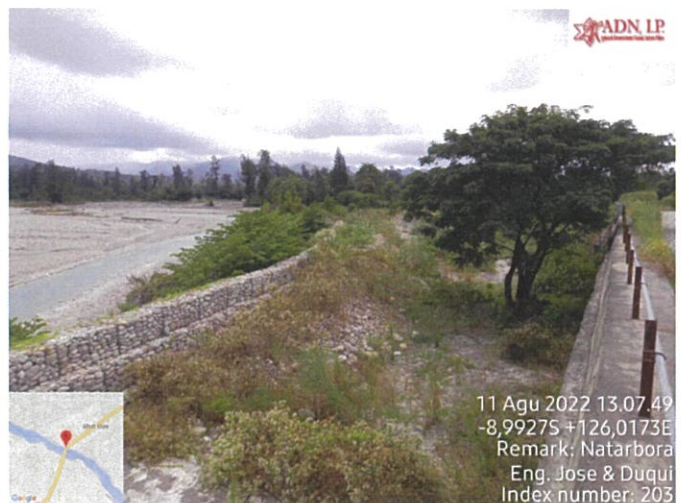



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA-1)

Back-up Data


Naran Projeto : Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto
(MPW-W-190157) (162)

No. kontratu : MPW-W-190157

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tamba projeto
refere Abandona. Ami mos utiliza nafatin
foto fulan agosto nian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

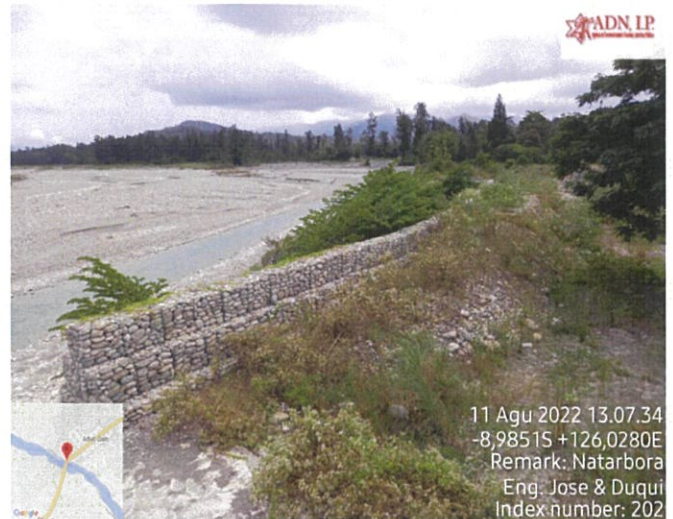

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA- 7) Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage
0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)
No. kontratu : MPW-W-W-190080

Data Inspesaun : 17/ 08/ 2022

Fatin Inspesaun : Barique

Koordinadas :


Start Point : Long : -8°50'13.288"S, Latitude: 126°1'4.064"E

End Point : Long : -8°50'11.206"S, Latitude: 126°126'053"E

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmão
2. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu la iha tamba kompania
abandona servisu iha tereinu, atu informa
mos katak husi parte kompania hatama karta
ba MOP lakoi kontinuasaun servisu ona.

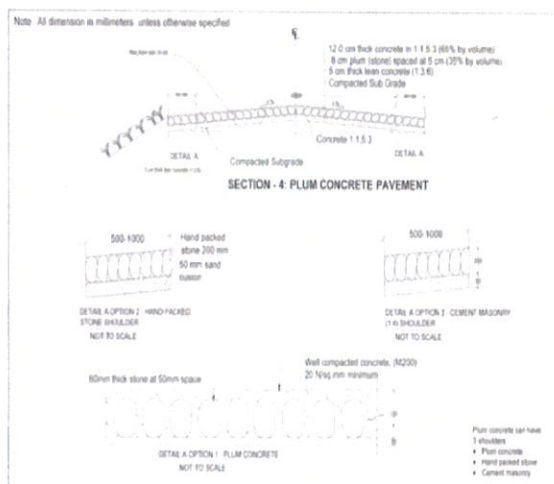

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


#ANEXU C1 (BA - 7) Back-up Data

Naran Projeto

: R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage
0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)


No. kontratu

: MPW-W-W-190080

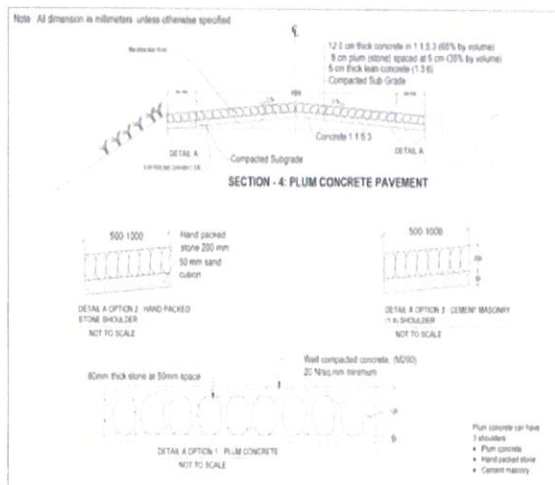

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu la iha tamba kompania abandona servisu iha tereinu, atu informa mos katak husi parte kompania hatama karta ba MOP lakoi kontinuasaun servisu ona.

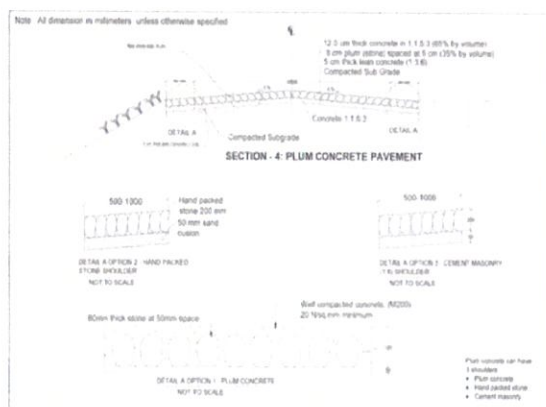

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


#ANEXU C1 (BA- 7) Back-up Data

Naran Projeto

: R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage
0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)

No. kontratu

: MPW-W-W-190080

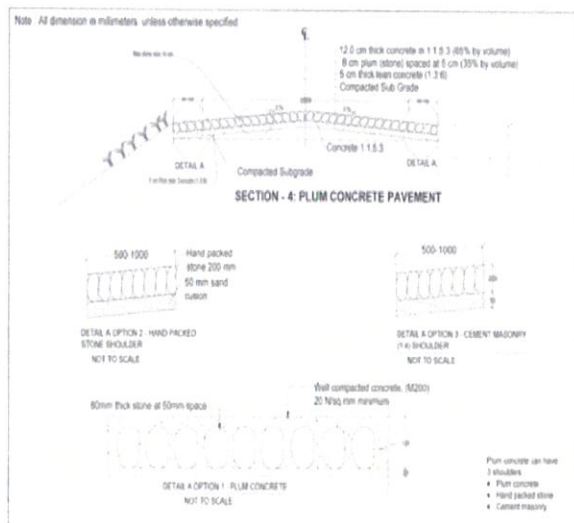



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA - 8)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon
Chainage 3+000-6+200

No. kontratu : MPW-W-210062

Data Inspesaun : 28/ 09/ 2022

Fatin Inspesaun : Barique

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.996644°, Latetude : 126.084961°

End Point : Long : -8.977311°, Latetude : 126.102659°


Naran Inspector : 1. Eng. José R. C. Gusmão

2. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu sedauk iha tamba
kompania foin hahu hamoos rai rahun
molok rega aspal been/prime coat.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

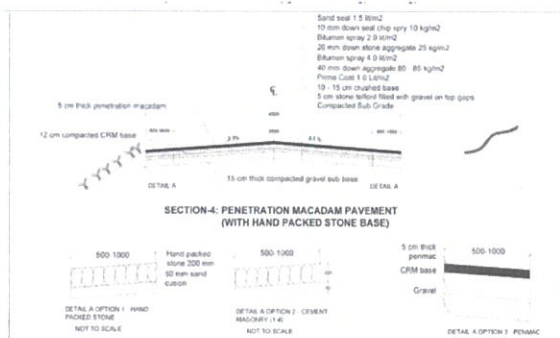



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA - 8) Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon
Chainage 3+000-6+200
No. kontratu : MPW-W-210062

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item la iha. Trabalhador hahu dasa
sai fatuk rahun, molok rega aspal
been/prime coat.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Parte kamada base course nebe hamoos
ona no hein rega prime coat.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (BA - 8)

Naran Projeto : RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT AGRICULTURE CENTRE - AUBEON CHAINAGE (STA 3 + 000 - 6 + 200)
No. kontratu : MPW - W - 210062
Postu : Natarbora
Suku : Aubeon
Naran Companhia : We' Coi Unip, Lda.

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 2,340.00	\$ 1,650.00	0.48%	\$ 370.00	0.11%	\$ 2,020.00	0.59%
R-03	Earth work	\$ 10,796.77	\$ 9,497.96	2.77%	\$ 13,114.45	3.82%	\$ 22,612.41	6.59%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 57,631.73	\$ 57,817.33	16.85%	\$ 0.07	0.00%	\$ 57,817.39	16.85%
R - 07	Bituminous pavement	\$ 175,067.20	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structures	\$ 35,867.39	\$ 34,149.46	9.95%	\$ 487.33	0.14%	\$ 34,636.79	10.09%
R-10	Dayworks	\$ 175.00	\$ 175.00	0.05%	\$ 175.00	0.05%	\$ 350.00	0.10%
R-11	Routine Maintenance	\$ 6,341.00	\$ -	0.00%	\$ 5,966.00	1.74%	\$ 5,966.00	1.74%
R-15	Provisional Sum	\$ 100.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 288,319.09	\$ 103,289.74	30.10%	\$ 20,112.85	5.9%	\$ 123,402.60	36.0%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 28,831.91	\$ 10,328.97	3.01%	\$ 2,011.29	0.59%	\$ 12,340.26	3.60%
C	General Item	\$ 19,232.79	\$ 4,430.50	1.29%	\$ 7,920.00	2.31%	\$ 12,350.50	3.60%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 6,727.68	\$ 2,360.98	0.69%	\$ 600.88	0.18%	\$ 2,961.87	0.86%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 343,111.47	\$ 120,410.20	35.38%	\$ 30,645.02	8.93%	\$ 151,055.22	44.31%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Domingos D.X.Silva)

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irigação
Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

2.(José R. Carlos Gusmão)

Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irigação
Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C,S. dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (BA- 8) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200							
Kompanha : We"coi Unipessoal Lda							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/09/2022	Manatuto/ Barique	Eng. José R. C. Gusmão	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Kompania hahu hamos rai rahun parte Base Course hodi hein preparasaun prime cout husi parte teknik labele prese buku tamu tamba kompania la prepara.	
II	28/09/2022	Manatuto/ Barique	Eng. Domingos,D.X. Silva	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	3	Kompania hahu hamos rai rahun parte Base Course hodi hein preparasaun prime cout husi parte teknik labele prese buku tamu tamba kompania la prepara.	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (BA-9)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center
Chainage 0+000 - 3+000

No. kontratu : MPW-W-210061

Data Inspesaun : 28/ 09/ 2022

Fatin Inspesaun : Natarbora - Uma Boco- Aubeon

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.996666°, Latetude : 126.084966°

End Point : Long : -9.004681°, Latetude : 126.061377°

Naran Inspector : 1.Eng. Jose R. Carlos Gusmão,

2. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Projetu ne'e paradu kleur ona. Equipa dala barak halo inspesaun iha terenu maibe la hetan tekniku ruma no nain ba kompania.

Equipa kontaktu ona nain ba kompania mas la garantia atu hahu bainhira.(tamba projetu paradu nune'e dalaruma equipa attach fali foto fulan kotuk nian)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage
0+000-9+000

No. kontratu : MPW-W-210058

Data Inspesaun : 14/09/2022

Fatin Inspiksaun : Barique, Kaen laran

Koordinadas : Start Point : Long : -8.839898°, Latetude : 126.004266°


End Point : Long : -8.853010°, Latetude : 126.061603°

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmão

2. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu kompania komesa servisu
item Gravel superface supplay.

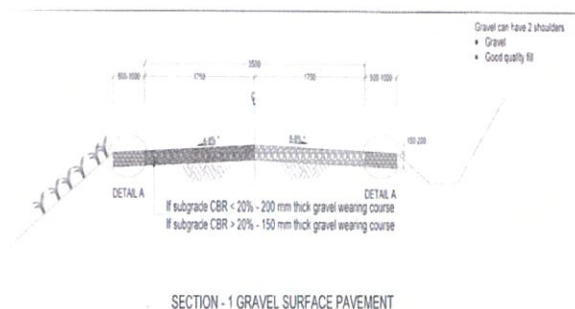

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA - 10)

Back-up Data


Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage
0+000-9+000

No. kontratu : MPW-W-210058

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu kompania komesa servisu
item Gravel superface supplay.

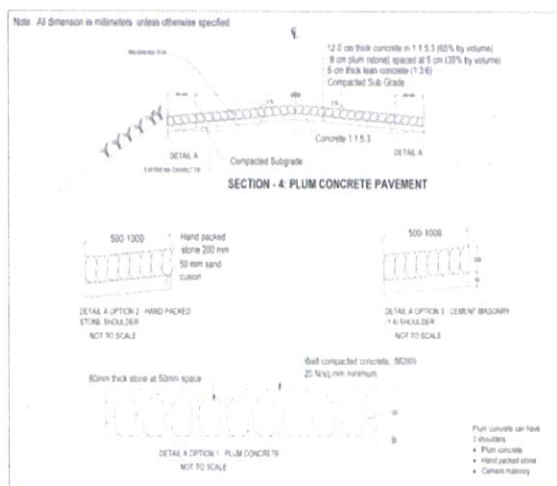

14 Sep 2022 10.03.31
-8,84295 +126,0603E
Remark: Barique tuan
Eng. Manatuto
Index number: 308



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA - 10)


Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage
0+000-9+000

No. kontratu : MPW-W-210058

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu kompania komesa servisu
item Gravel superface supplay.

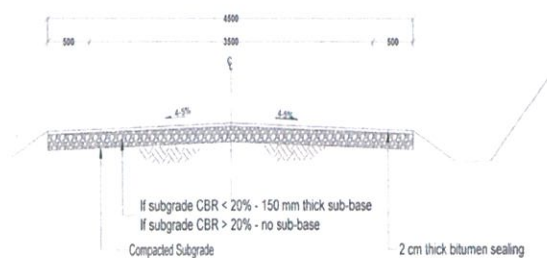

SECTION - SEALED GRAVEL BASE

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



14 Sep 2022 09:33:27
8,8382S +126,0097E
Remark: Barique tuan
Eng. Manatuto
Index number: 304

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (BA - 10)

Naran Projeto : R4D RUAL ROAD SPOT IMROVEMENT, KEAN LARAN - BARIQUE CHAINAGE 0+000 - 9 + 000
No. kontratu : MPW - W - 210058
Postu : Barique
Suku : Barique
Naran Kompanhia : Gimso ,Unip. Lda

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)						
R-01	General	\$ 2,980.11	\$ 1,300.00	0.43%	\$ 450.00	0.15%	\$ 1,750.00	0.58%
R-03	Earth work	\$ 11,414.65	\$ 5,345.36	1.78%	\$ 3,622.11	1.20%	\$ 8,967.47	2.98%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 32,040.00	\$ 35,600.00	11.84%	\$ -3,560.00	-1.18%	\$ 32,040.00	10.65%
R-08	Structures	\$ 181,126.91	\$ 101,434.04	33.72%	\$ 2,889.22	0.96%	\$ 104,323.26	34.68%
R-10	Dayworks	\$ 175.00	\$ 105.00	0.03%	\$ 7.00	0.00%	\$ 112.00	0.04%
R-11	Routine Maintenance	\$ 14,384.50	\$ 10,565.50	3.51%	\$ 15.00	0.00%	\$ 10,580.50	3.52%
R-15	Provisional Sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 242,321.16	\$ 154,349.90	51.31%	\$ 3,423.33	1.14%	\$ 157,773.23	52.45%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 24,232.12	\$ 15,434.99	5.13%	\$ 342.33	0.11%	\$ 15,777.32	5.25%
C	General Item	\$ 28,341.30	\$ 5,775.00	1.92%	\$ -	0.00%	\$ 5,775.00	1.92%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 5,897.89	\$ 3,511.20	1.17%	\$ 75.31	0.03%	\$ 3,586.51	1.19%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 300,792.46	\$ 494.42	59.53%	\$ 3,840.98	1.28%	\$ 182,912.06	60.81%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng.Domingos DX. Silva)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

2. (Eng. José R Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da c.s dos Santos)
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


#ANEXU D (BA-10)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000

Kompanha : Gimso Brothers Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	14/09/2022	Manatuto/ Barique	Jose R. Carlos Gusmão	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Husu ba Eng. Kompanhia atu orienta Servisu iha Terreno bazeia ba Espesifikasaun no Desenho.
					2	Husu ba Eng. Kompanhia hare material item gravel supplay iha tereinu tamba material refere soil mak dominan.
					3	Komesa hahu husi Sta 6+411 - 4+900 item gravel supplay soil mak barak iha tereinu.
					4	Husu ba MOP atu hare dididak ba item Gravel supplay ne'e tamba iha tempu udan sei provoka tahu.
II	14/09/2022	Manatuto/ Barique	Domingos D.X. Silva	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Husu ba Eng. Kompanhia atu orienta Servisu iha Terreno bazeia ba Espesifikasaun no Desenho.
					2	Husu ba Eng. Kompanhia hare material item gravel supplay iha tereinu tamba material refere soil mak dominan.
					3	Komesa hahu husi Sta 6+411 - 4+900 item gravel supplay soil mak barak iha tereinu.
					4	Husu ba MOP atu hare dididak ba item Gravel supplay ne'e tamba iha tempu udan sei provoka tahu.

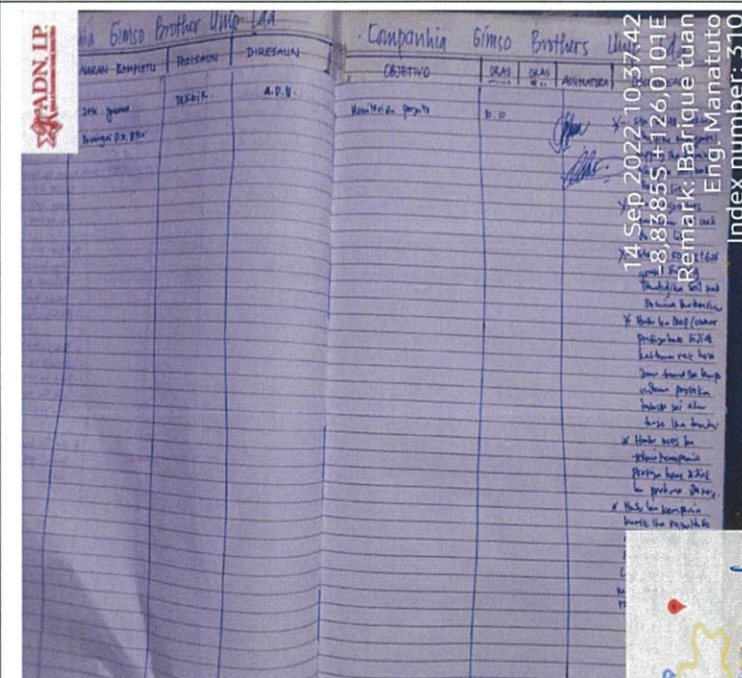

[Signature]

[Signature]



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA-11)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Gapura and Gabion Wall Protection no Jardim de
Herois de Natarbora

No. kontratu : 215/MACLN/X/2021

Data Inspesaun : 28 Setembro 2022

Fatin Inspesaun : Natarbora

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.9711S,

Latetude : 126,04947E

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : 1. Aleixo Da Costa Andrade

2. Fabiano F.M Madeira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Serbisu pambesian ba koluna no cor sloof
okos





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA-11)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Contruction of Gapura and Gabion Wall Protection no Jardim de
Herois de Natarbora

No. kontratu


: 215/MACLN/X/2021

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Item serbisu hada ke'e no hada bronjong

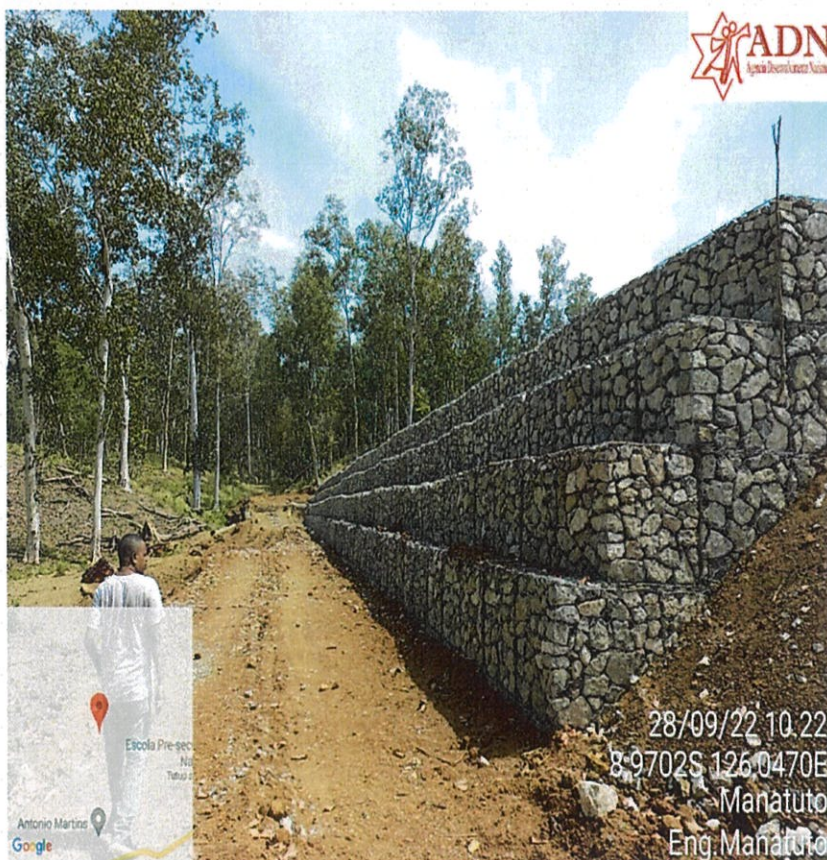



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA-11)

Back-up Data

Naran Projeto : New Contruction of Gapura and Gabion Wall Protection no Jardim de
Herois de Natarbora

No. kontratu : 215/MACLN/X/2021

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item serbisu hada ke'e no hada bronjong





#ANEXU C2 (BA-11) SUMMARY BOQ

PEMILIK PROYEK : MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA
LIBERTAÇÃO NACIONAL
NAMA PROYEK : NEW CONSTRUCTION OF GAPURA AND GABION WALL
PROTECTION IN GARDEN OF HEROES
LOKASI : NATARBORA - MANATUTO

SUMMARY								
NO	URAIAN PEKERJAAN	ORIGINAL CONTRACT TOTAL BIAYA (US\$)	PROGRESS BY A D N					
			PREVIOUS PROGRESS		PROGRESS SEPTEMBER		PROGRESS TO DATE	
I	PERSIAPAN	\$ 6.550,00	\$ 4.600,00	1,13%	\$ -	0,00%	\$ 4.600,00	1,13%
II	KONSTRUKSI GAPURA	\$ 34.469,21	\$ 3.531,46	0,86%	\$ 7.911,79	1,94%	\$ 11.751,51	2,88%
III	PEMASANGAN BRONJONG	\$ 318.618,69	\$ 130.451,45	31,94%	\$ 158.314,93	38,76%	\$ 292.328,64	71,57%
A	TOTAL	\$ 359.637,90	\$ 140.147,70	33,93%	\$ 166.226,72	40,70%	\$ 308.680,15	75,57%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 35.963,79	\$ 14.014,77	3,43%	\$ 16.622,67	4,07%	\$ 30.868,02	7,56%
C	OVERHEAD	\$ 4.850,00		0,00%		0,00%		0,00%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 8.009,03	\$ 3.083,25	0,75%	\$ 3.656,99	0,90%	\$ 6.790,96	1,66%
E	GRAND TOTAL (A+B+C+D)	\$ 408.460,73	\$ 157.245,72	38,50%	\$ 186.506,37	45,66%	\$ 346.339,13	84,79%

Prepara husi :

1. (Eng. Aleixo Da Costa Andrade)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

2. (Eng. Fabiano Fitalis Maria Madeira)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (BA-11)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Contruction of Gapura and Gabion Wall Protection no Jardim de Herois de Natarbora

Kompanha : Senizu Unipesoal, Lda

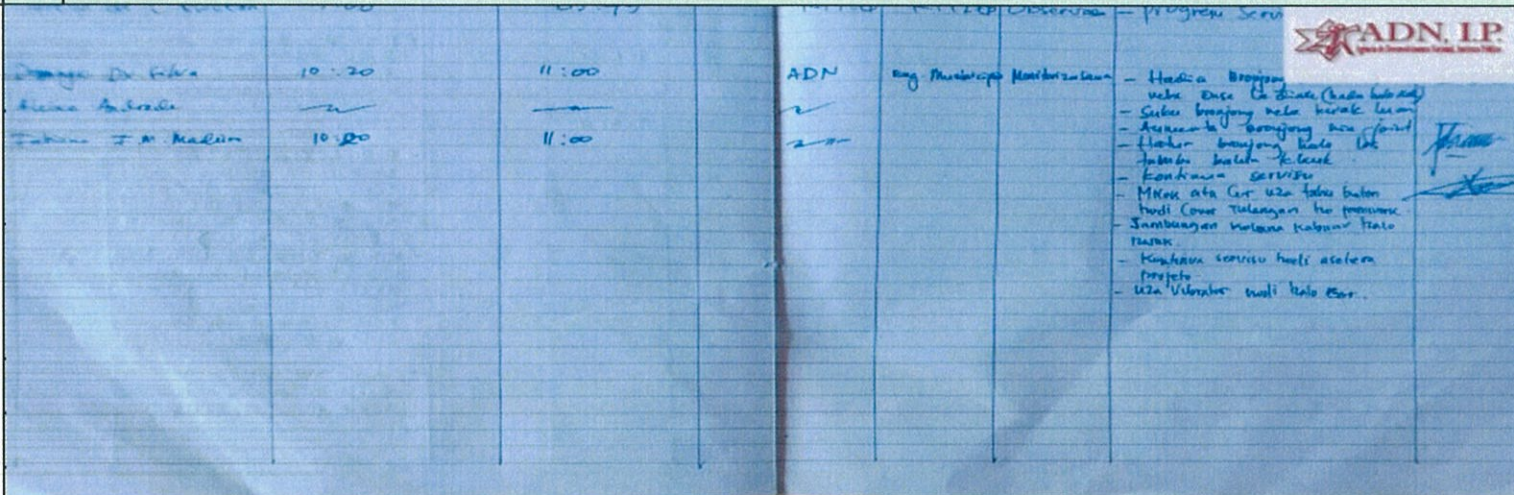No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura				
I	28/09/2022	Manatuto/Barique	Aleixo Da Costa Andrade	Tek A D N, IP							
II											
					1	Hadia bronjong nebe ense la diak (hada halo diak)					
					2	Suku bronjong nebe maka kuak					
					3	aumenta bronjong nia joint					
					4	Hatur bronjong halo los tamba balun kleuk					
					5	Kontinua servisu					
					6	Molok atu cor, uza tahu beton hodi cover tulangan ho formwork					
					7	Sambungan koluna kabur halo naruk					
					8	Uza vibrator hodi halo cor					
					9	Kontinua servisu hodi aselera Projeto					
											



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA -1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Laclo to
Mantane - Manatuto Municipality 0000421)

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421

Data Inspesaun : 27 - 09 - 2022

Fatin Inspesaun : Laclo - Mantane

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.55175757S, Latetude : 125.92822726E

End Point : Long : 8.55541886, Latetude : 125.90941978E

Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Treckschoor Mamar

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA -1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Laclo to
Mantane - Manatuto Municipality 0000421)

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 12 Pinta mos ona



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 9 m kleuk / halis





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA -1)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Laclo to
Mantane - Manatuto Municipality 0000421)

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Pint Post halis

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

TreckSchoor mamar

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (LA -1)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

**Naran projeto : New Installation MV, LV Line and House Connection from Laclo to Mantane -
Manatuto Municipality**

Kompanha : Anopa Electrical Unip. Lda

No	Data Inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	27/09/2022	Manatuto / Laclo	Adonis Julio Fernandes	Tekniku,ME	1	Pinta Fali Poste nebe tinta mos ona (Aplika ba poste 12 m no 9 m)	
					2	Hadia fali Schoort nebe kotu no Mamar	
					3	Hadia fali poste 12 m no 9 m nebe maka kleuk (Halis)	
					4	Tesi Ai nebe besik iha Linha nebe fo risku ba comunidade	
					5	Husu ba kompanhia prepara Asbuild drawing (gambar Lapangan no Time Schuedule)	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila
to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality

No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412

Data Inspesaun : 28 - 09 - 2022

Fatin Inspesaun : Laclubar, Fumar and Lihudenu

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.75102778S, Latetude : 125.90414729E

End Point : Long : 8.7503815S, Latetude : 125.87029475E

Naran Inspector : Adonis Julio Fernandes

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Trafo 100 KVA Warning sign no climber
protection seidauk installa

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila
to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality


No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste Halis & Cross arm kois

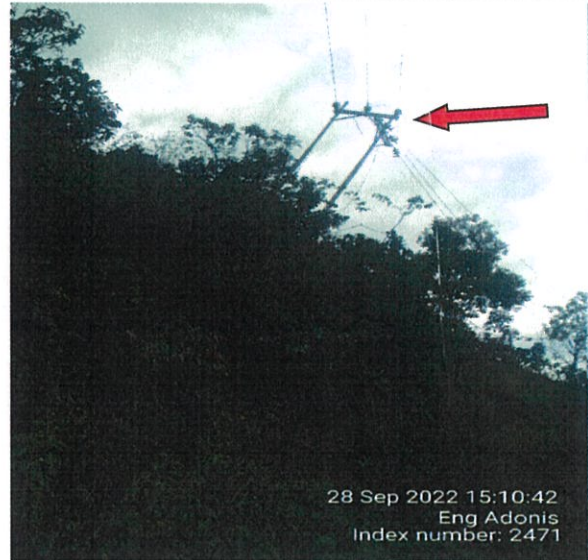

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Poste 12m halis





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC-2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila
to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality
No. kontratu : RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Treckshoor Mamar





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LAC -2)

Date of Issue : 28-09-2022

Location : Municipio Manatuto (Laclubar Vila To Funar ho Fatuk Manu)

Company : Tasi Bala Unip. Lda

Project Name : New Installation of MV, LV & Home Conection

SUMMARY									
ORIGINAL CONTRACT (OWNER)				ADN,IP VERIFICATION					
NO	DESCRIPTION			PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE	
		AMOUNT (\$)	PERCENTAGE(%)	AMOUNT (\$)	PERCENTAGE(%)	AMOUNT (\$)	PERCENTAGE(%)	AMOUNT (\$)	PERCENTAGE(%)
I	PREPARATION WORK	\$ 25,536.16	3.67%	\$ 25,536.16	3.67%	\$ -	0.00%	\$ 25,536.16	3.67%
II	INSTALLATOIN MV IINE	\$ 388,742.04	55.90%	\$ 367,460.03	52.84%	\$ 1,819.37	0.26%	\$ 369,279.40	53.10%
III	INSTALLATION OF TRANSFORMER	\$ 62,275.32	8.96%	\$ 65,323.32	9.39%	\$ -	0.00%	\$ 65,323.32	9.39%
IV	EXTENTION LV LINE	\$ 128,617.31	18.49%	\$ 126,763.01	18.23%	\$ -	0.00%	\$ 126,763.01	18.23%
V	HOME CONECTION	\$ 90,250.00	12.98%	\$ 38,000.00	5.46%	\$ -	0.00%	\$ 38,000.00	5.46%
	TOTAL	\$ 695,420.83	100.00%	\$ 623,082.52	89.60%	\$ 1,819.37	0.26%	\$ 624,901.89	89.86%
	GRAND TOTAL CONTRACT	\$ 695,420.83							

Inpeksaun Husi :

Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projecto ME, ADN, I.P

Verifika Husi :

Eng. Deolindo de Fatima Marques
Chefe Seksaun ME & ITC , ADN, I.P

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas
Coordenadora UCVQ, ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (LAC-2)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And
Fatuk Manu - Manatuto Municipality

Kompanha : Tasibala III Unip. Lda

No	Data Inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/09/2022	Manatuto/ Laclubar	Adonis Julio Fernandes	Tekniku, ME	1	Cor Pondasi uja besi, Hadia no Cor ulang Pondasi (Pondasi poste 9 m no 12 m nakfera/Rahun)	
					2	Hadia no istika fali treckschoor nebe kotu no mamar	
					3	Hadia no haloos fali poste 12m no 9m nebe mak halis/ kleuk	
					4	Hadia Fiu MV no LV Line nebe mak monu/Kois	
					5	Monta lampu manutensaun trafo nian(Trafo)	
					6	Hadia Cross Arm nebe mak halis (ameasa atu monu)	
					7	Husu ba kompanhia prepara asbuild drawing	
					8	Husu ba kompanhia prepara Time Schuedule (Schuedule servisu)	
					9	Pinta fali poste nebe tinta mos ona (Poste 12 no 9 m)	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA - 4) Back-up Data

Naran Projeto : Routine Roads Maintenance - Lacle, Manatuto Municipality
No. kontratu : MPW-W-190251

Data Inspesaun : 09/ 09/ 2022

Fatin Inspesaun : Manatuto / Lacle

Koordinadas :


Start Point : Long : 125'91524541, Latetude : -8.55757187
End Point : Long : 125'91384094, Latetude : -8.55721745

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmão
2. Eng. Domingos D.X. Silva

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Servisu sedauk lao to'to agora tamba kompania sei kordena ho projeito nain owner (MOP) tamba iha mudansa iha treinu, no servisu to'o agora sedauk lao.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

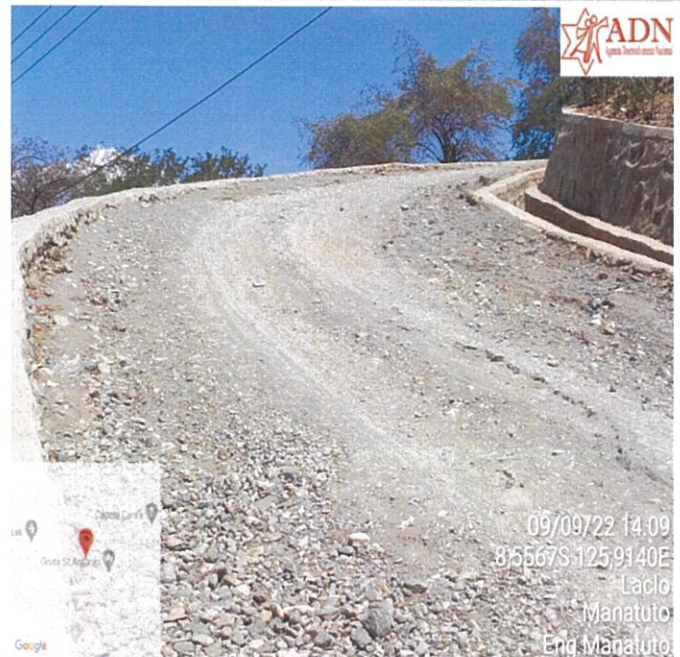



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Roads Maintenance - Laclo, Manatuto Municipality
No. kontratu : MPW-W-190251

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Servisu sedauk lao to'to agora tamba kompania sei kordena ho projeito nain owner (MOP) tamba iha mudansa iha treinu, no servisu to'o agora sedauk lao.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Naran Eng.		Aleixo Andrade Da Costa							2022																														
Município		MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																					
Município / Posto		No.	Naran Projeto	Naran-Kompanhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Setembro																														OBS
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MANATUTO VILA (MV)	3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipessoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															On Going	
							Actual																																
	6	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	Ralan Unip. Lda	03/PDIM-II/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															PHO	
							Actual																																
	7	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																															On Going	
							Actual																																
	8	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																															On Going	
							Actual																																
	9	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	LM	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																															FHO	
							Actual																																
	10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-186	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															FHO	
							Actual																																
	13	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Munisipiu Manatuto	Talamori Unip,Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															On Going	
							Actual																																
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															On Going	
							Actual																																
	16	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MEJD PKRIE EBF RENTAU	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															On Going	
							Actual																																
	17	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MEJD PKRIE PE REMBOR	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															On Going	
							Actual																																
18	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MEJD PKRIE EBF OBRATO	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															On Going		
						Actual																																	
19	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															On Going		
						Actual																																	
20	Supplay and Installation Main Power For Isolation an Laboratorium Building Maabat Manatuto	MINISTERIO SAUDE	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229	FI	MINESTERIO SAUDE	Plan																															On Going		
						Actual																																	
21	New Construction of Fence at Islation	MINISTERIO SAUDE	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-227		MINESTERIO SAUDE	Plan																															On Going		
						Actual																																	
LALEA (LAL)	1	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MP/IEV/II/DILI/2019/E DIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																														Pendenti		
							Actual																																
	2	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	Hare Unip.Lda	02/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																														FHO		
							Actual																																
	4	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MEJD PKRIE EP CAIRUI	-	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														On Going		
						Actual																																	
LACLUBAR (LAC)	3	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	Ladiama Unip. Lda	04/PDIM I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																														Kontrato Remata Ona		
							Actual																																
	4	Konstrusaun Rezidencia Pesoa Iha iha Suku Funar - Laklubar	Tonijo Unip. Lda	05/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																

[illegible]

PLANU INSPESAUN

[illegible]

2022

[illegible]

Sertifica Husi : 

(Eng. Emercenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controle e Avaliação de Qualidade, ADN.I.P

Aprova Hus? 
 (Ene. Januario Maia Gutierrez)
 Adjunto Director Ejecutivo, ADN.I.F.



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	José Roberto. C. Gusmão							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Município	Manatuto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	SETEMBRO																														OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MANATUTO VILA (MV)	1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

✂

PLANU INSPESAUN

[illegible]

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesasaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng. José R. Carlos Gusmão)

Eng. ba Projeto Infraestrutura Transporte e Irigação
Município Manatuto, ADN.I.P

Sertifikasi Hutan :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controle e Validação de Qualidade, ADN.I.P.

Page 2 of 2

Aprova Husi :

(Eng. Jandirio Maia Guterres

Adjunto Director Ejecutivo, ADN.I.P

[illegible]

[illegible]

[illegible]

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIA DA VIGILÂNCIA E CONTABILIDADE  ADN, L.P. Agência de Desenvolvimento Municipal - Instituto Público										PLANU INSPESAUN																													
Naran Eng. Domingos D. X. Silva						2022																																	
Município Manatuto																																							
Município / Posto						SETEMBRO																														OBS			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
LACLO (LA)	2	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Município Manatuto	Sahan I Unip.Lda	SSS/304/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PHO	
							Actual																																
	4	Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality	Egana, Unip. Lda	MPW-W-190251	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	8	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	Sinohydro Corporation Limited	ICB/07/MPW-2014	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							
Note: Plano Periode inspesaun iha tereinu Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu																																							

Prepara Husi:


(Domingos D. X. Silva)
Eng. ba Projeto Infraestrutura Transporte e Irigasaun
Munisipiu Manatuto, ADN.LP

Certifica Husi:


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN.LP

Aprova Husi:


(Eng. Januário Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN.LP

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ADN, L.P. Agência de Desenvolvimento Nacional - Investimentos Públicos							PLANU INSPESAUN																																	
Naran Eng.	Domingos D. X. Silva						2022																																	
Município	Manatuto																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	SETEMBRO																														OBS		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
MANATUTO VILA (MV)	1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Progressu Fiziku 100%		
							Actual																																	
	2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	SSS/061/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Progressu Fiziku 100%		
							Actual																																	
	4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	ICB/023/MPW-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going		
							Actual																																	
	6	Manatuto to Laclubar (Orhua Bridge)	Manu Aman Unip.Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PHO	
							Actual																																	
	12	Sumase River	Forte, Unip. Lda	SSS/113/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	FHO
							Actual																																	
	13	Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu, Manatuto Municipality	Ilatun, Lda	SSS/115/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Progressu Fiziku 100%	
							Actual																																	
	14	New Const. of Gabion Tower No 04 Section Manatuto - Baucau	Geovanio Unip. Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Progressu Fiziku 100%	
							Actual																																	
LALEIA (LAL)	3	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	As Jazesia Unipessoal Lda	MPW-W-210055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Progressu Fiziku 100%		
							Actual																																	
LACLUBAR (LAC)	2	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	China Nuclear Industry 22ND Construction Co, LTD	ICB/04/MPW-2014	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going		
							Actual																																	
	5	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	Hatuwari Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190035	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going			
							Actual																																	
	6	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	Ryzena Unipessoal Lda	MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going			
							Actual																																	

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL INSTITUTO PÚBLICO ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Domingos D. X. Silva						2022																																
Município	Manatuto																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	SETEMBRO																														OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
SOIBADA (SO)	1	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	FIRDO UNIPESOAAL LDA	SSS/013/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Progressu Fízika 100%
							Actual																																
	4	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	Manufahi Kik Unip. Lda	MPW-W-210059	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	Ryzena Unipessoal Lda	MPW-W-210060	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																On Going
							Actual																																
BARIQUE (BA)	1	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	Yoku Unipessoal Lda	MPW-W-190157	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	3	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	Zenobia Diak Unip.Lda	MPWTC - CD - 170003	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Progressu Fízika 100%		
							Actual																																
	7	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	Manufahi Kik Unip. Lda	MPW-W-W-190080	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going		
							Actual																																
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	We"coi Unipessoal Lda	MPW-W-210062	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	9	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	Linoel	MPW-W-210061	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
	10	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	Gimso Brothers Unip. Lda	MPW-W-210058	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															On Going	
							Actual																																
LACLO (LA)	2	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	Sahan I Unip.Lda	SSS/304/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PHO	
							Actual																																
	4	Routine Roads Maintenance - Lacio, Manatuto Municipality	Egana, Unip. Lda	MPW-W-190251	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going		
							Actual																																
	8	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	Sinohydro Corporation Limited	ICB/07/MPW-2014	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Progressu Fízika 100%	
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							
Note:																																							
Plano Periode inspesaun iha tereinu		Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu																																					
		Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili																																					
		Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu																																					

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Adonis Julio Fernandes
------------	------------------------

Municipio	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS
-----------	------------------------------

2022

[illegible]

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO  ADN, LP.  Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Adonis Julio Fernandes						2022																																
Municipio	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																						
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	SETEMBRO																														OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
MANATUTO VILA (MV)	1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Batara	MEJD PKRIE EBF BATARA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															Servisu electricidade seidauc	
							Actual																																
	2	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Aisiu-Um	MEJD PKRIE EBF AISIU-UM	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															Servisu electricidade seidauc	
							Actual																																
	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Remanarun	MEJD PKRIE EBC REMANARUN	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																															Servisu electricidade seidauc	
							Actual																																
	4	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Weaihudik	MEJD PKRIE EBC WEAIHUDIK	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Servisu electricidade seidauc
							Actual																																
	5	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Rentau	MEJD PKRIE EBF RENTAU	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Servisu electricidade seidauc
							Actual																																
	6	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESG Kay Rala	MEJD PKRIE ESG KAY RALA	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Servisu electricidade seidauc
							Actual																																
	7	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Obrato	MEJD PKRIE EBF OBRATO	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Servisu electricidade seidauc
							Actual																																
	8	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	9	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	Ralan Unip. Lda	03/PDIM-II/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	10	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																															Projeitu Abandona	
							Actual																																
	11	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																															Projeitu Abandona	
							Actual																																
	12	Costrusaun Fatin Izolamento Iha Municipio Manatuto	Talamori Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	LM	SAUDE	Plan																																
							Actual																																
13	Supplay and installation Main Power for Isolation and Laboratorium Building Maabat Manatuto	Fraternity Unip.Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-229	LM	MINISTERIO DA SAUDE	Plan																																	
						Actual																																	
14	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-186	LM	MINISTERIO DA SAUDE	Plan																																	
						Actual																																	
LALEIA (LAL)	1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EP Cairui	MEJD PKRIE EP CAIRUI	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														Servisu electricidade seidauc		
							Actual																																
	2	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/VII /DILI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																														Projeitu kontratu laiha		
							Actual																																
	3	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	Hare Unip.Lda	02/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	SETEMBRO																														OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LACLUBAR (LAC)	1	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Lakiubar	Ladiama Unip. Lda	04/PDIM I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	3	Konstrusaun Rezidencia Pesoa Iha iha Suku Funar - Lakiubar	Tonjo Unip. Lda	05/PDIM- I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	1	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	Hatuwari Unip. Lda	02/PDD- I/MNTT/VII/2015	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	Manufahi Kiik Unip. Lda	01/PDIM- I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
BARIQUE (BA)	1	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	Tasibala II Const	RDTL/PO:2016-11272	LM	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	Malack II Unip. Lda	03/PDIM- I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
LACLO (LA)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	Anopa Electrical Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000421	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lacio	Ailili Const. Unip. Lda	02/PDIM- I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	3	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	Esa-Un	RDTL:74/GMTAC/X/II 2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																
							Actual																																
	4	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilmano	Surprise Unip. Lda	07/PDIM- I/MNTT/VIII/2016	PDIM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																
							Actual																																
	5	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba PE Rembor	MEJD PKRIE PE REMBOR	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	6	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Bahadik	MEJD PKRIE EBF BAHADIK	00	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note: Plano Periode inspesaun iha tereinu Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

 (Adonis Julio Fernandes)
 Eng. Electricidade, ADN, I.P

Sertifika Husi :

 (Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenador da Unidade de Controló e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P


Aprova Husi :

 (Eng. Januario Maia Guterres)
 Adjunto Director Executivo, ADN, I.P

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	SETEMBRO																														OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LACLUBAR (LAC)	1	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu
Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu
Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili
Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

 (Adonis Julio Fernandes)
 Eng. Electricidade, ADN, I.P

Certifica Husi :

 (Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :

 (Eng. Januario Maia Guterres)
 Adjunto Director Executivo, ADN, I.P

PLANU INSPESAUN

[illegible]



[Handwritten signature]



2022



[illegible]

Município / Posto	No.	Nómen do Projeto	Nómen da Companhia	No Contrato	Categoria	Descrição do Projeto	Setembro																													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	18	Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of Municipio Roads Package 7 : Selo - Aileu to Gleno - Ermera (162)	Raya Konsultant LDA	MPW- Cs 2000020	LM	MOP	Plan																													
							Actual																													
	19	Preparation of Detail Engineering & Bidding Dokument Preparation for New Bridges in 2019 suco Liurai maubara 1 Bera Railako, Sanfuk, tutu luru same fahi nehan	Lelo eng. Unip Lda Jv, Pt Multi Karid - Guna Jara & PT. Cipta Design Indonesia	MPW-Cs -2000032	LM	MOP	Plan																													
							Actual																													
	20	Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of Municipio Roads Package 2 : Utulari - laisorulai	Bratopul Unip Lda	MPW-CS -2000025	LM	MOP	Plan																													
							Actual																													
	21	For Preparation of detailed engineering for Rehabilitation of Municipios Roads Package 12 : Lucá to Lacluta	Hilobadi Jv Pt. Siarplan Utama	MPW - CS- 2000022	LM	MOP	Plan																													
							Actual																													
	22	Preparation of Detailed Engineering For Rehabilitation of Municipio Roads Package : 1 JCT A - 16 (bobonaro) to lolotoe Town	Hilobadi Jv Pt. Siarplan Utama	MPW - CS- 2000030	LM	MOP	Plan																													
							Actual																													
	23	preparation of DED for Rehabilitation of Municipio Roads Package 10 : Soibada to Soibada town	Hilobadi Jv Pt. Siarplan Utama	MPW- CS 2000024	LM	MOP	Plan																													
							Actual																													
	24	Preparation of detailed Design for Rehabilitation municipio Roads Package 4 : turiscas to Alas	Wan Husin & Associates SDN BHD Jv Consultant & eng. Intercontinental Unip Lda	MPW- CS 2000028	LM		Plan																													
							Actual																													
25	Preparation Detailed Design for Rehabilitation of Municipios	Detile Consultant	MPW- CS 2000029	LM	MOP	Plan																														
						Actual																														
26	Preparation Detailed Design for Rehabilitation of Municipios	Detile Consultant	MPW- CS 2000027	LM	MOP	Plan																														
						Actual																														
27	Preparation Detailed Design for Rehabilitation of Municipios	Niceles Unip Lda	MPW- CS 2000026	LM	MOP	Plan																														
						Actual																														
28	Preparation of Detailed Engineering & bid Preparation for new Bridge in 2019 package 1 : Samalari, sana utulari- lai sorulai, sumaco (lacluta uma tolu) molas matadoro - RTK, Comoro mota ulun	Vox Da Vinci Consultant Engineering Lda	MPW- CS 2000031	LM	MOP	Plan																														
						Actual																														
29	Preparation Detailed Design for Rehabilitation of Municipios	Team Consultant Jv ATT & ATT & Triangle	MPW- CS 2000021	LM	MOP	Plan																														
						Actual																														
30	Preparation Detailed Design for Rehabilitation of Municipios	Aureum Solis Consultant, Unip Lda Jv PT Bikarna	MPW- CS 2000033	LM	MOP	Plan																														
						Actual																														
31	Preparation Detailed Design for Rehabilitation of Municipios	PT. Bikarna JV Aureum Solis Consultant, Unip Lda	MPW- CS 2000023	LM	MOP	Plan																														
						Actual																														
32	Intersection in the Existing dili liquisia road to conect akses road from tibar Bay Port	TFF Timor Unipessoal Lda	REP/009/MOP/2019	FI	MOP	Plan																														
						Actual																														
33	Preparation Detailed Design for Engineering Desing Dili Urban Roads	Kiat Konsultan				Plan																														
						Actual																														
34	Konsultan Supervisi for Konstruksion Supervision of daradau irigation Schema	PT.Suanda karya Jv KWK	REP/042/MAP/2017	FI	MOP	Plan																														
						Actual																														
35	Supervision Consultant for Construction of Intersection in the Existing Dili-Liquisia Road to Connect Access Road from Tibar Bay port (National Road)	Lelo Unipessoal Lda			LM	MOP	Plan																													
						Actual																														
36	Preparation of Detailed Engineering Design (DED) For New Cable Stayed Bridge Over the Becusse River, in Dili Total Length +	TPT Timor Unip Lda			LM	MOP	Plan																													
						Actual																														
TOTAL PROJETO ON-GOING																																				
Note:							Planu Periode inspesaun iha tereinu Implementa Periode inspesaun iha tereinu Relatorio avaliasuan mensal iha Dili Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu																													
Prepara Husi :							(Eng. Augusta de Costa Ferreira) Eng. PMU ba Projeto (Impréstimo), ADN, I.P.																													
Sertifika Husi :							(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas) Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.																													
Aprova Husi :							(Eng. Januario Maia Guterres) Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.																													

SERVISU BA
KONSULTAN DESIGN
SEI AJUSTA TIUR
PLANO HUSI
PROJECTO NAIN .OU
BAZEIA BA
DOKUMENTOS
KONSULTAN NIAN
NEBE SUPMETE MAI
HUSI PROJECTO
NAIN.

FHO

Konsultan la serviso ona
iha tereinu,maibe
pagamento seidauk hotu

Konsultan DED



2022

IMPRESTIMO



2022

+

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Setembro																													
								Thu	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	18	Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of Municipio Roads Package 7 : Selo - Aileu to Gleno - Ermera (162)	Raya Konsultan LDA	MPW- Cs 2000020	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	19	Preparation of Detail Engineering & Bidding Dokument Preparation for New Bridges in 2019 suco Liurai maubara I Bera Railako, Sanfuk, tutu luru same fahi nehan	Lelo eng. Unip Lda Jv. Pt. Multi Karidi - Guna Jasa & PT. Cipta Design Indonesia	MPW-Cs -2000032	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	20	Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of Municipio Roads Package 2 : Uatulari - laisorulai	Bratgojul Unip Lda	MPW-CS -2000025	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	21	For Preparation of detailed engineering for Rehabilitation of Municipios Roads Package 12 : Luca to Lacluta	Hilobadi Jv Pt. Siarplan Utama	MPW - CS- 2000022	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	22	Preparation of Detailed Engineering For Rehabilitation of Municipio Roads Package : 1 JCT A - 16 (bobonaro) to lolotoe Town	Hilobadi Jv Pt. Siarplan Utama	MPW - CS- 2000030	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	23	preparation of DED for Rehabilitation of Municipio Roads Package 10 : Soibada to Soibada town	Hilobadi Jv Pt. Siarplan Utama	MPW- CS 2000024	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	24	Preparation of detailed Design for Rahabilitation municipio Roads Package 4 : turiscat to Alas	Wan Husin & Associates SDN. BHD Jv Consultant & eng. Intercontinental Unip Lda	MPW- CS 2000028	LM		Plan																														
							Actual																														
25	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Detile Consultant	MPW- CS 2000029	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
26	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Detile Consultant	MPW- CS 2000027	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
27	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Niceles Unip Lda	MPW- CS 2000026	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
28	Preparation of Detailed Engineering & bid Preparation for new Bridge in 2019 package 1 : Samalari, sana uatulari- lai sorulai, sumaco (lacluta uma tolu) molas matadoro - RTK, Comoro mota ulun	Vox Da Vinci Consultant Engineering Lda	MPW- CS 2000031	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
29	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Team Consultant Jv. ATT & ATT & Triangle	MPW- CS 2000021	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
30	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Aureum Solis Consultant, Unip Lda Jv PT Bikarna	MPW- CS 2000033	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															
31	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	PT. Bikarna JV Aureum Solis Consultant, Unip Lda	MPW- CS 2000023	LM	MOP	Plan																															
						Actual																															

[illegible]

Município / Posto	No.	Namen Projeto	Namen Companhia	No Contrato	Kategoria	Denom do Projeto		Setembro																													
								Thu	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fri
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	18	Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of Municipio Roads Package 7 : Seloi - Aileu to Gleno - Ermera (162)	Raya Konsultan LDA	MPW- Cs 2000020	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	19	Preparation of Detail Engineering & Bidding Dokument Preparation for New Bridges in 2019 suco Liurai maubara 1 Bera Railako, Sanfuk, tutu luru same fahu nehun	Lelo eng Unip Lda Jv Pt Multi Kuradi - Gona Jasa & PT Cipta Design Indonesia	MPW-Cs -2000032	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	20	Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of Municipio Roads Package 2 : Uatulari - Iansorulai	Braptoul Unip Lda	MPW-CS -2000025	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	21	For Preparation of detailed engineering for Rehabilitation of Municipios Roads Package 12 : Luca to Lacluta	Hilobadi Jv Pt Siarplan Utama	MPW - CS- 2000022	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	22	Preparation of Detailed Engineering For Rehabilitation of Municipio Roads Package : 1 JCT A - 16 (bobonaro) to lolotoe Town	Hilobadi Jv Pt Siarplan Utama	MPW - CS- 2000030	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	23	preparation of DED for Rehabilitation of Municipio Roads Package 10 : Soibada to Soibada town	Hilobadi Jv Pt Siarplan Utama	MPW- CS 2000024	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	24	Preparation of detailed Design for Rahabilitation municipio Roads Package 4 : turisori to Alas	Wan Haim & Associates SDN BHD Jv Consultant & eng- Intercontinental Unip Lda	MPW- CS 2000028	LM		Plan																														
							Actual																														
	25	Preparation Detaled Design for Rahbilitation of Municipios	Detile Consultant	MPW- CS 2000029	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	26	Preparation Detaled Design for Rahbilitation of Municipios	Detile Consultant	MPW- CS 2000027	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	27	Preparation Detaled Design for Rahbilitation of Municipios	Niceles Unip Lda	MPW- CS 2000026	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	28	Preparation of Detailed Engineering & bid Preparation for new Bridge in 2019 package 1 : Samalari, sana uatulari- lai sorulai, sumaco (lacluta uma tolu) molas matadero - RTK, Comoro mota ulun	Vox Da Vinci Consultant Engineering Lda	MPW- CS 2000031	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	29	Preparation Detaled Design for Rahbilitation of Municipios	Team Consultant Jv ATT & ATT & Triangle	MPW- CS 2000021	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	30	Preparation Detaled Design for Rahbilitation of Municipios	Aurecam Sols Consultant, Unip Lda Jv PT Bikarna	MPW- CS 2000033	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	31	Preparation Detaled Design for Rahbilitation of Municipios	PT Bikarna JV Aurecam Sols Consultant, Unip Lda	MPW- CS 2000023	LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	32	Intersection in the Existing dili liquisa road to conect akses road from tibar Bay Port	TPT Timor Unipessoal Lda	REP009/MOP/2019	FI	MOP	Plan																														
							Actual																														
	33	Preparation Detaled Design for Enginnering Desing Dili Urban Roads	Kiat Konsultan				Plan																														
							Actual																														
	34	Konsultan Supervisei for Konstruksion Supervision of daradau irigation Schema	PT Suanda karya Jv KWK	REP/042/MAP/2017	FI	MOP	Plan																														
							Actual																														
	35	Supervision Consultant for Construction of Intersection in the Existing Dili-Liquisa Road to Connect Access Road from Tibar Bay port (National Road)	Lelo Unipessoal Lda		LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
	36	Preparation of Detailed Engineering Design (DED) For New Cable Stayed Bridge Over the Becussa River, in Dili Total Length +	TPT Timor Unip Lda		LM	MOP	Plan																														
							Actual																														
TOTAL PROJETO ON-GOING																																					

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspeaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :

(Eng. Vidal Guterres)
Eng. PMU ba Projetu (Imprestimo), ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.

SERVISU BA KONSULTAN DESIGN SEI AJUSTA TUIR PLANO HUSI PROJECTO NAIN .OU BAZEIA BA DOKUMENTOS KONSULTAN NIAN NEBE SUPMETE MAI HUSI PROJECTO NAIN.

FHO

Konsultan la serviso ona iha tereno,maibe pagamento seidauk hotu

Konsultan DED
