



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU AILEU


AGOSTO 2022



SUMÁRIO
RELATÓRIO
IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO
AILEU
AGOSTO 2022

Prepara Husi :


(Eng. Merinho Guco Lopes de Araújo)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Aileu ADN, I.P


(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Município Aileu ADN, I.P


(Eng. Celvio J. Alves)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Aileu ADN, I.P


(Eng. Rui Lopes)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Aileu ADN, I.P

Verifica Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigação, ADN, I.P


(Deolindo de F. Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN,

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	1
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	4
1.2 Perfil Municipio Aileu	4
1.3. Lista Projectos.....	6
II. PROGRESU FISIKU	19
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan.....	19
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	19
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	19
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	20
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	20

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Aileu.....	5
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Aileu	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Aileu Por Fundus Finansiamientos	6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Aileu Por Sectores.....	9
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Aileu Por Ministerio.....	14
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Aileu	18

I. INTRODUSAUN


1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN,I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Presidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN,I.P nian maka atu asegu katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekretu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN,I.P hanesan insituto Público (IP), ADN,I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizasaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liu husi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria.

1.2 Perfil Municipio Aileu

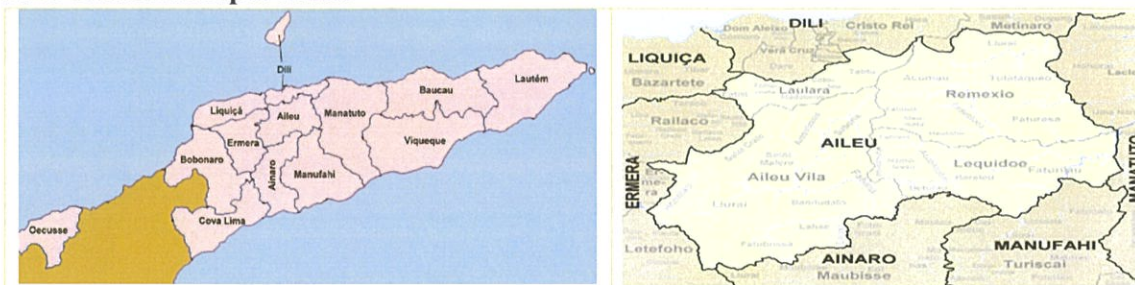

Administrasaun Munisipal Aileu lokalizadu iha parte sul Dili, kapital paiz no mapa 1 hatudu pozisaun jeografika Munisipiu Aileu ne'ebé ho luan hamutuk 729 km² ho populasaun ema na'in 44,325 no densidade demografika ema 50.6 ba km², tuir Sensus 2015. Topografia Munisipiu Aileu ne'ebé foho dominante liu ho a'as entre 350 m to'o 1,500 m sukat husi tasi. Kapital maka Aileu Vila iha foho Mota Mantane ho altitude 913 m. Administrasaun Munisipal Aileu iha Postos Administrativos 4, Sukus 31 no aldeias 139.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos No Aldeias

Aileu villa		Laulara		Lequidoe		Remexio	
Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Aissirimou	5	Fatise	5	Aculitoho	3	Acumau	3
Bandudato	3	Cotolau	5	Bereleu	5	Fadabloco	7
Fahiria	6	Madabeno	5	Betulau	3	Fahisoi	3
Fatubossa	7	Talitu	4	Fahisoi	3	Faturas	4
Hoholau	5	Tohumeta	3	Faturilau	2	Hautoho	3
Lahane	5	-	-	Manucasa	2	Suco Liurai	3
Lausi	4	-	-	Namolesso	4	Maumeta	3
Suco Liurai	8	-	-	-	-	Tulataqueo	7
Seloi Malere	6	-	-	-	-	-	-
Saburia	3	-	-	-	-	-	-
Seloi Craik	10	-	-	-	-	-	-
Total	62	-	22	-	22		33

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 17

Tabela 1.1 : Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Aileu

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Aileu								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		3				3	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
Total			4				4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Aileu

ASET ADN, I.P MUNICIPIO AILEU								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	
2	Kareta		1				1	
3	Desktop HP / Monitor		1				1	
4	Laptop HP		1				1	Port ba USB fatin la diak , operasaun labtop Todan
5	Printer Cannon		1				1	
6	UPS		1				1	
7	Armario File		2				1	
8	Armario Tau hena		3				3	
9	Meja escritorio		1				1	
10	Meja han		1				1	
11	Meja TV (kiik)		1				1	
12	Kadeira escritorio		4				4	
13	Kadeira han		4				4	
14	Sofa		1 Set				1	
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3		3 Set				1	Springbed ida Nakles, Sumaso la Iha ba Kuarto Tolu
16	Jeleira		1				1	

17	TV + Parabola		1 Set				1	Reciver hosi Parabola la Utilija
18	Kipas Angin		5				5	Ida Kondisaun att
19	Kompor		1				1	
20	Kompor Gas		1				1	Kondisaun Att no labele uja
21	Rack sepatu		3				3	
22	Rack Piring		1				1	
23	Lampu		11				11	Rua mak att, nebe monta iha Veranda Uma oin no Veranda Kotuk ho Marka Philip
24	Water Pump Sanyo		1				1	

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumulá iha lista neé bazeia ba dados projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Aileu Por Fundus Finansiamento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + LM - BS + LM - TP + Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	39	\$ 20,535,155.45	56.02%
2	Laulara	10	\$ 33,293,260.73	64.30%
3	Lequidoe	13	\$ 2,717,699.94	41.76%
4	Remexio	5	\$ 3,471,704.86	34.51%
Grand Total		67	\$ 60,017,820.98	58.72%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	12	\$ 15,626,577.13	64.76%
2	Laulara	7	\$ 32,987,141.18	64.29%
3	Lequidoe	1	\$ 240,048.46	84.76%
4	Remexio	1	\$ 2,567,345.51	34.72%
Grand Total		21	\$ 51,421,112.28	63.05%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	8	\$ 2,425,653.48	27.24%
2	Laulara	3	\$ 306,119.55	65.57%
3	Lequidoe	7	\$ 1,533,192.16	35.61%
4	Remexio	1	\$ 225,714.76	0.00%
Grand Total		19	\$ 4,490,679.95	31.34%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	5	\$ 316,902.42	0.00%
2	Laulara			
3	Lequidoe	1	\$ 128,221.80	0.00%
4	Remexio			
Grand Total		6	\$ 445,124.22	0.00%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	2	\$ 522,720.63	38.39%
2	Laulara			
3	Lequidoe	1	\$ 550,800.00	70.00%
4	Remexio	1	\$ 494,544.48	62.04%
Grand Total		4	\$ 1,568,065.11	56.95%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	9	\$ 1,167,916.80	18.58%
2	Laulara			
3	Lequidoe	3	\$ 265,437.52	0.00%
4	Remexio	2	\$ 184,100.11	0.00%
Grand Total		14	\$ 1,617,454.43	13.42%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundu-Covid-19		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu-Vila	3	\$ 475,384.99	64.46%
2	Laulara			
3	Lequidoe			
4	Remexio			
Grand Total		3	\$ 475,384.99	64.46%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Aileu Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO AILEU		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO	2	\$ 862,274.82	8.64%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	6	\$ 1,352,303.90	31.90%
3	EDUKASAUN	13	\$ 1,313,542.97	0.00%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 1,001,069.36	75.97%
5	ESTRADAS	16	\$ 18,509,629.40	78.63%
6	ESTRADAS E PONTES	6	\$ 1,654,267.41	0.00%
7	FLOOD CONTROL	3	\$ 137,301.98	0.00%
8	IMPRESTIMO	4	\$ 31,371,351.03	56.24%
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	\$ 1,320,533.03	56.62%
10	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS	2	\$ 1,025,800.00	53.89%
11	SAUDE	3	\$ 494,193.39	33.86%
12	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 505,151.90	0.00%
13	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	57.18%
14	TURISMO	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		67	\$ 60,017,820.98	58.72%

NO	SECTOR PROJECTO	Aileu-Vila		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO	2	\$ 862,274.82	8.64%
2	EDIFICIOS PUBLICOS	5	\$ 1,224,082.10	35.24%
3	EDUKASAUN	8	\$ 864,005.34	0.00%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
5	ESTRADAS	4	\$ 899,496.25	59.82%
6	ESTRADAS E PONTES	6	\$ 1,654,267.41	0.00%
7	FLOOD CONTROL	3	\$ 137,301.98	0.00%
8	IMPRESTIMO	3	\$ 12,531,861.82	76.85%
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	\$ 717,064.23	41.26%
10	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS	1	\$ 475,000.00	35.21%
11	SAUDE	2	\$ 194,247.81	27.49%
12	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 505,151.90	0.00%
13	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	57.18%
14	TURISMO	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		39	\$ 20,535,155.45	56.02%

NO	SECTOR PROJECTO	Laulara		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			
2	EDIFICIOS PUBLICOS			
3	EDUKASAUN			
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 761,020.90	73.19%
5	ESTRADAS	6	\$ 13,652,436.58	93.89%
6	ESTRADAS E PONTES			
7	FLOOD CONTROL			
8	IMPRESTIMO	1	\$ 18,839,489.21	42.53%
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	1	\$ 40,314.04	49.04%
10	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS			
11	SAUDE			
12	SEGURANCA NO DEFESA			
13	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
14	TURISMO			
Grand Total		10	\$ 33,293,260.73	64.30%

NO	SECTOR PROJECTO	Lequidoe		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			
2	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 128,221.80	0.00%
3	EDUKASAUN	3	\$ 265,437.52	0.00%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 240,048.46	84.76%
5	ESTRADAS	3	\$ 670,091.82	0.00%
6	ESTRADAS E PONTES			
7	FLOOD CONTROL			
8	IMPRESTIMO			
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	3	\$ 563,154.76	76.72%
10	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS	1	\$ 550,800.00	70.00%
11	SAUDE	1	\$ 299,945.58	37.98%
12	SEGURANCA NO DEFESA			
13	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
14	TURISMO			
Grand Total		13	\$ 2,717,699.94	41.76%

NO	SECTOR PROJECTO	Remexio		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGUA E SANEAMENTO			
2	EDIFICIOS PUBLICOS			
3	EDUKASAUN	2	\$ 184,100.11	0.00%
4	ELETRIFIKASAUN NASIONAL			
5	ESTRADAS	3	\$ 3,287,604.75	36.45%
6	ESTRADAS E PONTES			
7	FLOOD CONTROL			
8	IMPRESTIMO			
9	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN			
10	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS			
11	SAUDE			
12	SEGURANCA NO DEFESA			
13	SOLIDARIEDADE E SOCIAL			
14	TURISMO			
	Grand Total	5	\$ 3,471,704.86	34.51%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Aileu Por Ministerios

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	6	\$ 445,124.22	0.00%
2	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 505,151.90	0.00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	89.19%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	36	\$ 55,235,060.23	61.86%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	14	\$ 1,484,622.27	0.00%
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	35.21%
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	52.04%
8	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 775,330.57	54.21%
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	7.03%
10	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		67	\$ 60,017,820.98	58.72%

NO	DONO DO PROJECTO	Aileu-Vila		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	5	\$ 316,902.42	0.00%
2	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 505,151.90	0.00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	89.19%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	15	\$ 16,630,099.71	63.38%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	9	\$ 1,035,084.64	0.00%
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	35.21%
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	52.04%
8	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 475,384.99	64.46%
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	7.03%
10	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	71.40%
Grand Total		39	\$ 20,535,155.45	56.02%

NO	DONO DO PROJECTO	Laulara		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL			
2	MINISTERIO DA DEFESA			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	10	\$ 33,293,260.73	64.30%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU			
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL			
8	MINISTERIO SAUDE			
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
10	SEFOPE			
	Grand Total	10	\$ 33,293,260.73	64.30%

NO	DONO DO PROJECTO	Lequidoe		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	1	\$ 128,221.80	0.00%
2	MINISTERIO DA DEFESA			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	8	\$ 2,024,095.04	50.44%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	3	\$ 265,437.52	0.00%
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL			
8	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 299,945.58	37.98%
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
10	SEFOPE			
Grand Total		13	\$ 2,717,699.94	41.76%

NO	DONO DO PROJECTO	Remexio		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL			
2	MINISTERIO DA DEFESA			
3	MINISTERIO DA JUSTICA			
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 3,287,604.75	36.45%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 184,100.11	0.00%
6	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA			
7	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL			
8	MINISTERIO SAUDE			
9	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN			
10	SEFOPE			
Grand Total		5	\$ 3,471,704.86	34.51%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus populasaun Munisipiu Aileu

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Poduktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Aileu Vila	28,185	8546	7976	6113	5550
Laulara	8,342	2420	2344	1837	1742
Lequidoe	7,913	2407	2192	1698	1616
Remexio	12,868	3389	3448	3035	2996

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompania sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu porsentagen actual fulan ida ne'e hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare'e iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hare'e #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

1. Iha Municipio Aileu Kompania balun sira nia Enjineiru laiha Terenu, no Enjineiru husi Dono do Projeto mos la activu iha terenu.
2. Komposisi betaun ne'ebe fo husi Laboratorio Nacional maibe bainhira halo trail iha terenu husi kompania kontaktu sira parte Laboratorio Nacional maibe laiha resposta ne'ebe fixu ba iha kompania sira. Maibe liu tiha loron balun husi parte Laboratorio Nacional kontaktu fali sira hodi foti rasik sample.
3. Iha Municipiu Aileu kompania/empreza sira infrenta problema ba rekursu finanseiru nune'e fo inpaktu ba servisu konstrusaun nian hodi difikulta progress servisu iha terenu.
4. Mudansa *Schedule* la tuir kontratu ho razaun pagamentu tarde, situasaun nebe'e ita hotu la espera ho covid-19 nebe'e invade Timor-Leste sai difikuldade mos ba kompania/empreza sira la halo servisu tuir planu refere.
5. Tekniku AND, I.P halo observasaun/monitorizasaun direktamente iha terenu hodi hare'e servisu kompania/empreza sira, maibe sira laiha Site Engineering.
6. Iha projectu balun ne'ebe maka kompania/empreza ladun koopera di'ak ho tekniku AND.IP no tekniku husi Dono projectu, tamba instrusaun nebe'e mak ita fo hanesan

prepara *time schedule* hadia *direksi keet* maibe kompania/empreza la halo tuir orientasaun.

7. Bazeia ba planu inspesaun neébe ami halo balun nia implementasaun la tuir planu nebe'e mak aprova husi DE. AND.IP, tamba iha difikuldade transporte, maibe ami nafatin tenta ka fahe tempo hodi halo monitorizasaun ba projetu hotu neébe iha Municpiu Aileu.
8. Ba projectu neébe mak abandona no parado ami halo monitorizasaun dala 2 tamba laiha progresu fiziku neébe mak halo iha terenu tuir planu ne'ebe tekniku AND.IP halo Monitorizasaun.

➤ Obstacle parte Eletricidade

1. Durante halo monitorizasaun ba projetu neébe mak mensiona iha lista projetu Eng. M & E, ADN – I.P, la hasoru kontraktor sira tamba televomel fora da area hotu.
2. Eng. M & E, ADN – I.P, nunka hasoru tekniku husi kompania no parte kompania sempre delega tekniku neébe ba hein iha terenu, maibe tekniku neé rasik laiha konesimentu klean ho orbra refere.
3. Seksaun M & E, ADN – I.P, labele kontrola projetu ho maximu tamba Eng. M & E ida hodi
kontrola Projeito Linha Electricidade ho Edifisio Publik Iha Municipio Ha'at (4).
4. Projeto eletricidade barak maka espasu ba lina laiha ona, hodi kompanha sira mos la halo servisu kontinuasaun.
5. Motorista menus difikulta ami nia servisu.

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu


1. Husu Superior ADN.IP atu bele hatu'o ba projectu nain konaba projetu hirak ne'ebe maka abandona no parado husi kompania/empreza ne'ebe iha responsabilidade ba projectu ne'e rasik atu bele foti medidas ruma hanesan *Black list* ou Penalidade ba kompania.

2. Ami husi tekniku/engineiru Municipiu AND.IP husu ba Dono Projectu refere, ba oin kompania/empreza ne'ebe maka laiha responsabilidade no abandona projetu/obra ne'ebe sira halo, husu Governo labela fo tan oportunidade ba kompania hirak ne'e hodi kaer fali obra seluk.
3. Ami husi Engineiru Municipiu AND.IP sujere ba superior AND.IP atu bele prepara transporte hanesan motorizada hodi nune'e bele fasilita ami halo monitorizasaun ba projectu ne'ebe ho nia lokalizasaun besik.

➤ **Recomendação parte Eletricidade**

1. Husu ba parte ITC, ADN – I.P bele kria Folder Sistem ba Seksaun M & E, ADN – I.P.
2. Husu atu aumenta tan rekursu iha Seksaun M & E, ADN – I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Aileu

Força de Trabalho ADN, I.P Municipio Aileu						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engineiro	Celvio J. Alves	108	Enjineiru ITI		
		Merinho Cuco L. de Araujo	189	Enjineiru EPAS		
		Rui Lopes	077	Enjineiru ITI		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		

2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	João Pedro Cortereal		Motorista		



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL AGOSTO)

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL AGOSTO)																
LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	Rehabilitation of Sloi Tocoluli roads Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/061/MOPTK-2015	\$ 218,231.77	Nov. 14, 2014	100.00%	88.00%	\$ 192,043.96	\$ 26,187.81	PENDENTE	Projeito refere falta 10% rekomendasaun ikus iha tinan 2019
2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforleu - Koihoho Chainage 0+000 - 8+000 Munisipiu Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Aileu-Vila	Aileu	Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Sunnines Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	\$ 717,064.23	Dec. 20, 2019	47.95%	41.26%	\$ 295,880.00	\$ 421,184.23	ON-GOING	
3	Consultant Design & Supervision Lot 3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Katahira and Engineers International	SSS/043/MPW-2014	\$ 4,069,793.04	Sept. 15, 2014	80.11%	80.11%	\$ 3,260,234.80	\$ 809,558.24	ON-GOING	
4	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd JV with Dongsung Engineering Co.,Ltd	RFP/020/MOPTC/2017	\$ 2,626,077.78	April 27, 2018	62.57%	62.57%	\$ 1,643,162.72	\$ 982,915.06	ON-GOING	
5	Emergency Drainage and Slope Protection Along Aileu to Maubisse Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	My Friend Unip. Lda	MPW-W-014054	\$ 251,677.07	Oct. 5, 2014	100.00%	90.49%	\$ 227,750.76	\$ 23,926.31	ON-GOING	
6	Rehabilitation of MSS Office in Aileu	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-BS	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Borudo Matak	RDTL:47/MSS/DNPFAL-DAD/X/2016	\$ 47,720.63	Oct. 24, 2016	77.74%	69.97%	\$ 33,389.23	\$ 14,331.40	PENDENTE	
7	Programma Turismo Komunitario 2014 Seloi / Malere	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Aileu-Vila	Aileu	Miror Raefusa	RDTL/SEFOPE/DNA/DNE/2013-0003	\$ 303,911.46	May 5, 2014	91.20%	71.40%	\$ 217,004.28	\$ 86,907.18	PENDENTE	
8	Preparation of Master Plan For Municipal Capitals Water Supply and Sanitation (Aileu-Gleno-Liquica) /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	MPW-CS-200028	\$ 827,410.00	May 1, 2020	10.00%	9.00%	\$ 74,466.90	\$ 752,943.10	ON-GOING	
9	Realization of the Detailed Engeneering Design (DED) includes Reparation of Feasibility Study of the University of Aileu (Bem Serviso)	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Aileu-Vila	Aileu	Bernabad Arquitectura SLP	MPW-S-200024	\$ 475,000.00	March 31, 2020	35.21%	35.21%	\$ 167,261.25	\$ 307,738.75	ON-GOING	Ongoing
10	New Construction of laboratory for covid 19 at CHC Aileu Vila	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	Jomy Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-257	\$ 62,128.32	Nov. 4, 2020	95.51%	85.95%	\$ 53,402.35	\$ 8,725.97	FHO	
11	Konstrusaun, Vedasaun no Jardim ba Edificio DTPSC	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kablaki Engineering Unip. Lda		\$ 200,000.00	1-Jul-12	89.19%	89.19%	\$ 178,371.29	\$ 21,628.71	PENDENTE	
12	Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Philcoei International, Inc. In JV with Luis and Associates, Co	nn	\$ 5,835,991.00	Jan. 18, 2013	83.00%	81.01%	\$ 4,727,833.53	\$ 1,108,157.47	ON-GOING	
13	Konstrusaun Fatin isolamentu iha Municipio Aileu, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-255	\$ 281,137.18	Nov. 04, 2020	100.00%	90.00%	\$ 253,023.47	\$ 28,113.71	PHO	
14	New Construction of Campas, Gate And Leveling	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Caramé Unip. Lda	No.: 37/MACLN/IX/2021	\$ 118,769.70	1-Sep-21	65.92%	52.04%	\$ 61,804.39	\$ 56,965.31	ON-GOING	
15	Konstrusaun salas de aulas 3 + Eskritorio + Laboratorio ESTV Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	NCB:01MEJD/DNA/2021	\$ 171,079.30	Dec 3.2021	54.91%	0.00%	\$ -	\$ 171,079.30	ON-GOING	
16	New Cosntruction Office CSS Aileu District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kevina Unip.Lda	33/MSS/DGAF/DNA/XI/2021	\$ 427,130.00	Nov. 22, 2021	16.40%	0.00%	\$ -	\$ 427,130.00	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL AGOSTO)

NU.	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	LOKALIZASAUN PROJETO		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU										
17	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBC 3 Ciclo Selei	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBC 3 CICLO SELOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 152,044.11	Oct. 15, 2021	26.60%	0.00%	\$ -	\$ 152,044.11	ON-GOING	
18	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EPE Mantane	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EPE MANTANE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 84,628.13	Oct. 15, 2021	25.12%	0.00%	\$ -	\$ 84,628.13	ON-GOING	
19	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBF Lacio	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF LACLO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,597.13	Oct. 15, 2021	24.10%	0.00%	\$ -	\$ 99,597.13	ON-GOING	
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Pre-Escolar Cotobauro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE PRE-ESCOLAR COTABAURU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 83,516.10	Oct. 15, 2021	36.09%	0.00%	\$ -	\$ 83,516.10	ON-GOING	
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Teblor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF TEBLOR	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 102,494.43	Oct. 15, 2021	40.29%	0.00%	\$ -	\$ 102,494.43	ON-GOING	
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Darahe	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF DARAHE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,770.22	Oct. 15, 2021	28.58%	0.00%	\$ -	\$ 99,770.22	ON-GOING	
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESGAM Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE ESGAM AILEU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 140,545.78	Oct. 15, 2021	26.82%	0.00%	\$ -	\$ 140,545.78	ON-GOING	
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 101,409.44	Oct. 15, 2021	28.60%	0.00%	\$ -	\$ 101,409.44	ON-GOING	
25	R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli-Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	\$ 89,757.77	Oct. 1, 2021	45.21%	0.00%	\$ -	\$ 89,757.77	ON-GOING	
26	R4D Rural Road Spot Improvement Kirelo - Lacio Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Fikikay Unipessoal, Lda	MOP-W-NCB-21025	\$ 339,829.64	Oct. 1, 2021	63.98%	34.81%	\$ 118,294.10	\$ 221,535.54	ON-GOING	
27	New Construction of Fence at CSI Aileu-Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	BEHALE ENTERPRICE UNIPESSOAL, LDA	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230	\$ 132,119.49	Jan. 14, 2022	77.16%	0.00%	\$ -	\$ 132,119.49	ON-GOING	
28	Consulting services for detailed architecture & engineering design of master plan and new campos the national defence institute	MINISTERIO DA DEFESA	FI	SEGURANCA NO DEFESA	Aileu-Vila	Aileu	PT. Perentjana Djaja	SSS/0111/IDN-2014	\$ 505,151.90	Aug. 18, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 505,151.90	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL AGOSTO)

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL AGOSTO)																
					LOKALIZASAUN PROJETU											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
29	Rehabilitasaun Estrada Rural,Aituhularan - Manufoni,Aileu 0+000-1+000 (1.0Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Hatutan Moris Unipessoal Lda	RT/088/MOP-2021	\$ 98,575.19	9-May-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 98,575.19	ON-GOING	
30	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	LNG Unipessoal, Lda Jv Star King Construction Unipessoal, Lda	RT/139/MOP-2021	\$ 252,415.36	27-Apr-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 252,415.36	ON-GOING	
31	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 2+000-5+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/090/MOP-2021	\$ 353,952.41	28-Apr-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 353,952.41	ON-GOING	
32	Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 5+000-8+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/091/MOP-2021	\$ 376,198.79	28-Apr-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 376,198.79	ON-GOING	
33	Rehabilitasaun Estrada Rural, seloi Kraik-Halmate, Aileu (3.5Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	RT/092/MOP-2021	\$ 304,850.97	1-May-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 304,850.97	ON-GOING	
34	Rehabilitasaun Estrada Rural,Raimansu - Fatubesi,Aileu (5.20Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	RACO LDA.	RT/093/MOP-2021	\$ 268,274.69	1-May-22	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 268,274.69	ON-GOING	
35	Perfurasau Bee Mos Iha Seloi Ba Fatim Turismo Komunitariu	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Alenta Unip. Lda	48/SMA/AM-AIL/VIII/2021	\$ 34,864.82	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 34,864.82	ON-GOING	
36	Rehabilitasaun irigasaun Lagoa Seloi kraik incluindo Konstrusaun bareira de proteasaun in gabion	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	Alenta Unip. Lda	004/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 26,311.39	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 26,311.39	ON-GOING	
37	Konstrusaun Edifisiu Posto Administrativu Aileu Vila	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Diborna Unip. Lda	001/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 144,735.62	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 144,735.62	ON-GOING	
38	Konstrusaun Bronjong Proteje Uma Comunidade no Uma Madres Caridade Inklui Toós Comunidade	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	JOHIJEMAR Unip,Lda	005/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 61,880.06	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 61,880.06	ON-GOING	
39	Konstrusaun Bronjong Proteje Igreja Assembleia de Deus no Uma Comunidade	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	Padua Unip. Lda	006/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 49,110.53	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 49,110.53	ON-GOING	
40	New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Laulara	Aileu	Aldepo Murak Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162	\$ 462,154.02	Aug. 22, 2013	81.19%	73.07%	\$ 337,695.10	\$ 124,458.92	PENDENTE	Progresu Fisiku nafatin deit tamba laiha ona espasu atu kontinua tan obra ne'e.
41	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku to Besilau and Fatuk Hun - Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Laulara	Aileu	osxavijoneli unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000179	\$ 298,866.88	Aug. 22, 2013	81.53%	73.38%	\$ 219,311.16	\$ 79,555.72	PENDENTE	Progresu Fisiku nafatin deit tamba laiha ona espasu atu kontinua tan obra ne'e.
42	Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Mejori, Lda	SSS/0103/MOPTC-2016	\$ 4,451,281.98	Sept. 5, 2016	98.97%	85.23%	\$ 3,793,986.33	\$ 657,295.65	ON-GOING	
43	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemós - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 0+000 - Sta. 2+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Aspalink Unip Lda	SSS/120/MOPTC-2015	\$ 4,128,651.62	Dec. 11, 2015	100.00%	99.35%	\$ 4,101,692.64	\$ 26,958.98	FHO	FHO iha Fulan Março 2022



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL AGOSTO)

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL AGOSTO)																
NU.	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	LOKALIZASAUN PROJETO		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU										
44	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemós - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 2+800 - Sta. 6+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/121/MOPTC-2015	\$ 4,645,457.43	Dec. 11, 2015	100.00%	98.99%	\$ 4,598,764.07	\$ 46,693.36	FHO	FHO iha Fulan Março 2022
45	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laulara	Aileu	CINA WU YI CO.LTD	ICB/018/MOPTC-2017	\$ 18,839,489.21	May 31, 2019	79.61%	42.53%	\$ 8,012,695.11	\$ 10,826,794.10	ON-GOING	Responsavel Eng. ADN Impristimo
46	Rural Roads Maintenance Fahisohi - Fadabloco Sta 0+000-8+200, Hotoho - Liquica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ormai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laulara	Aileu	Remexio Furak Unip Lda	MPWTC-CD-170004	\$ 40,314.04	July 20, 2017	100.00%	49.04%	\$ 19,768.44	\$ 20,545.60	ON-GOING	Rekomendasun Ikus 2018
47	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Fin Los unip.lda	MPW-W190086	\$ 225,977.27	Aug. 16, 2019	88.97%	80.07%	\$ 180,944.94	\$ 45,032.33	ON-GOING	
48	Laulara Solerema Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Marino Enterprises, Lda	SSS/115/MOPTC-2017	\$ 161,240.04	Sept. 7, 2017	100.00%	88.85%	\$ 143,267.06	\$ 17,972.98	PHO	Projeito refere Atinji progreso 100% baseia ba Rekomendasun ikus 2017. no agora Projeito Impristimo mak halo fali konstrusaun foun
49	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Laulara	Aileu	Emmanuel Milenial	MOP-CD-RFQ-21013	\$ 39,828.24	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 39,828.24	ON-GOING	
50	Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 -10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS E PONTES	Remexio	Aileu	Nautetu I, II Unipessoal Lda	MPW-W-1900081	\$ 494,544.48	Aug. 16, 2019	72.09%	62.04%	\$ 306,821.03	\$ 187,723.45	ON-GOING	
51	Road Rehabilitation of Remexio to Lacio Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Remexio	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	\$ 2,567,345.51	Sept. 12, 2017	43.26%	34.72%	\$ 891,434.87	\$ 1,675,910.64	ON-GOING	
52	Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Remexio	Aileu	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	\$ 225,714.76	18-Jun-21	22.23%	0.00%	\$ -	\$ 225,714.76	ON-GOING	
53	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 77,252.65	Oct. 15, 2021	18.95%	0.00%	\$ -	\$ 77,252.65	ON-GOING	
54	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 106,847.46	Oct. 15, 2021	22.22%	0.00%	\$ -	\$ 106,847.46	ON-GOING	
55	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Lequidoe	Aileu	Cadila Supplie Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000163	\$ 240,048.46	Aug. 22, 2013	94.17%	84.76%	\$ 203,456.68	\$ 36,591.78	PENDENTE	Progresu Fisiku nafatin deit tamba laiha ona espasu atu kontinua tan obra ne'e.



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL AGOSTO)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	LOKALIZASAUN PROJETU		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU										
56	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bereleu manucasa Package 2 Sta. 3+500-13+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Seiara Irapiti Unip. Lda	MPWTC-W-015016	\$ 248,750.72	Sept. 7, 2015	97.45%	87.70%	\$ 218,159.90	\$ 30,590.82	PHO	Projeito refere Atinji deit progreso 97.45% baseia ba Rekomendasaun ikus 2017. no agora Projeito Impristimo mak halo fali konstrusaun foun
57	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 8+200, Namalesu - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hautoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	\$ 171,685.42	Aug. 21, 2019	76.31%	58.18%	\$ 99,884.64	\$ 71,800.78	ON-GOING	
58	Rural Roads Periodic Maintenance Aituhaularan - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula Udo Kirlelo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	\$ 142,718.62	Nov. 25, 2019	98.30%	79.86%	\$ 113,980.68	\$ 28,737.94	ON-GOING	
59	For Preparation of Detailed Engineering Design For Rehabilitation of "municipio Roads" Package 8 : (Be' Cluru) to Lequidoe Town (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Lequidoe	Aileu	Team Consulting Engineering & Management Co., Ltd JV ATT Consultants Co., Ltd & Triangle Architech Consultant., Lda	MPW-CS-2000021	\$ 550,800.00	March 26, 2020	70.00%	70.00%	\$ 385,560.00	\$ 165,240.00	ON-GOING	
60	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Faturilau, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	SAUDE	Lequidoe	Aileu	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	\$ 299,945.58	Sept. 6, 2021	72.80%	37.98%	\$ 113,916.92	\$ 186,028.66	ON-GOING	
61	R4D Rural Road Spot Improvement Namalesu-Faturilau Chainage 0+000-14+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-210149	\$ 411,620.44	Sept. 21, 2021	45.98%	0.00%	\$ -	\$ 411,620.44	ON-GOING	
62	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 117,171.14	Oct. 15, 2021	33.43%	0.00%	\$ -	\$ 117,171.14	ON-GOING	
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Urdadan	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 73,988.60	Oct. 15, 2021	45.31%	0.00%	\$ -	\$ 73,988.60	ON-GOING	
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 74,277.78	Oct. 15, 2021	43.42%	0.00%	\$ -	\$ 74,277.78	ON-GOING	
65	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Lequidoe	Aileu	Blackbird Unip. Lda JV Chaicallala Unip. Lda	MOP-CD-NCB-21026	\$ 186,084.05	Oct. 1, 2021	11.24%	0.00%	\$ -	\$ 186,084.05	ON-GOING	
66	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi-Dairlouta Chainage 0+000 - 5+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Lequidoe	Aileu	Raco Lda.	MOP-CD-RFQ-21012	\$ 72,387.33	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 72,387.33	ON-GOING	
67	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lequidoe	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lequidoe	Aileu	Fitun Foun, Unip Lda	002/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 128,221.80	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 128,221.80	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AILEU (LISTA GERAL AGOSTO)

					LOKALIZASAUN PROJETU											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
TOTAL									\$ 60,017,820.98			58.72%	\$ 35,245,262.60	\$ 24,772,558.38		

Prepara Husi :


(Eng. Celvino J. Alves)
Engenheiro ba Projetu Insfrastuctura, Transportes e Irigasaun
Municipio Aileu,
ADN, I.P.


(Eng. Rui Lopes)
Engenheiro ba Projetu Insfrastuctura, Transportes e Irigasaun
Municipio Aileu,
ADN, I.P.


(Eng. Merinho Cuco L. de Araujo)
Eng. ba Edificio Publiku no Be'e Saneamento
Municipio Aileu
ADN, I.P.


(Silvino L. R. R. Soares)
Eng. M & E, Munisipiu Aileu, ADN, I.P.

Sertifika Husi :


(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											AGOSTO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
1	Rehabilitation of Sloi Tocoluli roads Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/061/MOPTK-2015	\$ 218,231.77	Nov. 14, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000 Munisipiu Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Aileu-Vila	Aileu	Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Sunnines Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	\$ 717,064.23	Dec. 20, 2019	47.95%	0.00%	47.95%
3	Consultant Design & Supervision Lot 3	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Katahira and Engineers International	SSS/043/MPW-2014	\$ 4,069,793.04	Sept. 15, 2014	80.11%	0.00%	80.11%
4	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd JV with Dongsung Engineering Co.,Ltd	RFP/020/MOPTC/2017	\$ 2,626,077.78	April 27, 2018	62.57%	0.00%	62.57%
5	Emergency Drainage and Slope Protection Along Aileu to Maubisse Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	My Friend Unip. Lda	MPW-W-014054	\$ 251,677.07	Oct. 5, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
6	Rehabilitation of MSS Office in Aileu	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-BS	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Borudo Matak	RDTL:47/MSS/DNPFAL-DAD/X/2016	\$ 47,720.63	Oct. 24, 2016	77.74%	0.00%	77.74%
7	Programma Turismo Komunitario 2014 Selo / Malere	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Aileu-Vila	Aileu	Miror Raefusa	RDTL/SEFOPE/DNA/DNE/2013-0003	\$ 227,981.87	May 5, 2014	91.20%	0.00%	91.20%
8	Preparation of Master Plan For Municipal Capitals Water Supply and Sanitation (Aileu-Gleno-Liquica) /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	MPW-CS-200028	\$ 827,410.00	May 1, 2020	10.00%	0.00%	10.00%
9	Realization of the Detailed Engineering Design (DED) includes Reparation of Feasibility Study of the University of Aileu (Bem Serviso)	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Aileu-Vila	Aileu	Bernabad Arquitectura SLP	MPW-S-200024	\$ 475,000.00	March 31, 2020	35.21%	0.00%	35.21%
10	New Construction of laboratory for covid 19 at CHC Aileu Vila	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	Jomy Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-257	\$ 62,128.32	Nov. 4, 2020	95.51%	0.00%	95.51%
11	Konstrusaun, Vedasaun no Jardim ba Edificio DTPSC	Ministerio da Justica	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kablaki Engineering Unip. Lda	004/PDD/DST-AIL/2012	\$ 200,000.00	1-Jul-12	89.19%	0.00%	89.19%
12	Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADA- IMPRESTIMO	Aileu-Vila	Aileu	Philcoei International, Inc. In JV with Luis and Associates, Co		\$ 5,835,991.00	Jan. 18, 2013	83.00%	0.00%	83.00%
13	Konstrusaun Fatin isolamentu iha Municipio Aileu, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-255	\$ 281,137.18	Nov. 04, 2020	100.00%	0.00%	100.00%
14	New Construction of Campas, Gate And Leveling	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	LM-CD	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	Aileu-Vila	Aileu	Caramé Unip. Lda	No.: 37/MACLN/IX/2021	\$ 118,769.70	1/09/2021	65.92%	0.00%	65.92%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											AGOSTO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
15	Konstrusaun salas de aulas 3 + Eskritorio + Laboratorio ESTV Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Mortiles Unip.Lda	NCB:01MEJD/DNA/2021	\$ 171,079.30	Dec 3.2021	46.03%	8.88%	54.91%
16	New Cosntruction Office CSS Aileu District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Kevina Unip.Lda	33/MSSI/DGAF/DNA/XI/2021	\$ 427,130.00	Nov. 22, 2021	15.86%	0.55%	16.40%
17	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBC 3 Ciclo Selo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBC 3 CICLO SELOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 152,044.11	Oct. 15, 2021	26.39%	0.21%	26.60%
18	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EPE Mantane	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EPE MANTANE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 84,628.13	Oct. 15, 2021	25.12%	0.00%	25.12%
19	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba EBF Lacro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF LACLO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,597.13	Oct. 15, 2021	24.10%	0.00%	24.10%
20	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Pre-Escolar Cotobauro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE PRE-ESCOLAR COTABAURU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 83,516.10	Oct. 15, 2021	31.34%	4.75%	36.09%
21	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Teblor	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF TEBLOR	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 102,494.43	Oct. 15, 2021	31.55%	8.73%	40.29%
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Darahe	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF DARAHE	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,770.22	Oct. 15, 2021	27.73%	0.86%	28.58%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba ESGAM Aileu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE ESGAM AILEU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 140,545.78	Oct. 15, 2021	26.82%	0.00%	26.82%
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Aileu-Vila	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 101,409.44	Oct. 15, 2021	24.44%	4.17%	28.60%
25	R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli-Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	\$ 89,757.77		37.99%	7.22%	45.21%
26	R4D Rural Road Spot Improvement Kirelo - Lacro Chainage 0+000 - 11+300, Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Aileu-Vila	Aileu	Fikikay Unipessoal, Lda	MOP-W-NCB-21025	\$ 339,829.64	Oct. 1, 2021	61.17%	2.82%	63.98%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



											AGOSTO 2022		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
27	New Construction of Fence at CSI Aileu-Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Aileu-Vila	Aileu	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230	BEHALE ENTERPRICE UNIPESSOAL,LDA	\$ 132,119.49	Jan. 14, 2022	74.20%	2.97%	77.16%
28	Consulting services for detailed architecture & engineering design of master plan and new campos the national defence institute	MINISTERIO DA DEFESA	FI	SEGURANCA NO DEFESA	Aileu-Vila	Aileu	PT. Perentjana Djaja	SSS/0111/IDN-2014	\$ 505,151.90	Aug. 18, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
29	Rehabilitasaun Estrada Rural,Aituhularan - Manufoni,Aileu 0+000-1+000 (1.0Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Hatutan Moris Unipessoal Lda	RT/088/MOP-2021	\$ 98,575.19	9-May-22	0.00%	0.00%	0.00%
30	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu - kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	LNG Unipessoal, Lda Jv Star King Construction Unipessoal, Lda	RT/139/MOP-2021	\$ 252,415.36	27-Apr-22	0.00%	0.00%	0.00%
31	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu - kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 2+000-5+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/090/MOP-2021	\$ 353,952.41	28-Apr-22	0.00%	0.00%	0.00%
32	Rehabilitasaun Estrada Rural, Taliforleu-kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 5+000-8+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Saksaur Unipessoal, Lda	RT/091/MOP-2021	\$ 376,198.79	28-Apr-22	0.00%	0.00%	0.00%
33	Rehabilitasaun Estrada Rural, seloi Kraik-Halmate, Aileu (3.5Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	Aileu ba Oin Unip. Lda	RT/092/MOP-2021	\$ 304,850.97	1-May-22	0.00%	0.00%	0.00%
34	Rehabilitasaun Estrada Rural,Raimansu - Fatubesi,Aileu (5.20Km)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Aileu-Vila	Aileu	RACO LDA.	RT/093/MOP-2021	\$ 268,274.69	1-May-22	0.00%	0.00%	0.00%
35	Perfurasau Bee Mos Iha Seloi Ba Fatin Turismo Komunitariu	Ministério da Administração Estatal	PDIM	AGUA E SANEAMENTO	Aileu-Vila	Aileu	Alenta Unip. Lda	48/SMA/AM-AIL/VIII/2021	\$ 34,864.82	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
36	Rehabilitasaun irigasaun Lagoa Seloi kraik incluindo Konstrusaun bareira de proteasaun in gabion	Ministério da Administração Estatal	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	Alenta Unip. Lda	004/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 26,311.39	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
37	Konstrusaun Edifisiu Posto Administrativo Aileu Vila	Ministério da Administração Estatal	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Aileu-Vila	Aileu	Diborna Unip. Lda	001/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 144,735.62	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
38	Konstrusaun Bronjong Proteje Uma Comunidade no Uma Madres Caridade Inklui Toós Comunidade	Ministério da Administração Estatal	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	JOHIJEMAR Unip,Lda	005/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 61,880.06	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
39	Konstrusaun Bronjong Protege Igreja Assembleia de Deus no Uma Comunidade	Ministério da Administração Estatal	PDIM	FLOOD CONTROL	Aileu-Vila	Aileu	Padua Unip. Lda	006/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 49,110.53	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
40	New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laulara	Aileu	Aldepo Murak Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000162	\$ 462,154.02	Aug. 22, 2013	81.19%	0.00%	81.19%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



AGOSTO 2022

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
41	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku to Besilau and Fatuk Hun - Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laulara	Aileu	Osxavijoneli unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000179	\$ 298,866.88	Aug. 22, 2013	81.53%	0.00%	81.53%
42	Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Mejori, Lda	SSS/0103/MOPTC-2016	\$ 4,451,281.98	Sept. 5, 2016	98.97%	0.00%	98.97%
43	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemos - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 0+000 - Sta. 2+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Aspalink Unip Lda	SSS/120/MOPTC-2015	\$ 4,128,651.62	Dec. 11, 2015	100.00%	0.00%	100.00%
44	Road Rehabilitation project, Sarlala - Bemos - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 2+800 - Sta. 6+300	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/121/MOPTC-2015	\$ 4,645,457.43	Dec. 11, 2015	100.00%	0.00%	100.00%
45	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laulara	Aileu	CINA WU YI CO.LTD	ICB/018/MOPTC-2017	\$ 17,855,301.27	May 31, 2019	79.61%	0.00%	79.61%
46	Rural Roads Maintenance Fahisohi - Fadabloco Sta 0+000-8+200, Hotoho - Liquica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ormai Sta 0+000 - 7+500 in Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Laulara	Aileu	Remexio Furak Unip Lda	MPWTC-CD-170004	\$ 40,314.04	July 20, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
47	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Fin Los unip.Lda	MPW-W190086	\$ 225,977.27	Aug. 16, 2019	88.97%	0.00%	88.97%
48	Laulara Solerema Roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Marino Enterprises, Lda	SSS/115/MOPTC-2017	\$ 161,240.04	Sept. 7, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
49	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laulara	Aileu	Emmanuel Milenial	MOP-CD-RFQ-21013	\$ 39,828.24	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
50	Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 -10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Nautetu I, II Unipessoal Lda	MPW.W-1900081	\$ 494,544.48	Aug. 16, 2019	72.09%	0.00%	72.09%
51	Road Rehabilitation of Remexio to Lacio Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Mendith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	\$ 2,567,345.51	Sept. 12, 2017	43.26%	0.00%	43.26%
52	Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Remexio	Aileu	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	\$ 225,714.76	18-Jun-21	18.25%	3.98%	22.23%
53	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 77,252.65	Oct. 15, 2021	15.58%	3.37%	18.95%
54	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Remexio	Aileu	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 106,847.46	Oct. 15, 2021	19.86%	2.36%	22.22%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



AGOSTO 2022

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
55	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lequidoe	Aileu	Cadila Supplie Unip,Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN : 0000163	\$ 240,048.46	Aug. 22, 2013	94.17%	0.00%	94.17%
56	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bereleu manucasa Package 2 Sta. 3+500-13+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Seiara Irapiti Unip. Lda	MPWTC-W-015016	\$ 248,750.72	Sept. 7, 2015	97.45%	0.00%	97.45%
57	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 8+200, Nmalesu - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hautoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	\$ 171,685.42	Aug. 21, 2019	76.31%	0.00%	76.31%
58	Rural Roads Periodic Maintenance Aituhaularan - Manufoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daisoli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula Udo Kirlelo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	\$ 142,718.62	Nov. 25, 2019	98.30%	0.00%	98.30%
59	For Preparation of Detailed Engineering Design For Rehabilitation of "municipio Roads" Package 8 : (Be' Cluru) to Lequidoe Town (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	Lequidoe	Aileu	Team Consulting Engineering & Management Co., Ltd JV ATT Consultants Co., Ltd & Triangle Architech Consultant., Lda	MPW-CS-2000021	\$ 550,800.00	March 26, 2020	70.00%	0.00%	70.00%
60	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Faturilau, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	SAUDE	Lequidoe	Aileu	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	\$ 299,945.58	Sept. 6, 2021	71.10%	1.70%	72.80%
61	R4D Rural Road Spot Improvement Nmalesu- Faturilau Chainage 0+000-14+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	LNG Unip. Lda	MPW-W-210149	\$ 411,620.44	Sept. 21, 2021	45.98%	0.00%	45.98%
62	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 117,171.14	Oct. 15, 2021	31.23%	2.20%	33.43%
63	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Ubadan	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 73,988.60	Oct. 15, 2021	38.78%	6.53%	45.31%
64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Lequidoe	Aileu	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 74,277.78	Oct. 15, 2021	34.98%	8.44%	43.42%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AILEU



AGOSTO 2022

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
65	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	Blackbird Unip. Lda JV Chaicallala Unip. Lda	MOP-CD-NCB-21026	\$ 186,084.05	Oct. 1, 2021	0.00%	11.24%	11.24%
66	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi-Dairlouta Chainage 0+000 - 5+000 Aileu Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lequidoe	Aileu	Raco Lda.	MOP-CD-RFQ-21012	\$ 72,387.33	Oct. 1, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
67	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lequidoe	Ministério da Administração Estatal	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lequidoe	Aileu	Fitun Foun, Unip Lda	002/MAE/AM-AIL/SMA/IX/2021	\$ 128,221.80	Aug. 6, 2021	0.00%	0.00%	0.00%

Prepara Husi :

Verifika Husi :

(Eng. Celvino Alves)
Engineiro ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun Município Aileu, AD, I. P.

(Eng. Rui Lopes)
Engineiro ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun Município Aileu, ADN, I. P.

(Eng. Merinho Cuco L. de Araújo)
Eng. ba Edificio Publiku no Be'e Saneamento Município Aile, ADN, I. P.

(Eng. Remigio Dos Santos)
Engineiro Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, ADN, I. P.

(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Engineiro Senior ba Edificio Publiku no Be'e Saneamento, ADN, I. P.

(Silvino D. R. R. Soares)
Eng. M & E, Munisipiu Aileu, ADN, I. P.

(Deolindo de F. Marques)
Chefe Sec. Projeto M.E & ITC, ADN, I. P.

Sertifika Husi :
(Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I. P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of of helath Post and doctor s House Building
No. kontratu : RDTL-MS-DNA-ICB-21-073

Data Inspesaun : 23 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe , Faturilau

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item cat tembok doctor house

Ba Projetu refere ekipa ADN to iha tereno
nota katak laiha servisu nebe maka
kompanhia halao iha tereno.

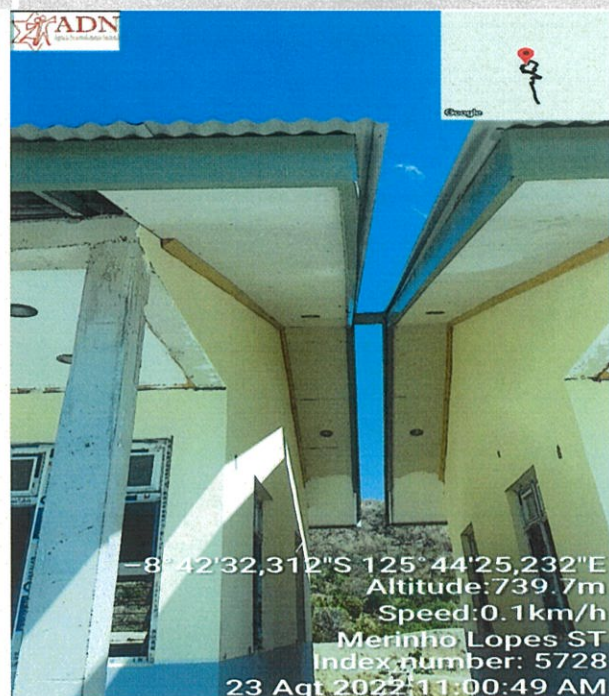



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 2)


Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of of helath Post and doctor s House Building
No. kontratu : RDTL-MS-DNA-ICB-21-073

Sketch & Foto Desenho

Ba Projetu refere ekipa ADN to iha tereno
nota katak laiha servisu nebe maka
kompanhia halao iha tereno.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

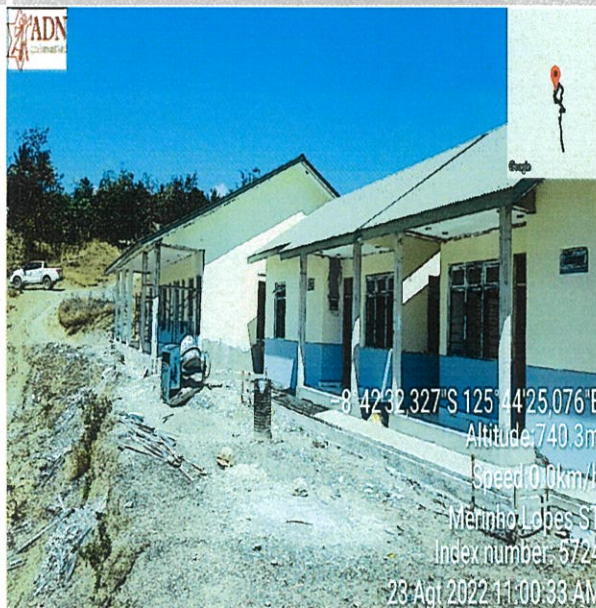

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Kalen**

Ba Projetu refere ekipa ADN to iha tereno
nota katak laiha servisu nebe maka
kompanhia halao iha tereno.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VHI GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional

ANEXU C2 (Le - 2)

PROJECT NAME : NEW CONSTRUCTION OF HEALTH POST AND DOCTOR'S HOUSE BUILDING

LOCATION : AILEU - LEQIDOE/FATURILAU MUNICIPALITY-TIMOR LESTE

PROJECT OWNER : MINISTRY OF HEALTH

SUMMARY

No		WORK DESCRIPTION	AMOUNT		WEIGHT	ADN ESTIMATED							
						PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE			
						AMOUNT	WEIGHT	AMOUNT	WEIGHT	AMOUNT	WEIGHT		
A		BUILDING A HEALTH POST											
1		PREPARATION WORKS	\$	4.803,37	1,60%	\$	2.617,12	0,87%	\$	-	\$	2.617,12	0,87%
2		FOUNDATION WORKS	\$	4.809,88	1,60%	\$	4.809,88	1,60%	\$	-	\$	4.809,88	1,60%
3		CONCRETE WORKS	\$	21.259,39	7,09%	\$	21.259,39	7,09%	\$	-	\$	21.259,39	7,09%
4		WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$	20.287,86	6,76%	\$	20.287,86	6,76%	\$	-	\$	20.287,86	6,76%
5		CARPENTRY WORKS	\$	9.792,00	3,26%	\$	9.792,00	3,26%	\$	-	\$	9.792,00	3,26%
6		ROOFING WORKS	\$	21.405,58	7,14%	\$	20.165,58	6,72%	\$	-	\$	20.165,58	6,72%
7		CEILING WORKS	\$	6.996,92	2,33%	\$	6.996,92	2,33%	\$	-	\$	6.996,92	2,33%
8		FLOOR TILE WORKS	\$	7.195,85	2,40%	\$	6.595,78	2,20%	\$	-	\$	6.595,78	2,20%
9		ELECTRICAL WORKS	\$	8.208,60	2,74%	\$	1.488,83	0,50%	\$	1.235,78	\$	2.724,60	0,91%
10		SANITATION WORKS	\$	7.251,56	2,42%	\$	2.957,69	0,99%	\$	-	\$	2.957,69	0,99%
11		PAINTING WORKS	\$	3.103,65	1,03%	\$	2.327,74	0,78%	\$	465,55	\$	2.793,28	0,93%
12		Apron and Drainage Work	\$	2.117,74	0,71%	\$	886,69	0,30%	\$	346,53	\$	1.233,22	0,41%
13		TOWER WORKS	\$	5.919,74	1,97%	\$	294,45	0,10%	\$	-	\$	294,45	0,10%
14		Provisional Sum for Furniture	\$	6.500,00	2,17%	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%
15		FINAL CLEARING	\$	100,00	0,03%	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%
TOTAL BUILDING A			\$	129.752,13	43,26%	\$	100.479,92	33,50%	\$	2.047,85	\$	102.527,77	34,18%
B		BUILDING B DOCTOR HOUSE											
1		PREPARATION WORKS	\$	576,80	0,19%	\$	576,80	0,19%	\$	-	\$	576,80	0,19%
2		FOUNDATION WORKS	\$	2.251,48	0,75%	\$	2.251,48	0,75%	\$	-	\$	2.251,48	0,75%
3		CONCRETE WORKS	\$	11.196,77	3,73%	\$	10.762,92	3,59%	\$	-	\$	10.762,92	3,59%
4		WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$	6.979,69	2,33%	\$	6.979,69	2,33%	\$	-	\$	6.979,69	2,33%
5		STAIRS WORKS	\$	729,88	0,24%	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%
6		CARPENTRY WORKS	\$	5.312,00	1,77%	\$	4.712,00	1,57%	\$	600,00	\$	5.312,00	1,77%
7		ROOFING WORKS	\$	8.555,09	2,85%	\$	8.555,09	2,85%	\$	-	\$	8.555,09	2,85%
8		CEILING WORKS	\$	3.027,04	1,01%	\$	3.027,04	1,01%	\$	-	\$	3.027,04	1,01%
9		FLOOR TILE WORKS	\$	2.910,20	0,97%	\$	2.368,49	0,79%	\$	83,44	\$	2.451,93	0,82%



**MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL**



**Agência de
Desenvolvimento
Nacional**

ANEXU C2 (Le - 2)

PROJECT NAME : NEW CONSTRUCTION OF HEALTH POST AND DOCTOR'S HOUSE BUILDING

LOCATION : AILEU - LEQIDOE/FATURILAU MUNICIPALITY-TIMOR LESTE

PROJECT OWNER : MINISTRY OF HEALTH

SUMMARY

No	WORK DESCRIPTION	AMOUNT	WEIGHT	ADN ESTIMATED					
				PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE	
				AMOUNT	WEIGHT	AMOUNT	WEIGHT	AMOUNT	WEIGHT
10	ELECTRICAL WORKS	\$ 3,620.00	1.21%	\$ 497.25	0.17%	\$ 366.75	0.12%	\$ 864.00	0.29%
11	SANITATION WORKS	\$ 6,753.86	2.25%	\$ 2,820.32	0.94%	\$ -	0.00%	\$ 2,820.32	0.94%
12	PAINTING WORKS	\$ 1,108.80	0.37%	\$ 776.16	0.26%	\$ 195.04	0.07%	\$ 971.20	0.32%
13	FURNITURE	\$ 4,000.00	1.33%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	TOTAL BUILDING B 1 UNIT	\$ 57,021.60	19.01%	\$ 43,327.23	14.45%	\$ 1,245.23	0.42%	\$ 44,572.47	14.86%
	2 UNIT BUILDING DOCTOR HOUSE	\$ 114,043.20	38.02%	\$ 86,654.47	28.89%	\$ 2,490.47	0.83%	\$ 89,144.93	29.72%
C	Provisional Sum for External Works	\$ 15,000.00	5.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 258,795.34	86.28%	\$ 187,134.39	62.39%	\$ 4,538.32	1.51%	\$ 191,672.71	63.90%
	CONTRACTOR FEE (10% x I)	\$ 25,879.53	8.63%	\$ 18,713.44	6.24%	\$ 453.83	0.15%	\$ 19,167.27	6.39%
	Over head	\$ 4,315.00	1.44%	\$ 3,236.25	1.08%	\$ -	0.00%	\$ 3,236.25	1.08%
	TAX (2% x (I+H+III))	\$ 5,779.80	1.93%	\$ 4,181.68	1.39%	\$ 99.84	0.03%	\$ 4,281.52	1.43%
	CONTINGENCY 2%	\$ 5,175.91	1.73%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	TOTAL PROJECT CONSTRUCTION	\$ 299,945.58	100.00%	\$ 213,265.76	71.10%	\$ 5,091.59	1.70%	\$ 218,357.76	72.80%

Prepared by:

Verified by:

Aproved by :

Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Municipio Aileu

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no Be'e
Mos

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controle e
Validação de Qualidade



ANEXU C1 (ALV - 11)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTO TIPO
EPE)
No. kontratu : GRUPU KOMUNITARIO

Data Inspesaun : 10 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Aileu, Selo Malere

Koordinadas :

Start Point : Long : -8,69808407 Latetude : 125.53881841

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo


2.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item instala Kuda Kuda

Volume nebe maka instala iha tereno 250,19
kg

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

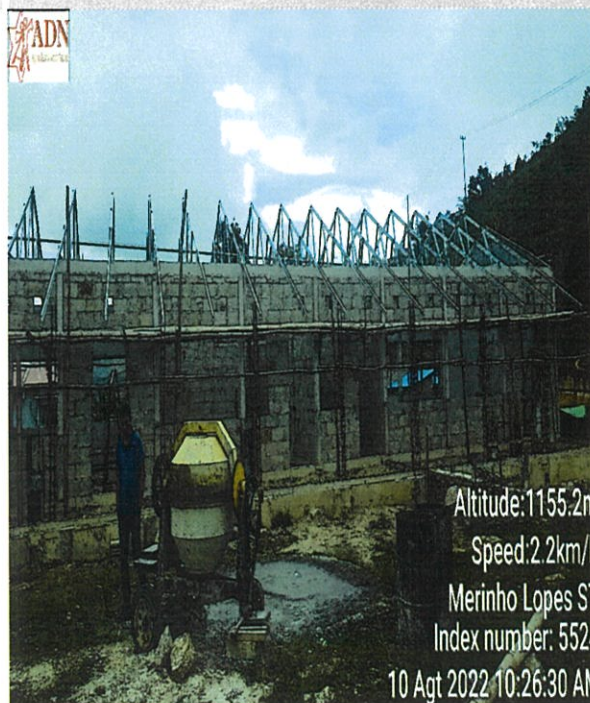

Altitude: 1155.2m

Speed: 2.2km/h

Merinho Lopes ST

Index number: 5524

10 Agt 2022 10:26:30 AM

ANEXU C1 (ALV - 11)

Back-up Data


Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTO TIPO
EPE)
No. kontratu : GRUPU KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Plesteran

Volume nebe maka instala iha tereno **250,19**
kg

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

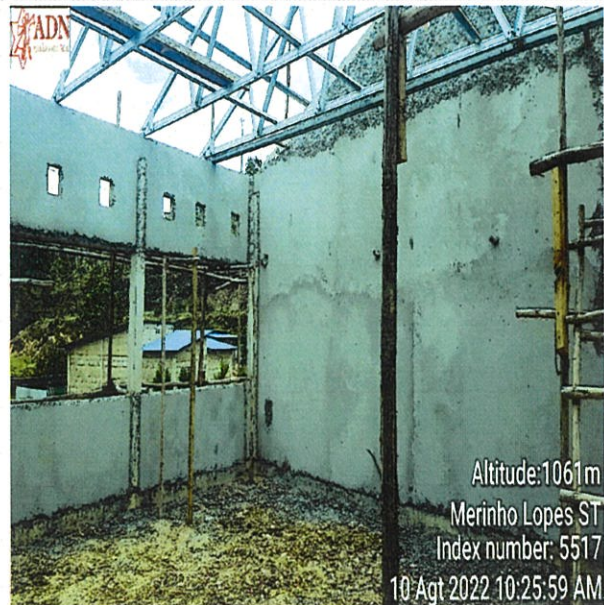

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 11)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTOTIPO EPE)

LOCATION : SELOI MALERE, AILEU VILA

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.800,00	2,16%	\$ -	0,00%	\$ 1.800,00	2,16%
2	Class Room Building C2	\$ 60.790,89	\$ 22.093,44	26,45%	\$ 3.967,87	4,75%	\$ 26.061,31	31,21%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 9.810,21	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
4	Provisional Sum for Demolition	\$ 500,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 74.176,10	\$ 23.893,44	28,61%	\$ 3.967,87	4,75%	\$ 27.861,31	33,36%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ 2.277,50	2,73%	\$ -	0,00%	\$ 2.277,50	2,73%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 83.516,10	\$ 26.170,94	31,34%	\$ 3.967,87	4,75%	\$ 30.138,81	36,09%

prepared by :

Eng. Merinho Cudo Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edifício no Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade

ANEXU D (ALV - 11)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN							
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTOTIPO EPE)							
Kompanha : Grupo Komunitario							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	10/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T ADN	1		
II	10/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	2		
III					3		
IV					4		
V					5		



ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Cnstruction Office CSS of Aileu District
No. kontratu : No: RDTL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

Data Inspesaun : 11 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item instala Bekisting ba Sloof

Ba bekisting nebe maka kompanhia monta
iha tereno hamutuk 68,20 m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: New Construction Office CSS of Aileu District
: No: RDTL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (AVL- 5)

Back-up Data

Naran Projeto : New Cinstruction Office CSS of Aileu District
No. kontratu : No: RDTL : 33/MSSI/ DGAF/DNA/XI/2021

Sketch Item bekisting ba Security Post

Volume nebe maka kompnhia instala
hamutuk 6,77 m2



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTERIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional

Anexu C2 (ALV - 5)

Naran Projctu
Nain ba Projctu
Fatin

: New Construction Office CSSM – Aileu
: Ministry Solidarity Social
: Aileu Villa, Aileu Municipality – Timor Leste

SUMMARY									
NO	DESCRIPTION	AMOUNT	PREVIOUS BILLING AMOUNT	WEIGHT	THIS BILLING AMOUNT	WEIGHT	UP TO DATE AMOUNT	WEIGHT	
A OFFICE									
I	PREPARATION WORKS	\$ 13.574,50	\$ 6.824,50	1,60%	\$ -	0,00%	\$ 6.824,50	1,60%	
II	EARTH WORKS	\$ 12.268,34	\$ 10.238,94	2,40%	\$ -	0,00%	\$ 10.238,94	2,40%	
III	MASONRY WORKS	\$ 53.876,80	\$ 19.036,63	4,46%	\$ -	0,00%	\$ 19.036,63	4,46%	
IV	CONCRETE WORKS	\$ 81.271,20	\$ 10.004,87	2,34%	\$ 1.887,47	0,44%	\$ 11.892,35	2,78%	
V	ROOFING WORKS	\$ 19.104,02	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
VI	CEILING WORKS	\$ 20.223,77	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
VII	CARPENTRY WORKS	\$ 11.855,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
VIII	ELECTRICAL WORKS	\$ 14.033,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
IX	SANITATION WORKS	\$ 13.209,93	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
X	PAINTING WORKS	\$ 3.850,57	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
B LANDSCAPE WORKS		\$ 94.245,62	\$ 46.104,95	10,79%	\$ 1.887,47	0,44%	\$ 47.992,42	11,24%	
PARK AND OFFICE PLATFORM WORKS									
I	PRELIMINARY WORKS	\$ 38.009,23	\$ 1.019,52	0,24%	\$ -	0,00%	\$ 1.019,52	0,24%	
II	PARK ELECTRICAL WORKS	\$ 3.179,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
III	FENCE WORKS	\$ 53.057,39	\$ 10.714,29	2,51%	\$ -	0,00%	\$ 10.714,29	2,51%	
C SECURITY POST TWO UNIT		\$ 32.085,31	\$ 11.733,81	2,75%	\$ -	0,00%	\$ 11.733,81	2,75%	
I	EARTH AND SAND WORKS	\$ 1.065,73	\$ 147,93	0,03%	\$ -	0,00%	\$ 147,93	0,03%	
II	WALL MASONRY AND PLESTER WORKS	\$ 9.359,81	\$ 1.236,67	0,29%	\$ -	0,00%	\$ 1.236,67	0,29%	
III	CONCRETE WORKS	\$ 5.396,67	\$ 369,64	0,09%	\$ 187,36	0,04%	\$ 557,00	0,13%	
IV	FLOOR WORKS	\$ 1.322,09	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
V	CARPENTRY WORKS	\$ 1.858,40	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
VI	ROOFING AND CEILING WORKS	\$ 3.757,99	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
VII	SANITATION WORKS	\$ 3.755,96	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
VIII	ELECTRICAL WORKS	\$ 5.184,30	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
IX	PAINTING WORKS	\$ 384,35	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
BUDGET AT COMPLETION, TOTAL(A+B+C)		\$ 369.598,07	\$ 59.592,98	13,95%	\$ 2.074,83	0,49%	\$ 61.667,82	14,44%	
B	CONTRACTOR FEE (10%xA)	\$ 36.959,81	\$ 5.959,30	1,40%	\$ 207,48	0,05%	\$ 6.166,78	1,44%	
C	OVERHEAD	\$ 4.950,01	\$ 851,00	0,20%	\$ -	0,00%	\$ 851,00	0,20%	
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 8.230,16	\$ 1.328,07	0,31%	\$ 45,65	0,01%	\$ 1.373,71	0,32%	
E	CONTINGENCY (2% x A)	\$ 7.391,96	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
F	GRAND TOTAL	\$ 427.130,00	\$ 67.731,35	15,86%	\$ 2.327,96	0,55%	\$ 70.059,31	16,40%	

prepared by :

Verify by :

Approved by :

Eng. Merinho Cacul Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenhheiro Senior na Proteito Edificio no Be'e Mos

Eng. Emerenciana Da Costa Mala
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao de
Qualidade

ANEXUD (Avl - 5)



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction Office CSS Of Aileu District

Kompanha : Kevina Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	11/08/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1	Handwritten notes in Tetum and English, including coordinates and altitude.	
					2		
					3		
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1	-8° 43'9,938"S 125° 33'54,983"E Aileu Altitude: 877m Merinho Lopes ST Index number: 5576 11 Agt 2022 11:29:02 AM	
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 14)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Data Inspesaun : 24 Agosto de 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Selo Malere

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.71344607 Latetude : 125.564061

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1. Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu eze kuta obra refere
ho nune hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

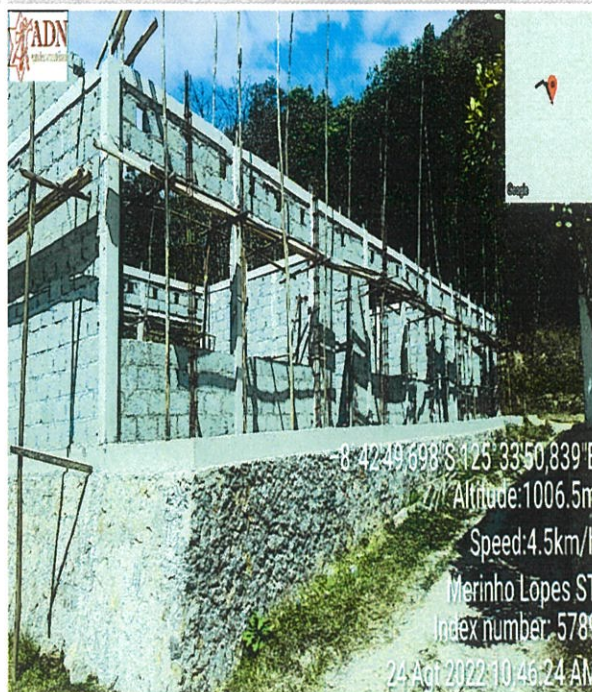



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 14)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
: GRUPO KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E O R D E N A M E N T O
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 14)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE
LOCATION : SELOI - MALERE

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.743,75	1,24%	\$ -	0,00%	\$ 1.743,75	1,24%
2	Class Room Building C (2 Units)	\$ 113.990,70	\$ 34.198,59	24,33%	\$ -	0,00%	\$ 34.198,59	24,33%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 14.140,08	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	Total Construction Cost	\$ 131.205,78	\$ 35.942,34	25,57%	\$ -	0,00%	\$ 35.942,34	25,57%
	Overhead	\$ 6.340,00	\$ 1.755,00	1,25%	\$ -	0,00%	\$ 1.755,00	1,25%
	Contingency	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	Grand Total	\$ 140.545,78	\$ 37.697,34	26,82%	\$ -	0,00%	\$ 37.697,34	26,82%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Enginheiro Senior da Projeto Edificio no Be'e
Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

ANEXU D (ALV - 14)



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS ESG SELOI -MALERE					
Kompanha : Grupo Komunitario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	24/08/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1
					2
					3
					4
					5
II	24/08/2022	Aileu, Aileu Villa	Joao Dos Reis Mendes	T. MEJD	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Tb
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 23 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Fahisoi - Lequedoe

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu eze kuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

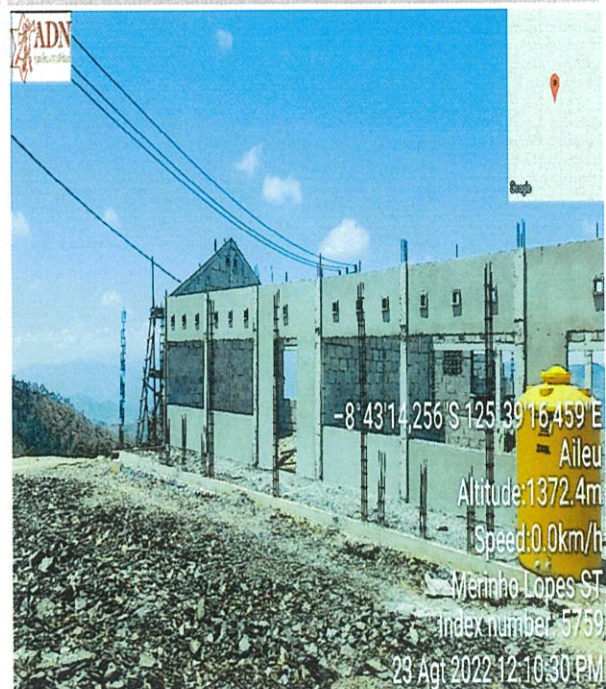



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 2)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Tb
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projeto refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (LE - 2)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : FAHSOI - LEQUEDOE

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.800,00	1,54%	\$ -	0,00%	\$ 1.800,00	1,54%
2	Class Room Building C	\$ 56.180,86	\$ 19.923,31	17,00%	\$ 2.580,72	2,20%	\$ 22.504,03	19,21%
3	Toilet Building Tb	\$ 29.383,00	\$ 12.688,60	10,83%	\$ -	0,00%	\$ 12.688,60	10,83%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 19.192,29	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 107.831,14	\$ 34.411,90	29,37%	\$ 2.580,72	2,20%	\$ 36.992,63	31,57%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ 2.185,00	1,86%	\$ -	0,00%	\$ 2.185,00	1,86%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 117.171,14	\$ 36.596,90	31,23%	\$ 2.580,72	2,20%	\$ 39.177,63	33,44%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Jeronimo
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao
de Qualidade

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C) + TB

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	23/08/2022	Lequidoe, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1 2 3 4 5
II	23/08/2022	Lequidoe, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T, MEJD	1 2 3 4 5
III					1 2 3 4 5
IV					1 2 3 4 5
V					1 2 3 4 5



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (AVL - 9)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção Edifício Pré-Escolar (Prototipo Epe)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 24 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa Sarin, Mantane

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere parado hela ho razaun tamba grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere ho nune hein pagamento sai maka foin bele halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (AVL - 9)

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção Edifício Pré Escolar (Prototipo Epe)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere parado hela ho razaun tamba
grupo osan laiha ona atu ezejuta obra refere
ho nunee hein pagamento sai maka foin bele
halao fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

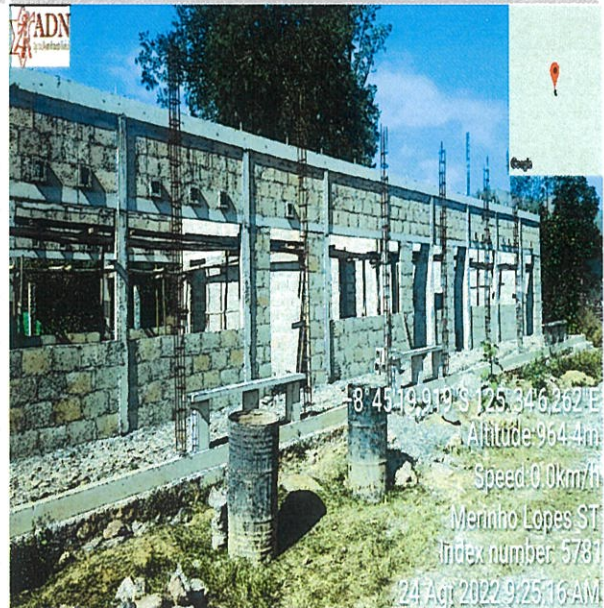

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (Avl - 9)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTOTIPO EPE)
LOCATION : FAHIRIA, AILEU VILA

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.800,00	2,13%	\$ -	0,00%	\$ 1.800,00	2,13%
2	Class Room Building C2	\$ 60.790,89	\$ 19.457,52	22,99%	\$ -	0,00%	\$ 19.457,52	22,99%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 10.972,24	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
4	Provisional Sum for Demolition	\$ 450,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	Total Construction Cost	\$ 75.288,13	\$ 21.257,52	25,12%	\$ -	0,00%	\$ 21.257,52	25,12%
	Overhead	\$ 6.340,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	Contingency	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	Grand Total	\$ 84.628,13	\$ 21.257,52	25,12%	\$ -	0,00%	\$ 21.257,52	25,12%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

ANEXU D (Avl - 9)



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO EDIFICIO PRE ESCOLAR (PROTOTIPO EPE)					
Kompanha : Grupo Komunitario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	24/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T ADN	1
					2
					3
					4
					5
II	24/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5

konstrusaun refere mos parado hela ho razaun grupo Komunitaria sira osan hotu ona no hein pagamento maka servisu foin bele lao fila fali.

Asinatura



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 3)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 23 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe , Asubli Toho, Urban.

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Gording ho Kuda Kuda

Volume ba kuda kuda nebe maka grupo
instala hamutuk **408,38 kg**

Ba Gording hamutuk **240,50 kg**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

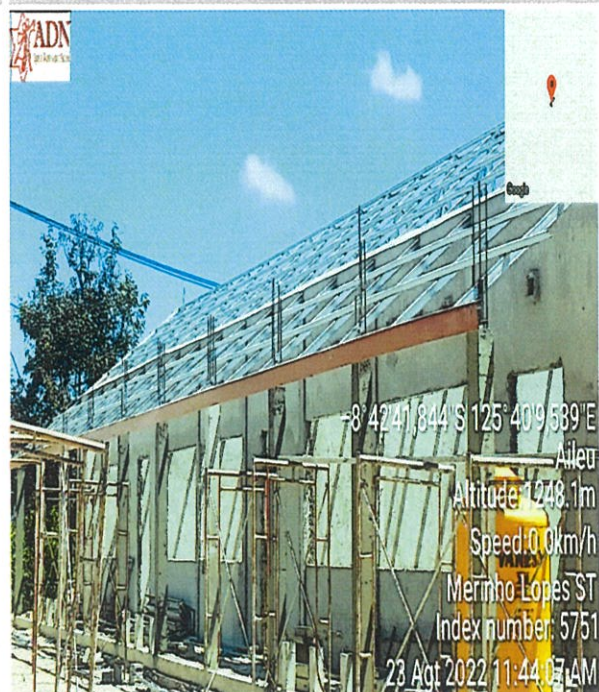



MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le - 3)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Gording ho Kuda Kuda**

Volume ba kuda kuda nebe maka grupo

instala hamutuk **408,38 kg**

Ba Gording hamutuk **240,50 kg**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu **Gording ho Kuda Kuda**

Volume ba kuda kuda nebe maka grupo

instala hamutuk **408,38 kg**

Ba Gording hamutuk **240,50 kg**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

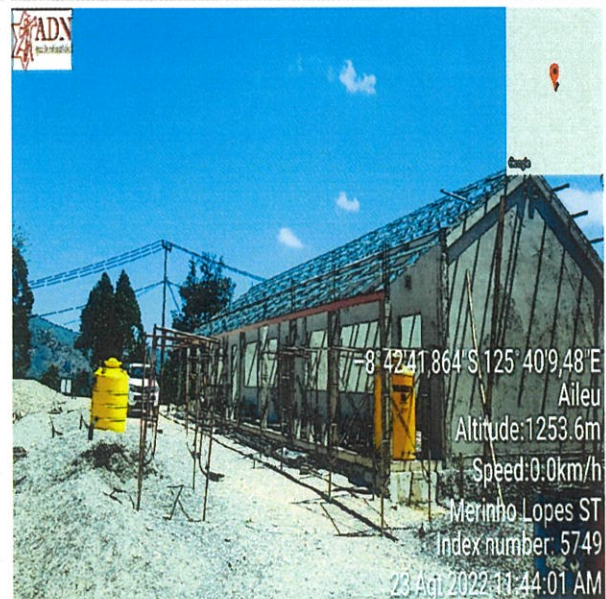



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (LE - 3)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)
LOCATION : URBADAN, SUCO ASUBLI TOHO-LEQUIDOE,AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.668,75	2,26%	\$ -	0,00%	\$ 1.668,75	2,26%
2	Class Room Building C	\$ 55.945,00	\$ 24.841,62	33,57%	\$ 4.830,32	6,53%	\$ 29.671,94	40,10%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 5.628,60	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 64.648,60	\$ 26.510,37	35,83%	\$ 4.830,32	6,53%	\$ 31.340,69	42,36%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ 2.185,00	2,95%	\$ -	0,00%	\$ 2.185,00	2,95%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	-	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 73.988,60	\$ 28.695,37	38,78%	\$ 4.830,32	6,53%	\$ 33.525,69	45,31%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Jeronimo
Enginheiro Senior ba Projeto Edificio no Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao
de Qualidade

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	23/08/2022	Líquidoes, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1		
II	23/08/2022	Líquidoes, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1		
III					1		
IV					1		
V					1		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU D (ALV - 12)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo komunitario

Data Inspesaun : 22 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Bandudato

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.80143040 Latetude : 125.58728635

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item kuda kuda no Gording

Instala Kuda Kuda No gording

Volume kuda kuda hamutuk 408,378 kg

Volume Gording hamutuk 240,50 kg

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU D (ALV - 12)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo komunitario

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu

Instala Kuda Kuda No gording

Volume kuda kuda hamutuk **408,378 kg**

Volume Gording hamutuk **240,50 kg**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

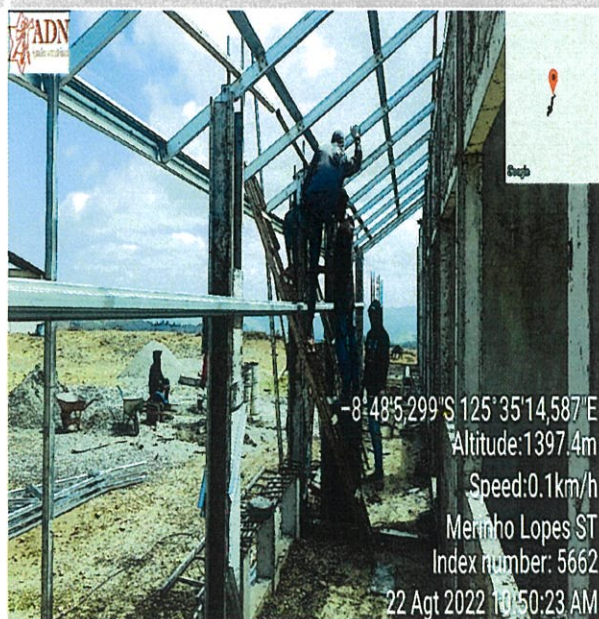

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INAP, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 12)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : BANDUDATO, AILEU VILA

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.800,00	1,76%	\$ -	0,00%	\$ 1.800,00	1,76%
2	Class Room Building C	\$ 50.830,97	\$ 17.644,83	17,22%	\$ 8.952,22	8,73%	\$ 26.597,05	25,95%
3	Toilet Building Tb	\$ 25.349,43	\$ 10.706,17	10,45%	\$ -	0,00%	\$ 10.706,17	10,45%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 13.449,03	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
5	Provisional Sum for Demolition	\$ 450,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 93.154,43	\$ 30.151,00	29,42%	\$ 8.952,22	8,73%	\$ 39.103,22	38,15%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ 2.185,0000	2,13%	\$ -	0,00%	\$ 2.185,00	2,13%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 102.494,43	\$ 32.336,00	31,55%	\$ 8.952,22	8,73%	\$ 41.288,22	40,28%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ierpinimo
Engenheiro Senior da Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

ANEXU D (ALV - 12)



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB

Kompanha : Grupo Komunitario

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	10/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T ADN	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
II	10/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		

ANEXU C1 (Le - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 17 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe, Aileu Suku Manukasa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item ranga kuda kuda, Gording no
list plant

Ba rangka kuda kuda nebe maka grupo
instala iha tereno hamutuk 408,378 kg
Ba gording hamutuk volume 240, 50 kg
Ba listplank hamutuk 39 kg no sent plat
hamutuk 39 m'

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (Le - 4)

Back-up Data


Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Plesteran**

Ba rangka kuda kuda nebe maka grupo
instala iha tereno hamutuk **408,378 kg**
Ba gording hamutuk volume **240, 50 kg**
Ba listplank hamutuk **39 kg** no sent plat
hamutuk **39 m**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

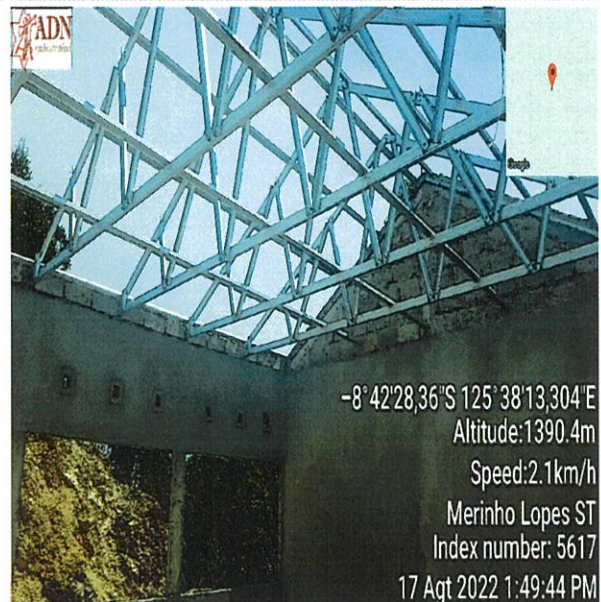


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Plesteran**

Ba rangka kuda kuda nebe maka grupo
instala iha tereno hamutuk **408,378 kg**
Ba gording hamutuk volume **240, 50 kg**
Ba listplank hamutuk **39 kg** no sent plat
hamutuk **39 m**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

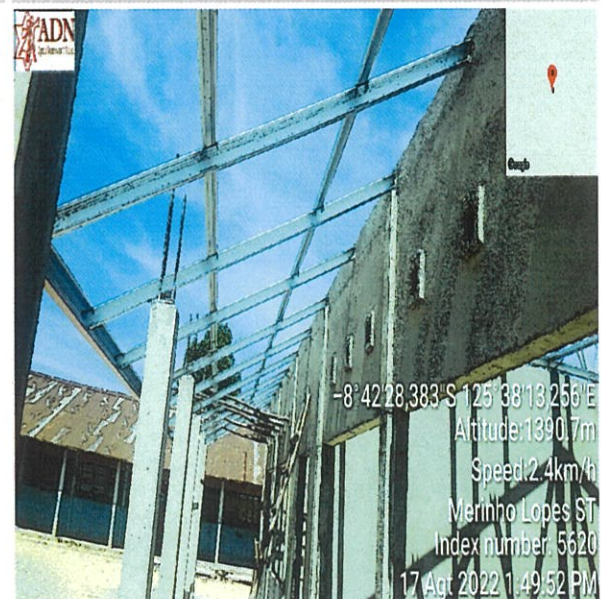



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (LE - 4)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTI
LOCATION : FATUK MARIU, SUCO MANUKASSA -LEQUIDOE,AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.743,75	2,35%	\$ -	0,00%	\$ 1.743,75	2,35%
2	Class Room Building C	\$ 54.915,20	\$ 22.585,60	30,41%	\$ 6.269,36	8,44%	\$ 28.854,96	38,85%
3	Provisional Sum for Site Works	\$ 6.447,58	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
4	Provisional Sum for Site Demolition	\$ 500,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 64.937,78	\$ 24.329,35	32,75%	\$ 6.269,36	8,44%	\$ 30.598,71	41,19%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ 1.660,00	2,23%	\$ -	0,00%	\$ 1.660,00	2,23%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 74.277,78	\$ 25.989,35	34,99%	\$ 6.269,36	8,44%	\$ 32.258,71	43,43%

prepared by :

Eng. Merinho Quao Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
leponimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIA GOVERNO CONSTRUÇÃO



ANEXU D (LE - 4)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)

Kompanha : Grupo Komunitario

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					Asinatura
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	17/08/2022	Lequidoe, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T AND	1
II	17/08/2022	Lequidoe, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	2
III					3
IV					4
V					5

Altitude: 1295m
Merinho Lopes ST
Index number: 5626
17 Agt 2022 1:55:57 PM

21/07/22	Merinho S. L. de Araujo	ADN IP	T. AND	Merinho S. L. de Araujo	Merinho S. L. de Araujo
25/07/22	Joao dos Reis Mendes	MEJD-IP	MEJD-IP	Joao dos Reis Mendes	Joao dos Reis Mendes
05/08/22	Joao dos Reis Mendes	MEJD-IP	MEJD-IP	Joao dos Reis Mendes	Joao dos Reis Mendes
10/08/22	Joao dos Reis Mendes	MEJD-IP	MEJD-IP	Joao dos Reis Mendes	Joao dos Reis Mendes
17/08/22	Merinho S. L. de Araujo	ADN IP	ADN IP	Merinho S. L. de Araujo	Merinho S. L. de Araujo



ANEXU C1 (ALV - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C) + TB
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Data Inspesaun : 19 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Suku Liurai (Laclo)

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere kondisaun parado hela ho
razaun comunidade osan ba eze kuta obra
refere hotu ona no hein pagamento maka foin
bele kontinua fila fali

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

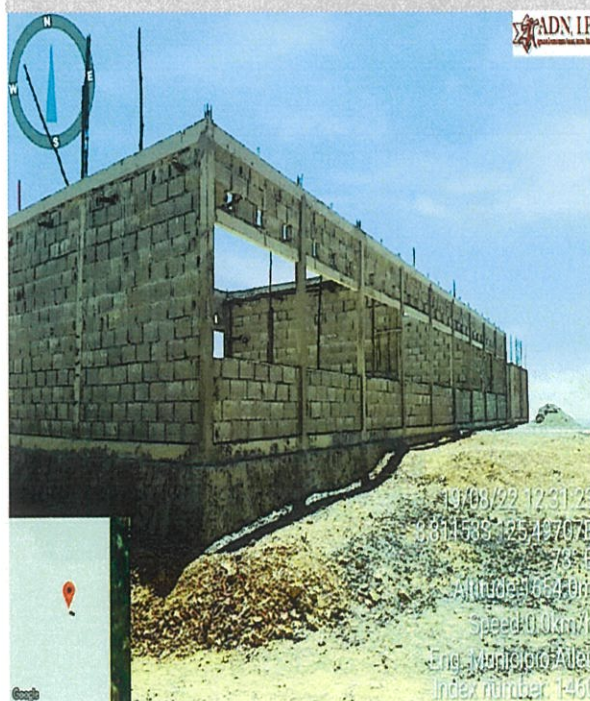



ANEXU C1 (ALV - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C) + TB
No. kontratu : GRUPO KOMUNITARIO

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **Back Fill Pondasi Toilet**

Projetu refere kondisaun parado hela ho
razaun comunidade osan ba ezejuta obra
refere hotu ona no hein pagamento maka foin
bele kontinua fila fali

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (Avl - 10)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : LACLO, SUCO LIURAI

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.725,00	1,73%	\$ -	0,00%	\$ 1.725,00	1,73%
2	Class Room Building C	\$ 50.833,58	\$ 15.639,12	15,70%	\$ -	0,00%	\$ 15.639,12	15,70%
3	Toilet Building Tb	\$ 25.271,72	\$ 4.449,97	4,47%	\$ -	0,00%	\$ 4.449,97	4,47%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 10.876,83	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
5	Provisional Sum for Demolition	\$ 200,00	\$ 200,00	0,20%	\$ -	0,00%	\$ 200,00	0,20%
Total Construction Cost		\$ 90.257,13	\$ 22.014,09	22,10%	\$ -	0,00%	\$ 22.014,09	22,10%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ 1.985,00	1,99%	\$ -	0,00%	\$ 1.985,00	1,99%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 99.597,13	\$ 23.999,09	24,10%	\$ -	0,00%	\$ 23.999,09	24,10%

prepared by :

Verify by :

Aproved by :

Eng. Merinho Curo Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior ba Projeto
Edificio no Be'e Mos

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade

ANEXU D (Avl - 10)





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, IP
Agência de
Estatística Nacional
Nacional Institute of Statistics

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB					
Kompanha : Grupo Komunitario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	19/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1
					2
					3
					4
					5
II	19/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					Asinatura
Liu husi Monitiorzasaun nebe maka ekipa AND halao lha tereno nota katak grupo komunitario PKRIE la halo servisu rumu lha tereno					
Grupo Komunitaria la Servisu Ho Razaun tamba osan laiha ona atu kontinua servisu no hein pagamento maka foin bele servisu					

ANEXU D (ALV - 15)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 19 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Suku Liurai, Fatubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.


4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Servisu Parado ho Razaun tamba grupo osan
hotu atu executa projetu refere no hein
pagamento segundu maka foin bele kontinua
fali obra refere

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

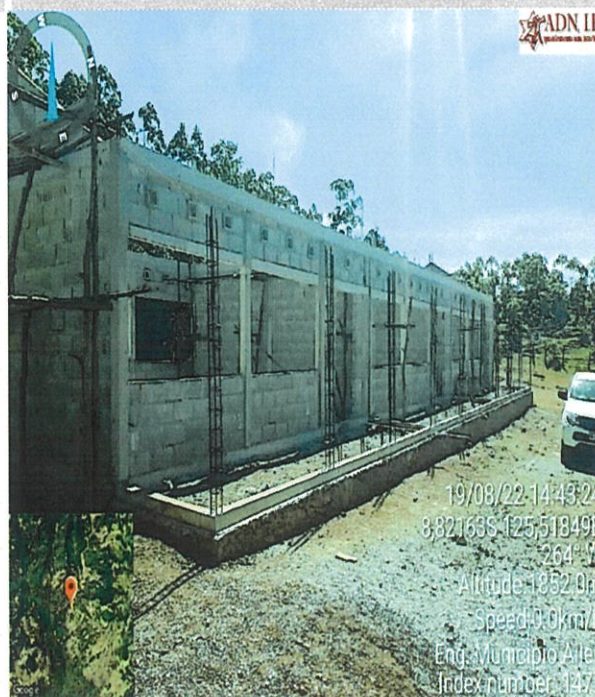

ANEXU D (ALV - 15)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Servisu Parado ho Razaun tamba grupo osan hotu atu executa projetu refere no hein pagamento segundu maka foin bele kontinua fali obra refere	
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu	



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB					
Kompanha : Grupo Komunitario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	19/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T ADN	1
					2
					3
					4
					5
II	19/08/2022	Aileu Villa, Aileu	Joao dos Reis Mendes	T. MEJD	1
					2
					3
					4
					5
III					1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5

Asinatura

projeto refere mos parado hela ho Razaun tamba grupo osan laiha ona atu executa Obra refere no hein ba Segundo Pagamento maka foin bele Kontinua fali obra refere



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : FATUBESI, AILEU-VILA

ANEXU C2 (Avl - 15)

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.800,00	1,77%	\$ -	0,00%	\$ 1.800,00	1,77%
2	Class Room Building C	\$ 51.228,95	\$ 15.163,36	14,95%	\$ -151,40	-0,15%	\$ 15.011,95	14,80%
3	Toilet Building Tb	\$ 25.530,78	\$ 7.817,02	7,71%	\$ 1.206,82	1,19%	\$ 9.023,84	8,90%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 12.234,70	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 92.069,44	\$ 24.780,38	24,44%	\$ 1.055,42	1,04%	\$ 25.835,80	25,48%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ -	0,00%	\$ 3.170,00	3,13%	\$ 3.170,00	3,13%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 101.409,44	\$ 24.780,38	24,44%	\$ 4.225,42	4,17%	\$ 29.005,80	28,60%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação
de Qualidade

ANEXU D (ALV - 13)

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 22 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Lausi

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.


4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Projetu refere la servisu ho razaun tamba
Grupo sira nia orsamento atu executa obra
refere laiha ona no Hein ba Pagamento 2 mak
foin bele Kontinua

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

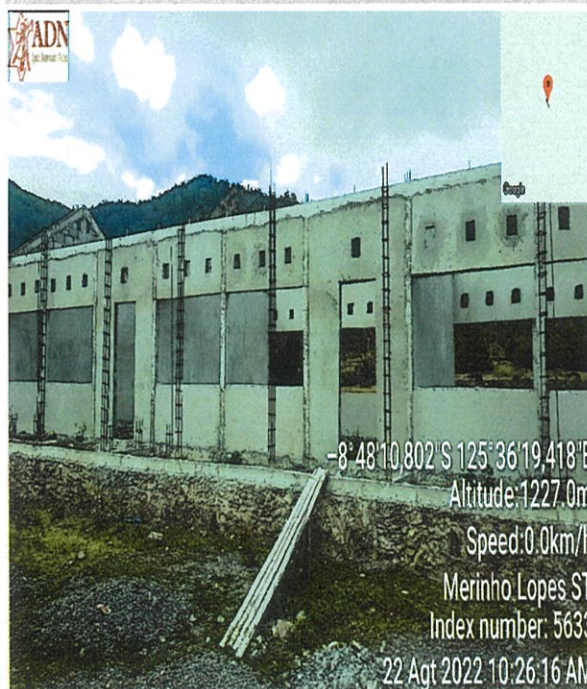

ANEXU D (ALV - 13)

Back-up Data


Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Projetu refere la servisu ho razaun tamba
Grupo sira nia orsamento atu executa obra
refere laiha ona no Hein ba Pagamento 2 mak
foin bele Kontinua

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

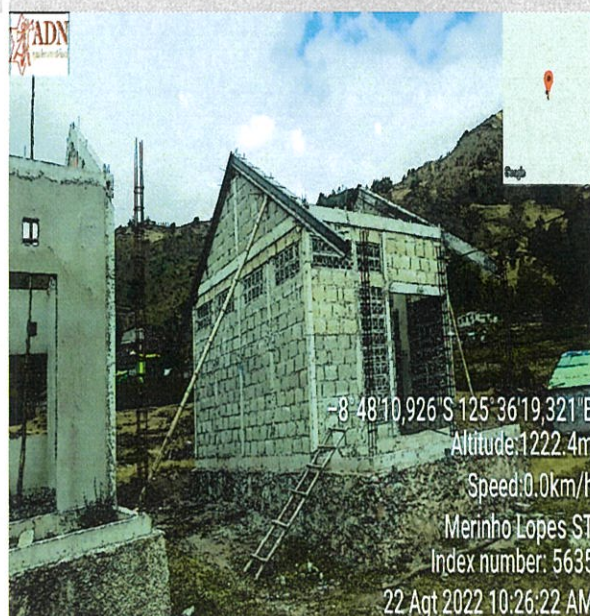

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 13)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : LAUSI, DARAHAE, AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %	AMOUNT	WEGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 2.293,75	2,30%	\$ -	0,00%	\$ 2.293,75	2,30%
2	Class Room Building C	\$ 50.833,58	\$ 18.611,57	18,65%	\$ 529,35	0,53%	\$ 19.140,92	19,19%
3	Toilet Building Tb	\$ 25.268,20	\$ 5.196,44	5,21%	\$ 324,25	0,32%	\$ 5.520,69	5,53%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 11.253,44	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 90.430,22	\$ 26.101,76	26,16%	\$ 853,60	0,86%	\$ 26.955,36	27,02%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ 1.560,00	1,56%	\$ -	0,00%	\$ 1.560,00	1,56%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 99.770,22	\$ 27.661,76	27,73%	\$ 853,60	0,86%	\$ 28.515,36	28,58%

prepared by:

Eng. Merinho Lopes de
Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by:

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by:

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



ANEXU C1 (AVL - 16)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu

No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230

Data Inspesaun : 11 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa , Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.719208862 Latetude : 125.570387095

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item instala sent plat

Volume nebe maka kompanhia monta
hamutuk **25,37 m2**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (AVL - 16)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu

No. kontratu : RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **pinta Portaun**
Portaun nebe maka kompanhia halo uza besi
hollow ho volume total **131,86 kg**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

ANEXUD (Avl - 2)



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : New Construction Of Fence At CSI Aileu

Kompanha : Behale Interprise Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	Asinatura
I	11/08/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
II	11/08/2022	Aileu, Aileu Villa	Emanuel B.F. Lelan	T. MDS	1	
					2	
					3	
					4	
					5	
III					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
IV					1	
					2	
					3	
					4	
					5	
V					1	
					2	
					3	
					4	
					5	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Naran Projetu : New Constructio of Fence CSI Aileu- Timor-Leste.
Fatin Projetu : CSI Aileu, Sub Distrito Aileu Vila, Distrito Aileu
Nain Projetu : Ministerio da Saude

ANEXU C2 (AVL- 16)

SUMMARY

No	WORK DESCRIPTION	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
		AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
I	PREPARATION WORKS	\$ 1.629,26	1,04%	\$ -	0,00%	\$ 1.379,26	1,04%
II	Fundatin Works	\$ 10.036,65	7,60%	\$ -	0,00%	\$ 10.036,65	7,60%
III	CONCRETE WORKS	\$ 33.766,29	23,05%	\$ -	0,00%	\$ 30.448,56	23,05%
IV	Wall Instalation And Plestering	\$ 35.402,78	23,92%	\$ 533,38	0,40%	\$ 32.138,60	24,33%
V	Others Works	\$ 3.094,75	0,33%	\$ -	0,00%	\$ 439,36	0,33%
VI	PATHWAY WORKS	\$ 20.077,02	8,54%	\$ 2.962,41	2,24%	\$ 14.242,44	10,78%
VII	Final Clearing	\$ 125,00	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	Construction Coast	\$ 104.131,74	64,48%	\$ 3.495,79	2,65%	\$ 88.684,86	67,12%
B	Contractor Fee (10%xA)	\$ 10.413,17	6,45%	\$ 349,58	0,26%	\$ 8.868,49	6,71%
C	Overhead	\$ 4.775,00	1,81%	\$ -	0,00%	\$ 2.387,50	1,81%
D	Tax(2%(xA+B+C)	\$ 2.386,40	1,45%	\$ 76,91	0,06%	\$ 1.998,82	1,51%
E	Contingency (10%xA)	\$ 10.413,17	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
f	Grand Total (A+B+C+D+E)	\$ 132.119,49	74,19%	\$ 3.922,28	2,97%	\$ 101.939,66	77,16%

prepared by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Enginheiro Senior da Projeto Edificio no Be e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 17 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Maumeta, Remixio-Aileu

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.


4.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item plesteran ba iha Prototipo C

Servisu nebe maka grupo Halao iha tereno
mak halao plesteran volume total 143,70 m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

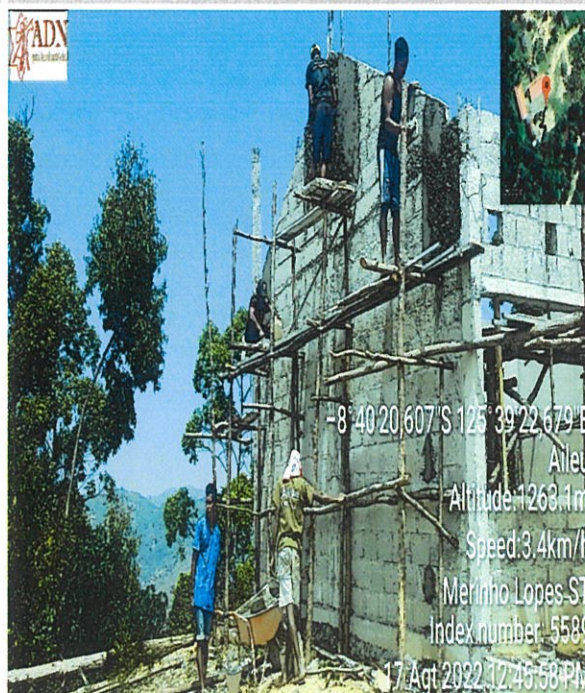



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+TB
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **pembesian ring balk**

Servisu nebe maka grupo Halao iha tereno
mak halao plesteran volume total **143,70 m²**

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

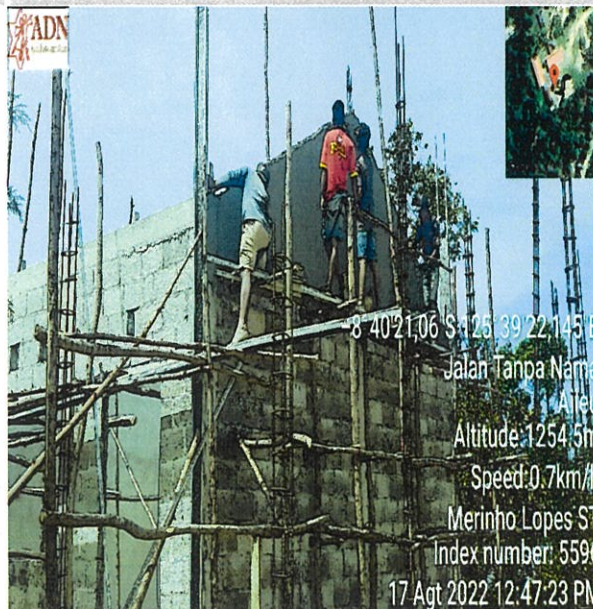

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (RE - 2)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB
LOCATION : MAUMETA, REMIXIO-AILEU

SUMMARY

NO	ITEM SERVIUS	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.350,00	1,26%	\$ -	0,00%	\$ 1.350,00	1,26%
2	Class Room Building C	\$ 55.454,21	\$ 14.291,76	13,38%	\$ 2.522,90	2,36%	\$ 16.814,66	15,74%
3	Toilet Building Tb	\$ 26.626,00	\$ 5.148,25	4,82%	\$ -	0,00%	\$ -	4,82%
4	Provisional Sum for Site Works	\$ 11.927,26	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
5	Provisional Sum for Demolition	\$ 425,00	\$ 425,00	0,40%	\$ -	0,00%	\$ 425,00	0,40%
Total Construction Cost		\$ 97.507,46	\$ 21.215,01	19,86%	\$ 2.522,90	2,36%	\$ 18.589,66	22,22%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 106.847,46	\$ 21.215,01	19,86%	\$ 2.522,90	2,36%	\$ 18.589,66	22,22%

prepared by :

Eng. Merinho Curo Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Verify by :

Arch Francisco Xavier de Deus
Jerônimo
Engenheiro Senior da Projeto Edificio no
Be'e Mos

Aproved by :

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

Naran projeto : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+TB

Kompanha : Grupo Komunitario[illegible]



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (AVL - 8)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Escritorio
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspeção : 10 Agosto 2022

Fatin Inspeção : Aileu - Villa Selo-Craik

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.


3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item

Servisu is terreno la lao ho razaun tamba
badaen sira sei ba koa hare ho nune
aktividade iha terreno la Lao no ekipa ADN
update deit maka item nebe antes Grupo halo
ona

Observasaun iha terreno no Foto Aktual

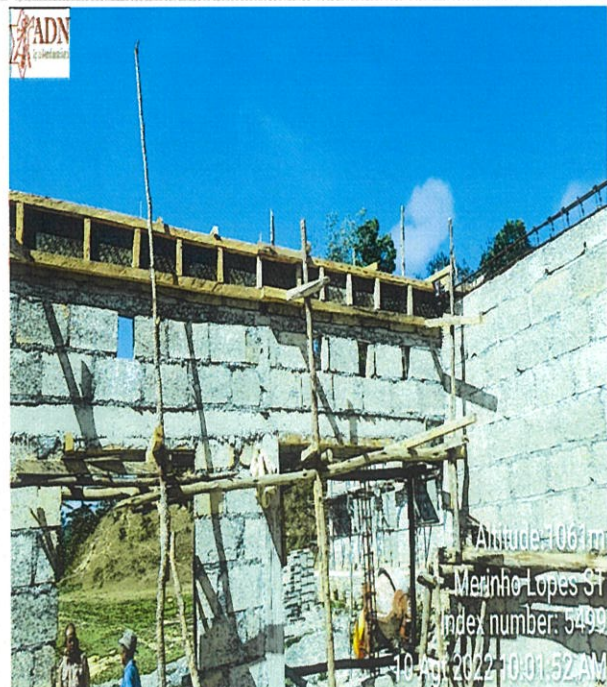



ANEXU C1 (AVL - 8)

Back-up Data


Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)+Escritorio
No. kontratu : Grupo Komunitario

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Servisu is tereno la lao ho razaun tamba
badaen sira sei ba koa hare ho nune
aktividade iha tereno la Lao no ekipa AND
update deit maka item nebe antes Grupo halo
ona

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

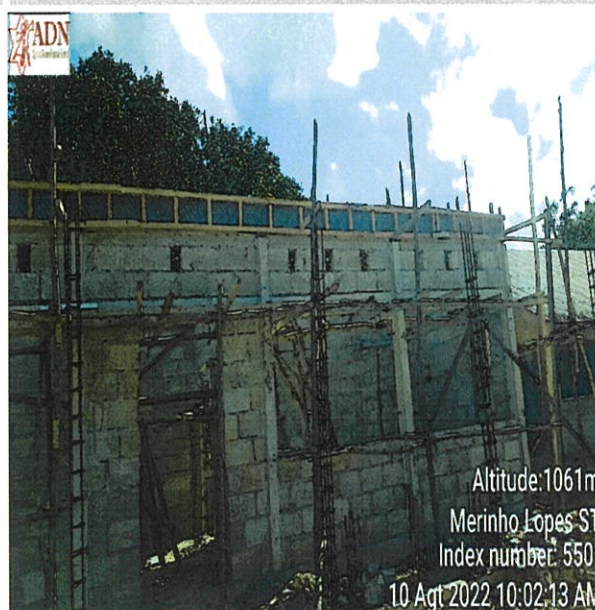

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (Avl - 8)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS (PROTOTIPO C)+ESCRITORIO
LOCATION : SELOI-CRAIK

SUMMARY

NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN	PREVIUOS BILLING		THIS BILLING		TO DATE BILLING	
			AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %
1	Preliminaries Works	\$ 3.075,00	\$ 1.900,00	1,25%	\$ -	0,00%	\$ 1.900,00	1,25%
2	Class Room Building C	\$ 50.575,14	\$ 14.530,03	9,56%	\$ 321,24	0,21%	\$ 14.851,27	9,77%
3	Teacher Office	\$ 67.964,02	\$ 21.610,10	14,21%	\$ -	0,00%	\$ 21.610,10	14,21%
4	Provesional Sum for Site Works	\$ 21.089,95	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Total Construction Cost		\$ 142.704,11	\$ 38.040,13	25,02%	\$ 321,24	0,21%	\$ 38.361,37	25,23%
Overhead		\$ 6.340,00	\$ 2.085,00	1,37%	\$ -	0,00%	\$ 2.085,000	1,37%
Contingency		\$ 3.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Grand Total		\$ 152.044,11	\$ 40.125,13	26,39%	\$ 321,24	0,21%	\$ 40.446,37	26,60%

prepared by :

Verify by :

Aproved by :

Eng. Merinho Cuco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Arch Francisco Xavier de Deus
Ieronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio
no Be'e Mos

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : Konstrusaun Salas de Aulas 3 + Eskritorio ESTV					
Kompanha : Grupo Kominutario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	10/08/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T'ADN	1
					2
					3
					4
					5
II	10/08/2022	Aileu, Aileu Villa	Joao dos Reis Mendes	MEJD - DNDPE	1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5



Altitude: 1059m

Merinho Lopes ST

Index number: 5505

10 Agt 2022 10:12:44 AM



ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)
No. kontratu : Grupo Komunitario

Data Inspesaun : 04 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Remexio , tulataqueu, Fatubutik

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long : , Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item pasangan batako

Pasangan batako ba iha Prototipo C volume
neebe maka implementa iha tereno hamutuk
83,70 m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data

Naran Projeto : Nova Construção 3 Salas De Aulas (Prototipo C)

No. kontratu : Grupo Komunitario


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **pasangan batako**

Pasangan batako ba iha Prototipo C volume
neebe maka implementa iha tereno hamutuk

83,70 m2

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

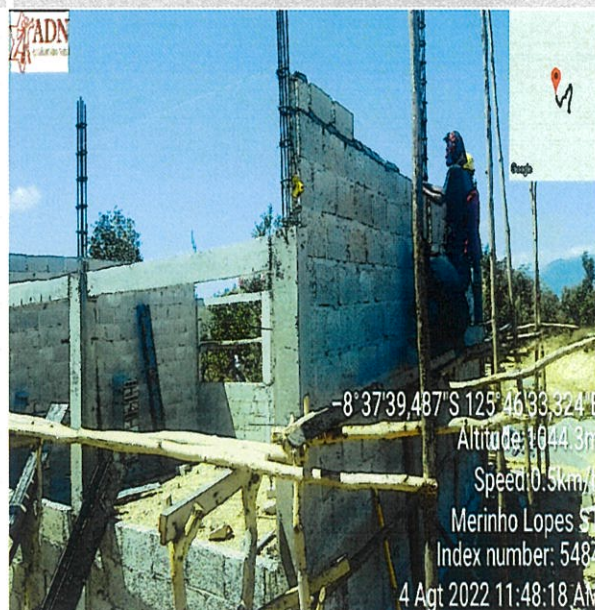

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (RE - 1)

PROJECT NAME : NOVA CONSTRUCAO 3 SALAS DE AULAS
LOCATIO : FATUBUTIK, SUCO TULATAQUEU, REMIXIO- AILEU

SUMMARY												
NO	ITEM SERVISU	VERIFIED BY ADN			PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE			
		AMOUNT	WEIGHT %	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %		
1	Preliminaries Works	\$	3.075,00		\$	1.350,00	1,75%	\$	-	\$	1.350,00	1,75%
2	Class Room Building C	\$	56.904,27		\$	10.684,96	13,83%	\$	2.607,12	\$	13.292,08	17,21%
3	Provisional Sum for Site Works	\$	7.933,38		\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%
Total Construction Cost		\$	67.912,65		\$	12.034,96	15,58%	\$	2.607,12	\$	14.642,08	18,95%
Overhead		\$	6.340,00		\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%
Contingency		\$	3.000,00		\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%
Grand Total		\$	77.252,65		\$	12.034,96	15,58%	\$	2.607,12	\$	14.642,08	18,95%

prepared by :

Verify by :

Approved by :

Eng. Merinho Suco Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileu

Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio no Be'e Mos

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validacao de Qualidade



REPUBLICA DE TIMOR-LESTE

1975

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO

ADN, LP.

Agência de Planeamento Nacional, Estruturas Públicas

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : Konstrusaun Salas de Aulas 3					
Kompanha : Grupo Kominutario					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	04/08/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T'ADN	1
					2
					3
					4
					5
II	04/08/2022	Aileu, Aileu Villa	Joao dos Reis Mendes	MEJD - DNDPE	1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5
ADN Agência de Planeamento Nacional, Estruturas Públicas INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Altitude: 945m Merinho Lopes ST Index number: 5486 4 Agt 2022 12:00:36 PM					Asinatura



ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU

No. kontratu : NCB: 01/MEJD/DNA/2021

Data Inspesaun : 24 Agosto 2022

Fatin Inspesaun : Aileu Villa, Aisirimou

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.709141 Latetude : 125.74044227

End Point : Long :, Latetude :

Naran Inspector : 1 Merinho Cuco Lopes de Araújo

2.

3.

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu installa Zincalume

Instala Zincalume ba iha Escritorio





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data


Naran Projeto : KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU
No. kontratu : NCB: 01/MEJD/DNA/2021

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu **rangka Plafon**

Plesteran ba iha Coloum

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

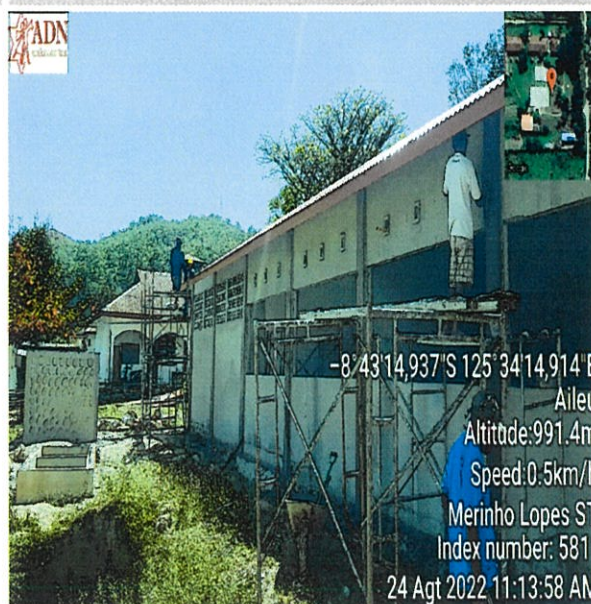

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ALV - 7)

Back-up Data

Naran Projeto : KONSTRUSAUN SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO + LABORATORIO
ESTV AILEU
No. kontratu : NCB: 01/MEJD/DNA/2021

Sketch Item servisu **Finishing ba tembok**
Eskritorio

Finishing nebe maka kompanhia halo uza
semente mutin



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 7)

TÍTULO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO SALAS DE AULAS 3 + ESKRITORIO 1A
TECNICA VOCACIONAL

FATIN PROJETO : AILEU

DONO DO PROJETO : MINISTERIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO

NO	WORK DESCRIPTION	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING			UP TO DATE	
		AMOUNT USD	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT %	AMOUNT	WEIGHT
I	Preliminaries Works	\$ 2.925,00	\$ 2.925,00	1,71%	\$ -	0,00%	\$ 2.925,00	1,71%
II	Class Room Building C	\$ 56.741,73	\$ 37.375,98	21,85%	\$ 3.918,92	2,29%	\$ 41.294,90	24,14%
III	Teacher Office	\$ 83.864,91	\$ 29.883,69	17,47%	\$ 9.628,00	5,63%	\$ 39.511,70	23,10%
V	Provisional Sum for Site Works	\$ 5.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
A	CONSTRUCTION COST	\$ 148.531,64	\$ 70.184,67	41,02%	\$ 13.546,92	7,92%	\$ 83.731,59	48,94%
B	CONTRACTOR FEE (10% x A)	\$ 14.853,16	\$ 7.018,47	4,10%	\$ 1.354,69	0,79%	\$ 8.373,16	4,89%
C	OVERHEAD	\$ 4.340,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
D	TAX (2% x (A+B+C))	\$ 3.354,50	\$ 1.544,06	0,90%	\$ 298,03	0,17%	\$ 1.842,10	1,08%
E	TOTAL COST (A+B+C+D)	\$ 171.079,30	\$ 78.747,20	46,03%	\$ 15.199,65	8,88%	\$ 93.946,85	54,91%

prepared by :

Verify by :

Approved by :

Eng. Merinho Curo Lopes de Araujo
Teknik ADN Aileen


Arch Francisco Xavier de Deus Ieronimo
Engenheiro Senior na Projeto Edificio no Be e Mos

Eng. Emerenciana Da Costa Maia
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade

ANEXUD (ALV - 7)



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : Konstrusaun Salas de Aulas 3 + Eskritorio ESTV					
Kompanha : Mortiles Unip.Lda					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	24/08/2022	Aileu, Aileu Villa	Merinho Cuco Lopes de Araujo	T 'ADN	1
					2
					3
					4
					5
II	24/08/2022	Aileu, Aileu Villa	Joao dos Reis Mendes	MEJD - DNDPE	1
					2
					3
					4
					5
III	24/08/2022	Aileu, Aileu Villa	Rodolfo dos Reis Mendes	T. Kompanhia	1
					2
					3
					4
					5
IV					1
					2
					3
					4
					5
V					1
					2
					3
					4
					5

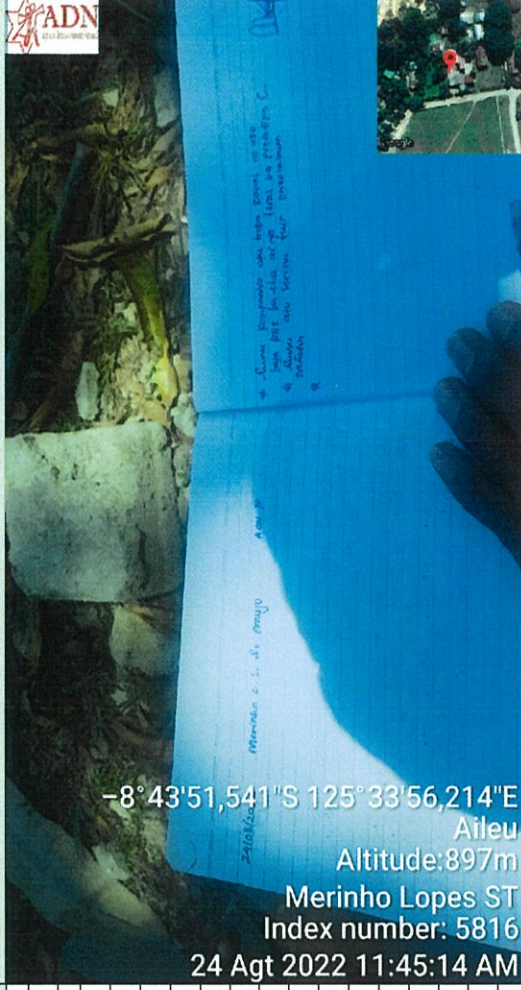

Asinatura

ADN



 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIA GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Merinho Cuco L. de Araujo						2022																																
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Agustus																														OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	15	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubessi	MEJD PKRIE EBF FATUBESSI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																ON GOING
							Actual																																
	16	New Construction Of Fence At CSI Aileu	BEHALE INTERPRICE	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-230	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
REMEXIO (RE)	1	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Fatubutik	MEJD PKRIE EBF FATUBUTIK	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																ON GOING
							Actual																																
	2	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBC Mau-Meta	MEJD PKRIE EBC MAU-META	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																ON GOING
							Actual																																
LEQUIDOE (LQ)	1	New Construction of Health Post and Doctor's House Buiding in Aileu, Lequidoe / Fatuberli, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-073	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																ON GOING
							Actual																																
	2	Konstrusaun ka rehabilitasaun ba ESG Dom Tomas	MEJD PKRIE ESG DOM TOMAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																ON GOING
							Actual																																
	3	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Ubadan	MEJD PKRIE EBF URBADAN	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																ON GOING
							Actual																																
	4	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba EBF Manucasa	MEJD PKRIE EBF MANUCASA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM - TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																ON GOING
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							


Note:
 Planu Periode inspesaun iha tereinu
 Implementa Planu Periode Inspensaun iha T
 Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili
 Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(Merinho Cuco L. de Araujo)
Eng. Municipio Aileu

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Mala Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade

Aprova Husi :

(Eng. Janurio Mala Gutierrez)
Adjunto Director Executivo

ANEXU C1 (AVL - 22)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli- Fatubosa Chainage
0+000 - 7+300 Aileu Municipality**

No. kontratu : **MOP-W-NCB-21025**

Data Inspesaun : 19 / 08 / 2022

Fatin Inspesaun : Daisoli – Fatubosa, Aileu Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. -8.8378668), Latetude : (E. 125.5386965)

End Point : Long : (S. 8.83794), Latetude : (E. 125.53863)

Naran Inspector : **1. Eng. Rui Lopes
2. Eng. Celvio J. Alves**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Cement concrete pavement - plum concrete

Cement concrete pavement - plum concrete


Naruk = 45 m

Naruk = 45 m

Mahar = 0.15 m

Luan = 4 m

Total = 27 m³

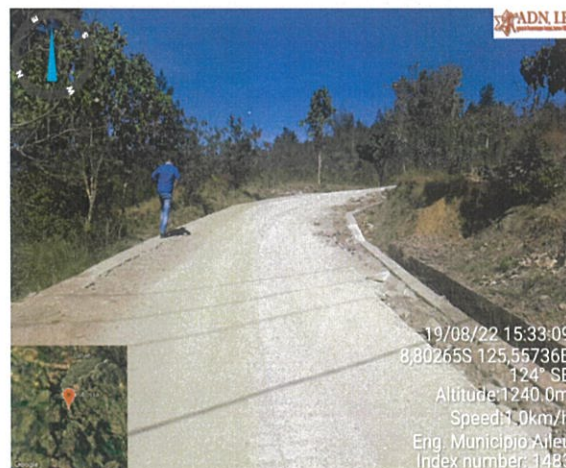

ANEXU C1 (AVL - 22)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli- Fatubosa Chainage
0+000 - 7+300 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-W-NCB-21025



Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu :

Stone masonry - finished

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Stone masonry - finished

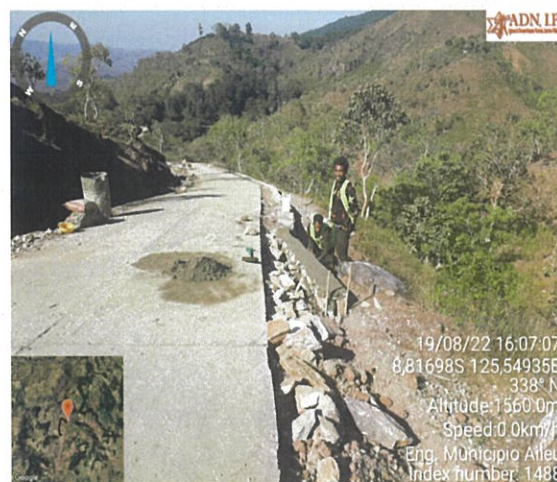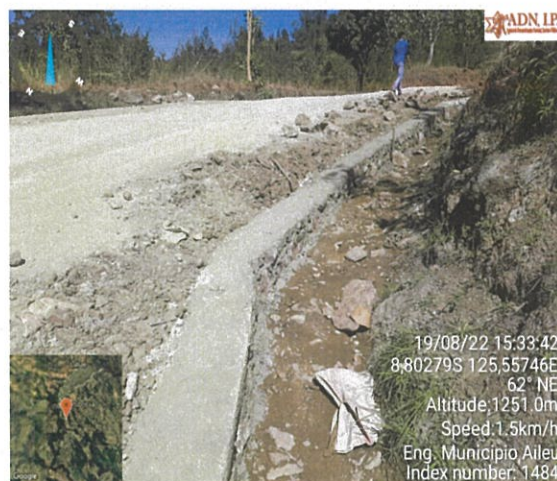

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Daisoli - Fatubosa Chainage Star 0+000 - 7+300 Aileu Municipality					
Kompanha : Aileu ba Oin Unipessoal Lda					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	19/08/2022	Aileu / Aileu Villa	Rui Lopes & Celvito J. Alves	Eng. ITI ADN Aileu	
 19/08/22 15:59:12 8,79980S 125,57827E 94° E Eng. Municipio Aileu Index number: 1486					Asinatura



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Investigação
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (ALV - 22)

SAMMARY

Road name Daisoli - Fatubosa
Municipality Allen
Postu Allen Vila
Sukos Fatubosa

Chainage start 0 + 000
Chainage end 7+300
Length 7.3 KM
Contracor Allen Ba Oin Unip. Ida

Item	Description	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS PREVIOUS JULY 2022		PROGRESS MONITORING AUGUST 2022		PROGRESS MONITORING PROJECT	
		CONTRACT AMOUNT (\$)	%	AMOUNT (\$)	%	AMOUNT (\$)	%	Progres Phisic Up To Date	%
R-01	General	\$ 2.640.00	2.95%	\$ 640.00	0.71%	\$ -	0.00%	\$ 640.00	0.71%
R-03	Earth work	\$ 10.575.57	11.81%	\$ 1.111.02	1.24%	\$ 183.22	0.20%	\$ 1.294.23	1.44%
R-05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 3.571.33	3.99%	\$ -	0.00%	\$ 405.35	0.45%	\$ 405.35	0.45%
R-08	Structures	\$ 31.460.10	35.12%	\$ 19.428.65	21.69%	\$ 4.944.72	5.52%	\$ 24.373.37	27.21%
R-10	Dayworks	\$ 140.00	0.16%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 15.303.50	17.08%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 250.00	0.28%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction cost	\$ 63,940.49	71.38%	\$ 21,179.67	23.64%	\$ 5,533.27	6.18%	\$ 26,712.93	29.82%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 6,394.05	7.14%	\$ 2,117.97	2.36%	\$ 553.33	0.62%	\$ 2,671.29	2.98%
C	General items	\$ 17,484.84	19.52%	\$ 10,061.75	11.23%	\$ 254.75	0.28%	\$ 10,316.50	11.52%
D	Construction tax (A+B+C x 2%)	\$ 1,756.39	1.96%	\$ 667.19	0.74%	\$ 126.83	0.14%	\$ 794.01	0.89%
E	Total	\$ 89,575.77	100.00%	\$ 34,026.57	37.99%	\$ 6,468.17	7.22%	\$ 40,494.74	45.21%

Prepara Husi :

(Eng. Celvito Alves)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Prepara Husi :

(Eng. Rui Lopes)
Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verifica Husi :

(Eng. Remigio da C. do Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Sertifica Husi :

(Eng. Emerenciana da C. Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

ANEXU C1 (AVL - 23)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Periodik Maintenance Kirlelo - Laclo Chainage Star
0+000 - 11+300 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-W-NCB-21025

Data Inspesaun : 19 / 08 / 2022

Fatin Inspesaun : Kirlelo Laclo – Aileu Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.81757), Latetude : (E.125.49602)

End Point : Long : (S. 8.81747), Latetude : (E. 125.49592)

Naran Inspector : 1. Eng. Rui Lopes
2. Eng. Celvio J. Alves


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Cement concrete pavement - plum concrete

Cement concrete pavement - plum concrete

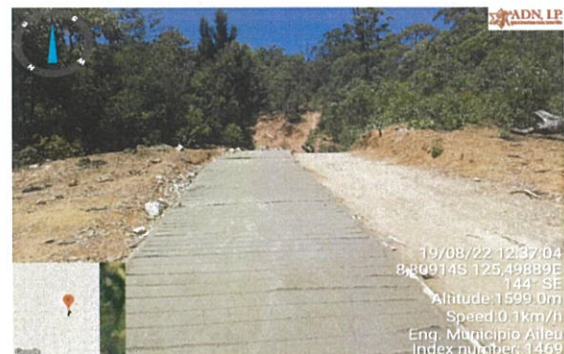

ANEXU C1 (AVL - 23)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Periodik Maintenance Kirlelo - Laclo Chainage Star
0+000 - 11+300 Aileu Municipality

No. kontratu : MOP-W-NCB-21025

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Excavation and disposal - soft soil


Excavation and disposal - soft soil



Stone masonry - finished




Stone masonry - finished

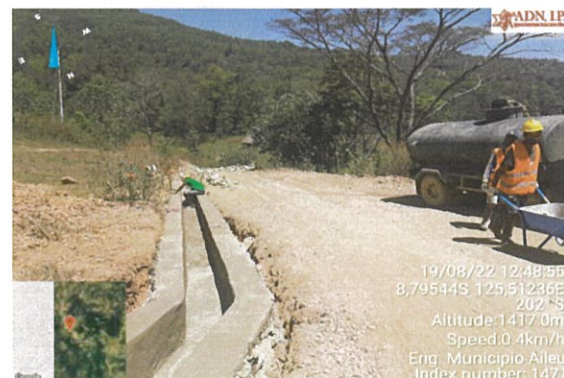

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kirelo - Lacle Chainage
0+000 - 11+300, Aileu Municipality

Kompanha : Fikikay Unip. Lda

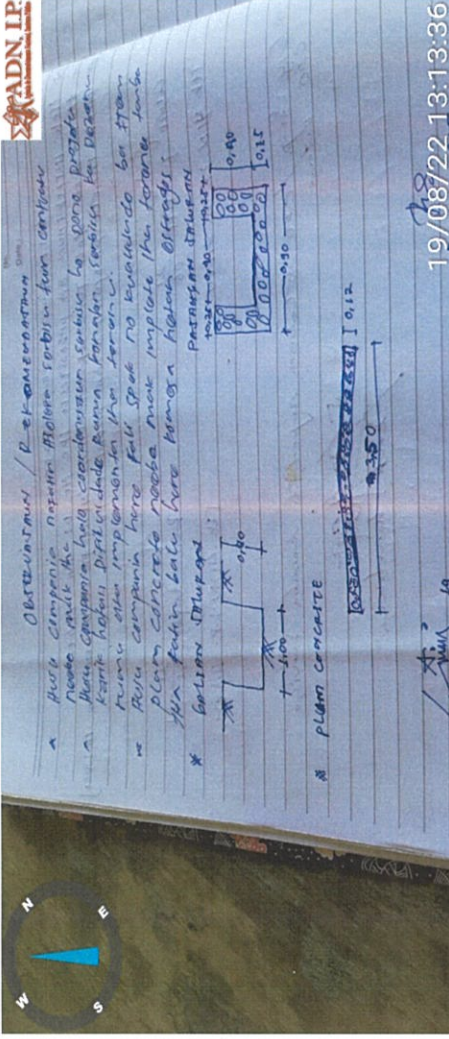No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	19/08/2022	Aileu / Aileu Villa	Rui Lopes & Celvio J. Alves	Eng. ITI ADN Aileu		 OBSERVASIAUN / REKOMENDASIAUN 19/08/2022 13:13:36 8,79594S 125,51348E 309° NW Altitude: 1438.0m Speed: 0.0km/h Eng. Municipio Aileu Index number: 1475	 



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C2 (AVL - 23)

Summary

Roads Name : Kiriolo - Lacio
Contractor : Fikikay Unip. Lda
Contract No. : MPW - W - 210147
Contract Value : \$ 339,829.64

Pay item No.	DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS PREVIOUS JULY 2022		PROGRESS MONITORING AUGUST 2022		PROGRESS MONITORING PROJECT	
		CONTRACT AMOUNT (\$)	RELATIVE WEIGHTAGE %	AMOUNT (\$)	%	AMOUNT (\$)	%	Progres Phisic Up To Date	
								AMOUNT (\$)	%
R-01	General	\$ 6,875.00	2.02%	\$ 2,862.50	0.84%	\$ 262.50	0.08%	\$ 3,125.00	0.92%
R-03	Earth work	\$ 73,511.02	21.63%	\$ 67,832.38	19.96%	\$ 5,016.79	1.48%	\$ 72,849.17	21.44%
R-05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 60,398.77	17.77%	\$ 19,907.29	5.86%	-	0.00%	\$ 19,907.29	5.86%
R-08	Structures	\$ 120,900.85	35.58%	\$ 83,398.52	24.54%	\$ (379.05)	-0.11%	\$ 83,019.47	24.43%
R-10	Dayworks	\$ 140.00	0.04%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
R-11	Routine maintenance	\$ 20,570.80	6.05%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 250.00	0.07%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
A	Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R-11+R-15)	\$ 282,646.44	83.17%	\$ 174,000.68	51.20%	\$ 4,900.24	1.44%	\$ 178,900.92	52.64%
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 28,264.64	8.32%	\$ 17,400.07	5.12%	\$ 490.02	0.14%	\$ 17,890.09	5.26%
C	General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 22,255.23	6.55%	\$ 12,381.00	3.64%	\$ 3,996.00	1.18%	\$ 16,377.00	4.82%
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 6,683.33	1.96%	\$ 4,075.64	1.20%	\$ 187.73	0.06%	\$ 4,263.36	1.25%
E	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 339,829.64	100.00%	\$ 207,857.39	61.17%	\$ 9,573.99	2.82%	\$ 217,431.37	63.98%

Prepara Husi :

(Eng. Celysio V. Alves)

Prepara Husi :

(Eng Rui Lopes)

Verifika Husi :

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)

Sertifika Husi :

(Eng. Emerendina da C. Maia Freitas)

Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

(Eng. Emerendina da C. Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

ANEXU C1 (LA - 10)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ornai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumau - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality**

No. kontratu : **MPW-W- 210141**

Data Inspesaun : 04 / 08 / 2022

Fatin Inspesaun : Laulara Ornai, Acumau-Aicorema

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.62316), Latetude : (E.125.67241)

End Point : Long : (S. 8.712861), Latetude : (E. 125.682038)

Start Point : Long : S. -8.6016129, Latetude : E. 125.5958755

End Point : Long : S. -8.6182826, Latetude : E. 125.564619

Naran Inspector : **1. Eng. Celvio Justino Alves**
2. Eng. Rui Lopes

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Projeto refere Kompania laiha atividade
servico iha tereno



ANEXU C1 (RE - 1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Road Periodik Maintenance Hero - Remexio Star 0+000 -
10+400 Dili & Aileu Municipality / 162

No. kontratu : MPW.W-1900081

Data Inspesaun : 03 / 08 / 2022

Fatin Inspesaun : Hera - Liurai

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.53766), Latetude : (E.125.69851)

End Point : Long : (S. 8.58575), Latetude : (E. 125.69991)

Naran Inspector : Eng. Rui Lopes
Eng. Celvio J. Alves

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Kompania halo servico rehabilita fali plum
concrete nebe nakfera iha tereno



ANEXU C1 (ALV – 2)

Back-up Data

Naran Projeto : Road Rehabilitation of Remexio to Laclo Sta 0+000-20+000 Package
I Aileu Municipality

No. kontratu : SSS / 139 / MOPTC - 2017

Data Inspesaun : 04 – 08 - 2022

Fatin Inspesaun : Remexio

Koordinadas :

Start Point : Long : S. -8.61182, Latetude: E. 125.66034

End Point : Long : S. -8.61741, Latetude: E. 125.76524

Naran Inspector : 1. Eng. Rui Lopes


2. Eng. Celvio Justino Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Kompania stock hela material iha tereno
atu kontinua fali servisu

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

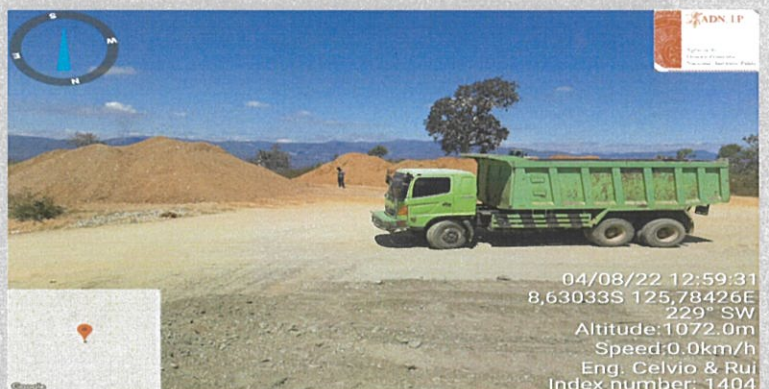



ANEXU C1 (RE – 3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality**

No. kontratu : **MPW-W-210068**

Data Inspesaun : **03 / 08 / 2022**

Fatin Inspesaun : **Hera - Liurai**

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.557405), Latetude : (E.125.709941)

End Point : Long : (S. 8.562408), Latetude : (E. 125.715361)

Naran Inspector : **Rui Lopes**

: **Celvio J. Alves**

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu : Cement concrete
pavement - plum concrete

Naruk : 105 m

Luan : 2.00 m

Mahar : 0.12 m


$$= 25.20 \text{ m}^3$$

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Cement concrete pavement - plum concrete

Naruk : 80 m

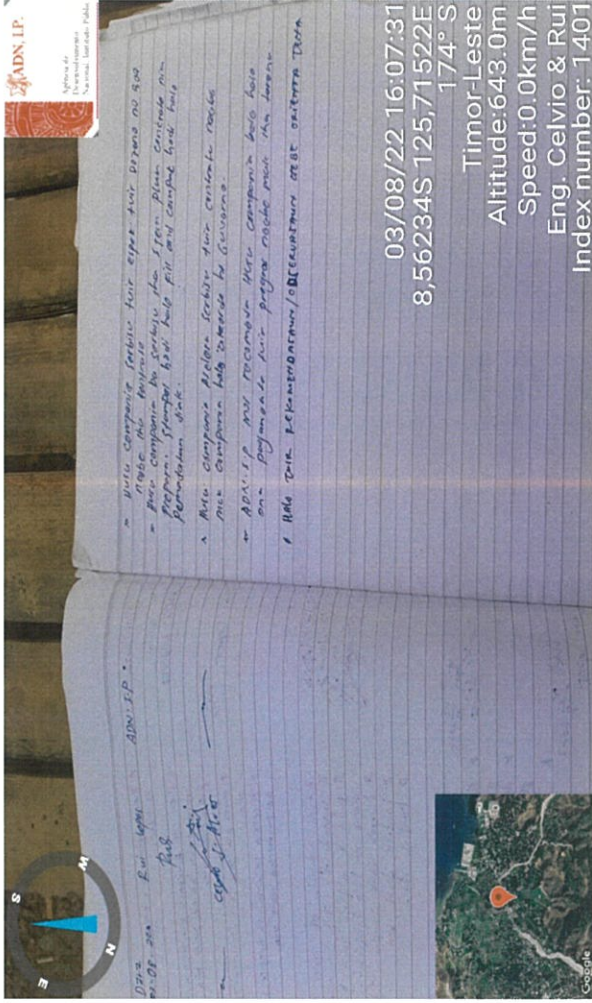

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN					
Naran projeto : Spot Improvement Hera - Liurai Star 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality					
Kompanha : Lonacca Unip.Lda					
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No
I	8/03/2022	Aileu / Remexio, Liurai	Rui Lopes & Celvio J. Alves	Eng. ITI ADN Aileu	
 03/08/22 16:07:31 8,56234S 125,71522E 174° S Timor-Leste Altitude: 643.0m Speed: 0.0km/h Eng. Celvio & Rui Index number: 1401					Asinatura

ANEXU C2 (Re - 3)

: SPOT IMPROVEMENT HERA - LIURAI STAR 4+00 - 10+400 DILI
AND AILEU MUNICIPALITY
: HERA - LIURAI, DILI - AILEU
: LONACCA UNIPessoal LDA

NAME OF PROJECT
LOCATION OF PROJECT
NAME OF CONTRACTOR



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VULGARMENTE INSTITUCIONAL



Backup Data

ITEM NO.	ITEM DESCRIPTION	ORIGINAL CONTRACT		PROGRESS PREVIOUS JULY 2022		PROGRESS MONITORING AUGUST 2022		PROGRESS MONITORING PROJECT		REMARKS
		Amount (USD)	% Billed	Cost (US)	% Billed	Cost (US)	% Billed	Cost (US)	% Billed	
1	General	\$ 1,780.00	0.79%	\$ 450.00	0.20%	\$ 400.00	0.18%	\$ 850.00	0.38%	
2	Drainage	\$ 44.00	0.02%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
3	Earth work	\$ 9,319.22	4.13%	\$ -	0.00%	\$ 254.00	0.11%	\$ 254.00	0.11%	
4	Sub-base, Base and Pavement	\$ 1,998.38	0.89%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
5	Structures	\$ 148,158.85	65.64%	\$ 35,138.84	15.57%	\$ 3,298.68	1.46%	\$ 38,437.52	17.03%	
6	Dayworks	\$ 182.00	0.08%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
7	Routine maintenance	\$ 7,458.00	3.30%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
8	Provisional sum	\$ 2,000.00	0.89%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
9	Security	\$ 1,440.00	0.64%	\$ 240.00	0.11%	\$ 120.00	0.05%	\$ 360.00	0.16%	
10	Project team	\$ 14,820.00	6.57%	\$ 1,000.00	0.44%	\$ 1,970.00	0.87%	\$ 2,970.00	1.32%	
11	Safety and protection	\$ 5,249.50	2.33%	\$ -	0.00%	\$ 2,229.75	0.99%	\$ 2,229.75	0.99%	
12	Meetings	\$ 120.00	0.05%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
13	Ceremonial costs	\$ 300.00	0.13%	\$ -	0.00%	\$ 150.00	0.07%	\$ 150.00	0.07%	
14	Mineral fees	\$ 11,324.99	5.02%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	Construction cost (R-01+R-03+R-05+R-08+R-10+R-11+R-15)	\$ 170,940.45	75.73%	\$ 35,588.84	15.77%	\$ 3,952.68	1.75%	\$ 39,541.52	17.52%	
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 17,094.04	7.57%	\$ 3,558.88	1.58%	\$ 395.27	0.18%	\$ 3,954.15	1.75%	
C	General items (G-01+G-03+G-04+G-05+G-06+G-07)	\$ 33,254.49	14.73%	\$ 1,240.00	0.55%	\$ 4,469.75	1.98%	\$ 5,709.75	2.53%	
D	Construction tax (A+B+C) x 2%	\$ 4,425.78	1.96%	\$ 807.75	0.36%	\$ 176.35	0.08%	\$ 984.11	0.44%	
E	Total contract cost (A+B+C+D)	\$ 225,714.76	100.00%	\$ 41,195.48	18.25%	\$ 8,994.06	3.98%	\$ 50,189.53	22.24%	

Prepara Husi :

(Eng. Rui Lopes)

Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Prepara Husi :

(Eng. Celso J. Alves)

Eng. ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verifica Husi :

(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)

Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Sertifica Husi :

(Eng. Emerenciana da V. Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

ANEXU C1 (LE - 3)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 8+200, Namalesu - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hautoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+500 Municipality Aileu / 162

No. kontratu : MPW-W-190103

Data Inspesaun : 17 / 08 / 2022

Fatin Inspesaun : Namalesu-Faturilao, Fahisoi-Dairlouta, Fahisoi-Fadabloko & Hautoho-

LiquicaKoordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.66548), Latetude : (E.125.63993)

End Point : Long : (S. 8.68859), Latetude : (E. 125.69591)

Start Point : Long : (S. 8.67332), Latetude : (E. 125.67745)

End Point : Long : (S. 8.66514), Latetude : (E. 125.69477)

Naran Inspector : Eng. Rui Lopes


Eng. Celvio J. Alves

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Projeto refere Kompania laiha atividade
servico iha tereno

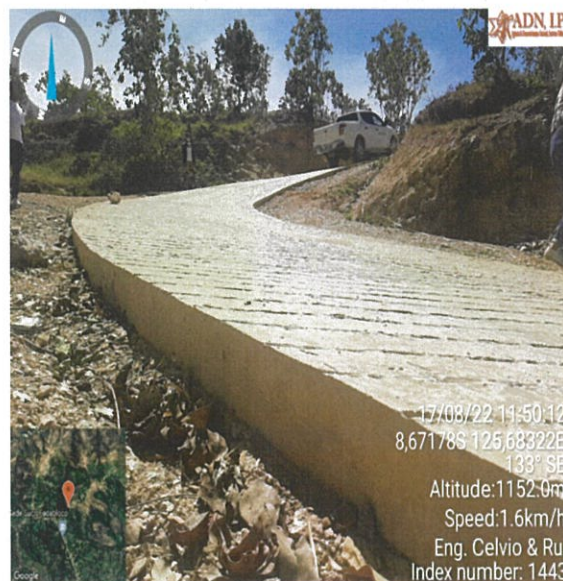



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (Le-7)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Namalesu - Faturilao Chainage
0+000 - 14+000

No. kontratu : MPW - W - 21027

Data Inspesaun : 23 / 08 / 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe, Namalesu, Asbilitoho, Berleu and Faturilao

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.709305), Latetude : (E.125.713868)

End Point : Long : (S. 8.712861), Latetude : (E. 125.682038)


Naran Inspector : 1. Eng. Rui Lopes
2. Eng. Celvio J. Alves

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu :

Projeto refere Kompania laiha atividade
servico iha tereno

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

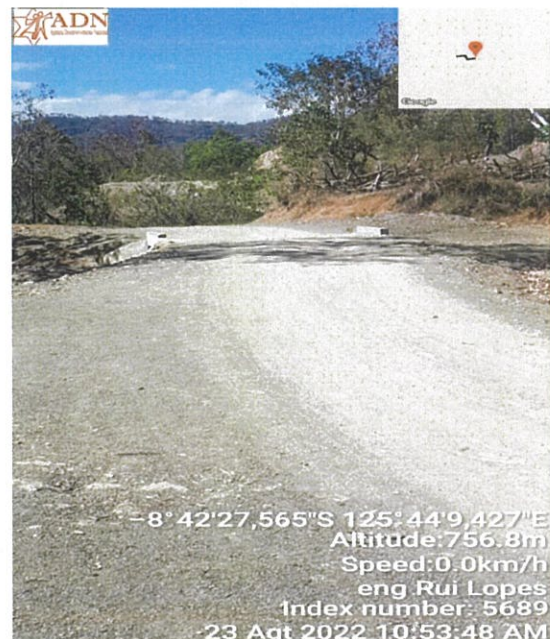

ANEXU C1 (LE – 8)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality**

No. kontratu : **MOP-CD-NCB-21026**

Data Inspesaun : 17 / 08 / 2022

Fatin Inspesaun : Lequidoe

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.66535), Latetude : (E.125.63998)

End Point : Long : (S. 8.68859), Latetude : (E. 125.69591)

Start Point : Long : (S. 8.67332), Latetude : (E.125.67735)

End Point : Long : (S. 8.66514), Latetude : (E. 125.69477)

Naran Inspector : **Rui Lopes**


: **Celvio J. Alves**

Sketch & Foto Desenho


Sketch Item servisu : Excavation and disposal
- hard soil and Stone masonry – finished

80 m

Excavation





Stone masonry

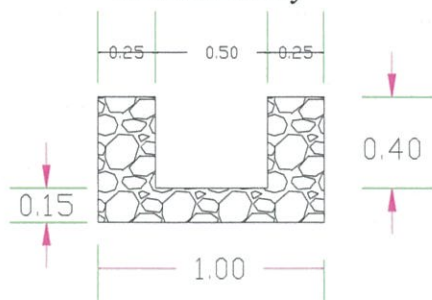

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Excavation and disposal - hard soil and
Stone masonry – finished 80 m

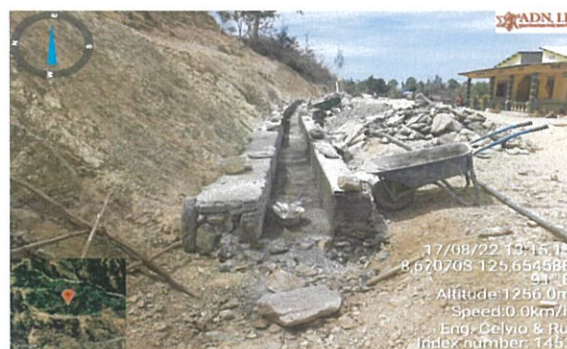



INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloko Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality				
Kompanha : Blackbird Unip. Lda JV Chaicailala Unip. Lda				
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun
I	17/08/2022	Aileu / Lequidoe	Rui Lopes & Celvio J. Alves	Eng. ITI ADN Aileu
ONCEUNTAUN / REKOMENDASAUN * HUSU KOMPANIA ATU PREPARA LIVRO BARRAKA IKA, GUARAS * HUSU KOMPANIA ATU KONTATUA SEBUKO JHA TERENO * HUSU KOMPANIA ATU HABA TUR REKOMENDASAUN HEDE TE TENA CELVIO J. ALVES ADN. I.P. M. AILEU Rui Lopes ADN. I.P. M. AILEU 17/08/22 14:06:08 8,70785S 125,63712E 109° E Altitude: 1400.0m Speed: 0.0km/h Eng. Celvio & Rui Index number: 1459				
				Asinatura

ANEXU C2 (LE - 8)

Summary

Road name	Fahiso - Fadaboko and Hantoho - Lajissa
Municipality	Alatu
Portu	Remexio
Sukos	Fahiso, Maumeta, Fadaboko and Hantoho

Change start	0 + 000
Change end	9+000
Length	9.0 KM
Contractor	BLACKBIR UNIP, LDA JV CHACAILALA UNIP, LDA

Item	Description	Original Contract		Revised BoQ-1		PROGRESS PREVIOUS JUNE 2022		PROGRESS MONITORING AUGUST 2022		PROGRESS MONITORING PROJECT		REMARKS
		Price (USD)	%	Revised Cost \$	%	Cost \$	%	Aug-22		Progres Plasic Up To Date		
								Cost \$	%	Cost \$	%	
R-01	General	\$ 5,170.00	2.78%	\$ 5,170.00	2.78%	\$ -	0.00%	\$ 3,100.00	1.67%	\$ 3,100.00	1.67%	
R-03	Earth work	\$ 7,994.58	4.30%	\$ 7,994.62	4.30%	\$ -	0.00%	\$ 5,784.55	3.11%	\$ 5,784.55	3.11%	
R-05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 5,129.86	2.76%	\$ 5,129.86	2.76%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
R-08	Structures	\$ 99,157.11	53.29%	\$ 99,157.52	53.29%	\$ -	0.00%	\$ 1,612.78	0.87%	\$ 1,612.78	0.87%	
R-10	Dayworks	\$ 280.00	0.15%	\$ 280.00	0.15%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
R-11	Routine maintenance	\$ 19,480.00	10.47%	\$ 19,480.00	10.47%	\$ -	0.00%	\$ 105.00	0.06%	\$ 105.00	0.06%	
R-13	Provisional sum	\$ 200.00	0.11%	\$ 200.00	0.11%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	Construction cost	\$ 137,411.55	73.84%	\$ 137,412.00	73.84%	\$ -	0.00%	\$ 10,602.33	5.70%	\$ 10,602.33	5.70%	
B	Contractor Fee (A x 10%)	\$ 13,741.15	7.38%	\$ 13,741.20	7.38%	\$ -	0.00%	\$ 1,060.23	0.57%	\$ 1,060.23	0.57%	
C	General Items	\$ 31,282.65	16.81%	\$ 31,282.67	16.81%	\$ -	0.00%	\$ 8,849.00	4.76%	\$ 8,849.00	4.76%	
D	Construction tax (A+B-C x 2%)	\$ 3,648.71	1.96%	\$ 3,648.72	1.96%	\$ -	0.00%	\$ 410.23	0.22%	\$ 410.23	0.22%	
E	Total	\$ 186,084.05	100.00%	\$ 186,084.58	100.00%	\$ -	0.00%	\$ 20,921.79	11.24%	\$ 20,921.79	11.24%	

Prepara Husi :

 (Eng. Rui Lopes)
 Eng. ba Projeto Infraestrutura,
 Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Prepara Husi :

 (Eng. Carlos Alves)
 Eng. ba Projeto Infraestrutura,
 Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Verifica Husi :

 (Eng. Renato C. dos Santos)
 Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
 Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Serifica Husi :

 (Eng. Emerencio da C. Maia Freitas)
 Coordenadora da Unidade de Controlo e
 Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

ANEXU C1 (LE - 9)

Back-up Data

Naran Projeto : **R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi- Dairlouta Chainage
0+000 - 5+000 Aileu Municipality**

No. kontratu : **MOP-CD-RFQ-21012**

Data Inspesaun : 17 / 08 / 2022

Fatin Inspesaun : Fahisoi – Fadabloko, Hautoho-Liquica, Lequidoe

Koordinadas :

Start Point : Long : (S. 8.69148), Latetude : (E.125.63555)

End Point : Long : (S. 8.68859), Latetude : (E. 125.69591)

Naran Inspector : **1. Eng. Celvio J. Alves**


2. Eng. Rui Lopes

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu :

Projeto refere Kompania laiha atividade
servico iha tereno

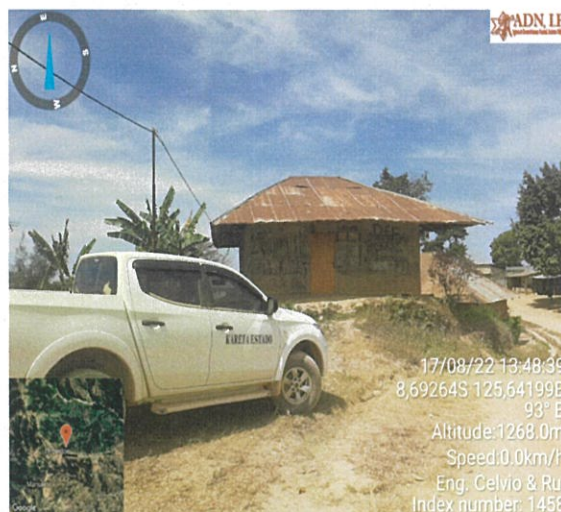

 <						
---	--	--	--	--	--	--

Note.

	Planu Periode inspesaun iha terenu		Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu		Relatorio avaliasuan mensal iha Dili		Inspesaun Proceso Pagamentu
---	------------------------------------	--	--	---	--------------------------------------	---	-----------------------------

Prepara Husi.

(Eng. Celvio Justino Alves)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun ADN, I.P.

Sertifika Husi.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi.

(Eng. Joaquim Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.

MINISTERIO DO PLANO E COORDENAMENTO ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Novos Modelos, Inovação Pública								PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng.	Rui Lopes							2022																															
Município	MUNICIPIO AILEU NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Agosto																															OBS
AILEU VILA (AVL)	1	Rehabilitation of Sioi Tocoluli roads Aileu	Mendith UnipLda	SSS/061/MOPTK-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Pagamento ikus (FHO) 100% baseia ba progresso rekomendasaun iha Setembro 2019 Falta Retensaun (FHO)			
							Actual																																
	2	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000 Munisipiun Aileu	Caviq Unipessoal Lda in joint venture with Stunimes Unip. Lda	NCB/020/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projeto refere Kompania laiha atividade servico iha terreno			
							Actual																																
	22	R4D Rural Road Spot Improvement Daiseli- Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300	Aileu ba Oin Unip. Lda	MOP-CD-RFQ-21011	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
23	R4D Rural Road Spot Improvement Kirelo - Lacio Chainage 0+000 - 11+300 Aileu Municipality	Fikikay Unipessoal. Lda	MOP-W-NCB-21024	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actual																																	
LAULARA (LA)	3	Rehabilitation of Beducu Sariala Roads (Ex Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	Mejori, Lda	SSS/0103/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Pagamento ikus (FHO) 98.97% baseia ba progresso rekomendasaun iha Junho 2022 Falta Retensaun (FHO)			
							Actual																																
	7	Rural Roads Maintenance Fahisoli - Fadabloco Sta 0+000-8+200, Hotoho - Liqica Sta 0+000 - 2+500 and Laulara - Ormai Sta 0+000 - 7+300 in Aileu Municipality	Remexio Furak Unip Lda	MPWTC-CD-170004	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Pagamento ikus (FHO) 84.68% baseia ba progresso rekomendasaun iha Novembro 2019 Falta Retensaun (FHO)				
							Actual																																
	8	R4D Rural Roads Periodic Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 Routine Maintenance Madabeno - Lisimori Chainage 0+000 - 4+900 and Acumatu - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Municipality Aileu / 162	Fin Los unip Lda	MPW-W190086	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Pagamento ikus (FHO) 88.97% baseia ba progresso rekomendasaun iha Junho 2022 Falta Retensaun (FHO)			
							Actual																																
10	R4D Rural Road Maintenance Laulara - Ormai Chainage 0+000 - 8+000 and Routine Maintenance Acumatu - Aicorema Chainage 0+000 - 2+000 Aileu Municipality	Emmanuel Milenial	MPW-W- 210141	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actual																																	
REMEXIO (RE)	1	Rural Road Periodic Maintenance Hero - Remexio Sta 0+000 - 10+400 Dili & Aileu Municipality / 162	Nautetu I. II Unipessoal Lda	MPW-W-1900081	LM-BS	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Road Rehabilitation of Remexio to Lacio Sta 0+000-20+000 Package I Aileu Municipality	Mendith UnipLda	SSS/139/MOPTC-2017	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	3	Spot Improvement Hera - Lurrai Sta 4+00 - 10+400 Dili and Aileu Municipality	Lonacca Unipessoal Lda	MPW-W-210068	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
LEQUIDOE (LE)	2	R4D MPW Rural Roads rehabilitation Project in Aileu Bereleu manucasa Package 2 Sta. 3+500-13+000	Seiara Irapiiti Unip. Lda	MPWTC-W-015016	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Pagamento ikus (FHO) 97.45% baseia ba progresso rekomendasaun iha Agostos 2017 Falta Retensaun (FHO)				
							Actual																																
	3	R4D Rural Road Maintenance Fahisoi - Fadabloco Chainage 0+000 - 8+200, Namaleu - Faturilau Chainage 0+000 - 12+500, Fahisoi - Dairlouta Chainage 0+000 - 2+600 and Hautoho - Lequica Chainage 0+000 - 2+300 Municipality Aileu / 162	Emmanuel Milenial	MPW-W-190103	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Rural Roads Periodic Maintenance Aituluatulan - Mamfoni Chainage 0+000 - 1+000 and Daiseli - Fatubosa Chainage 0+000 - 7+300, Routine Maintenance Coula Udo Kirelo Chainage 0+000 - 7+000 Municipality Aileu / 162	LNG Unip. Lda	MPW-W-190174	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Pagamento ikus (FHO) 98.25% baseia ba progresso rekomendasaun iha Janeiros 2022 Falta Retensaun (FHO)				
							Actual																																
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Namaleu - Faturilau Chainage 0+000 - 14+000	LNG Unip. Lda	MPW-W- 210149	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Projeto refere Kompania laiha atividade servico iha terreno			
							Actual																																
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Fahisoi - Fadabloco Chainage 0+000 - 9+000 and Hautoho-Liquica Chainage 0+000 - 2+500 Aileu Municipality	Blackbird Unip. Lda JV Chaicalala Unip Lda	MOP-CD-NCB-21026	LM-CD	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																

Note.

Planu Periode inspesaun iha terenu

Implementa Planu Periode inspesaun iha Terenu

Relatorio avaliasun mensal iha Dili

Inspesaun Processu Pagamentu

Prepara Husi.



(Eng. Rui Lopes)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun ADN, I.P

Sertifika Husi.



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi.



(Eng. Ana Guterres)

Adjunto Director Executivo, ADN, I.P

#ANEXU C1 (LA-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara -
Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu2.

No. kontratu : ICB/018/MOPTC - 2017

Data Inspesaun : 15/ 08/ 2022

Fatin Inspesaun : Laulara- Solerema

Koordinat :

Start Point : Long : -8.60025038, Latetude : 125.588725



End Point : Long : -8.6571395, Latetude : 125.560584

Naran Inspector : 1. Eng. Celvio Justino Alves

2. Eng. Rui Lopes

3. Eng. Vidal Guterres

4. Eng. Augusta da Costa Ferreira

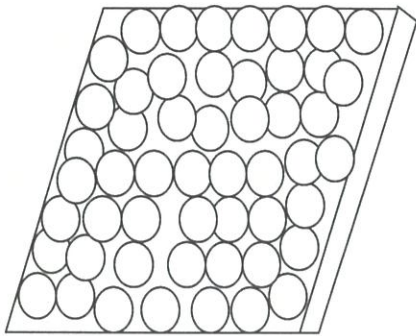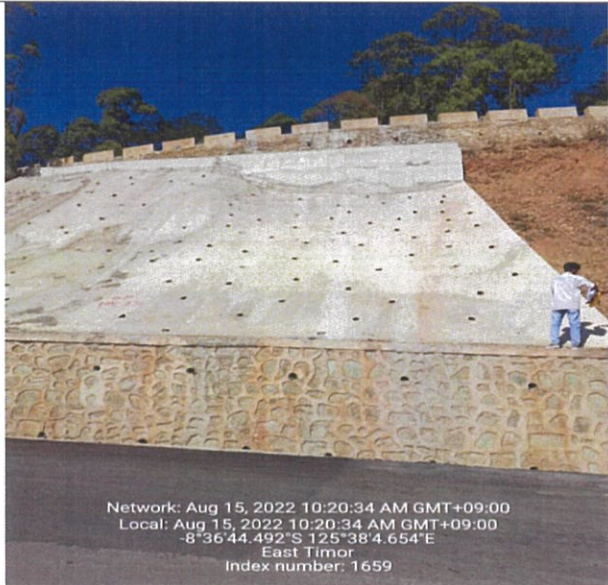
Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha Terreno no Foto Aktual
Sketch Item Servisu Rip Rap 	 Network: Aug 15, 2022 10:20:34 AM GMT+09:00 Local: Aug 15, 2022 10:20:34 AM GMT+09:00 -8°36'44.492"S 125°38'4.654"E East Timor Index number: 1659

#ANEXU C1 (LA-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara -
Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu2.

No. kontratu : ICB/018/MOPTC - 2017


Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha Terreno no Foto Aktual
Sketch Item Servisu Line Ditch 	 15/08/2022 11:12:47 8.6462S 125.5816E 275° W Cotolau Aileu Altitude: 1280.8m Speed: 0.0km/h Eng. ba Projeto Imprestimo

#ANEXU C1 (LA-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara -
Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu2.

No. kontratu : ICB/018/MOPTC - 2017

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha Terreno no Foto Aktual
Sketch Item Servisu Guard Wall 	 15/08/2022 10:36:51 153° SE Eng. ba Projetu Imprestimo



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LA- 6)

Project Name : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu
CONTRACT PACKAGE NO. : ICB 010/MPW-2013
Contractor : CHINA WU YI CO., LTD
IPC no. : IPC. No. 9, 10, 11, 12 & 13

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	TOTAL CONTRACT COST (VO.1)	TOTAL VALUE OF WORK PREVIOUSLY	PERCENT PREVIOUS	TOTAL VALUE OF WORK THIS BILLING FROM IPC. 09, 10, 11, 12 & 13		PERCENT THIS MONTH		TOTAL VALUE OF WORK TO DATE	% TO DATE	BALANCE OF COST TO DATE
		(US Dollar)	(US Dollar)	(US Dollar)	%	(US Dollar)	(US Dollar)	%	%	(US Dollar)	%	(US Dollar)
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 969,673.62	\$ 1,520,228.94	\$ 855,857.07	4.79%	\$ 188,298.81	\$ 81,594.60	0.46%	1.00%	\$ 1,125,750.48	5.98%	\$ 394,478.46
200	EARTHWORKS	\$ 2,405,446.27	\$ 2,702,896.15	\$ 607,523.83	3.40%	\$ 849,634.17	\$ 395,575.66	2.22%	4.51%	\$ 1,852,733.67	9.83%	\$ 850,162.47
300	SUBBASE AND BASE COURSES	\$ 2,789,537.99	\$ 1,978,342.25	\$ -	0.00%	\$ 233,958.61	\$ 628,309.44	3.52%	1.24%	\$ 862,268.05	4.58%	\$ 1,116,074.20
400	SURFACE COURSE	\$ 2,735,606.79	\$ 2,702,997.45	\$ -	0.00%	\$ 139,175.51	\$ 493,939.09	2.77%	0.74%	\$ 633,114.60	3.36%	\$ 2,069,882.84
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 6,768,988.70	\$ 7,453,301.92	\$ 3,309,617.40	18.54%	\$ 1,168,703.67	\$ 1,394,992.26	7.81%	6.20%	\$ 5,873,313.33	31.18%	\$ 1,579,988.59
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 327,593.18	\$ 614,292.23	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 614,292.23
800	BIO ENGINEERING	\$ 280,561.75	\$ 280,561.75	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 280,561.75
DW	DAYWORKS	\$ 341,341.80	\$ 339,955.52	\$ 51,661.96	0.29%	\$ 21,362.32	\$ -	0.00%	0.11%	\$ 73,024.28	0.39%	\$ 266,931.24
	PROVISIONAL SUM AND CONTINGENCY	\$ 632,000.00	\$ 642,361.83	\$ 346,674.93	1.94%	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ 346,674.93	1.84%	\$ 295,686.90
	TOTAL =	\$ 17,250,750.10	\$ 18,234,938.04	\$ 5,171,335.20	28.96%	\$ 2,601,133.10	\$ 2,994,411.05	16.77%	13.81%	\$ 10,766,879.35	57.15%	\$ 7,468,058.68
	PERFORMANCE BASED MAINTENANCE WORKS	\$ 604,551.17	\$ 604,551.17	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 604,551.17
	CONTRACT AMOUNT	\$ 17,855,301.27	\$ 18,839,489.21	\$ 5,171,335.20	28.96%	\$ 2,601,133.10	\$ 2,994,411.05	16.77%	13.81%	\$ -	57.15%	\$ 8,072,609.85
	GRAND TOTAL	\$ 17,855,301.27	\$ 18,839,489.21	\$ 5,171,335.20	28.96%	\$ 2,601,133.10	\$ 2,994,411.05	16.77%	13.81%	\$ 10,766,879.35	57.15%	\$ 8,072,609.85

Inspection By :

(Eng. Celvin Justino Alves)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e Irrigasaun Munisipiu Baucau, ADN, I.P.

(Eng. Rui Lopes)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e Irrigasaun Munisipiu Baucau, ADN, I.P.

(Eng. Tito Edgar F.N. de Jesus)

Eng. PMU ba Projeto (Imprestimu), ADN, I.P.

(Eng. Augusta da Costa Ferreira)

Eng. PMU ba Projeto (Imprestimu), ADN, I.P.

(Eng. Vidal Guerres)

Eng. PMU ba Projeto (Imprestimu), ADN, I.P.


Verifika Husi :


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)


Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e Irigasaun, ADN, I.P.


Sertifika husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade ADN, I.P.


 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		


 #Anexu D (LA-6) 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		


 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		


 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		


 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		


 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		


 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		


 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		


 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		


 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		


 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		


 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha terenu hetan defeitos.	
II			Eng. Rui Lopes		2	Husu ba Konsultan atu nafatin halo supervizaun hodi kontrola maximo servisu iha terenu.	
III			Eng. Vidal Guterres	Eng. ba Projeto PMU (Impréstimo) ADN, I.P.			
IV			Eng. Augusta da Costa Ferreira	3	Husu mos ba Kontraktor ba areia ne'ebe mak comunidade hela besik prezisa rega nafatin rai atu labele fo impakto ba comunidade.		

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 					#Anexu D (LA-6)		
					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620) Municipality Aileu		
					Kompanhia : CHINA WU YI CO.LTD		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	15/08/2022	Laulara-Solerema	Eng. Celvio Justino Alves	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Aileu, ADN, I.P.	1	Husu ba Kontraktor hadia item sira ne'ebe mak iha	

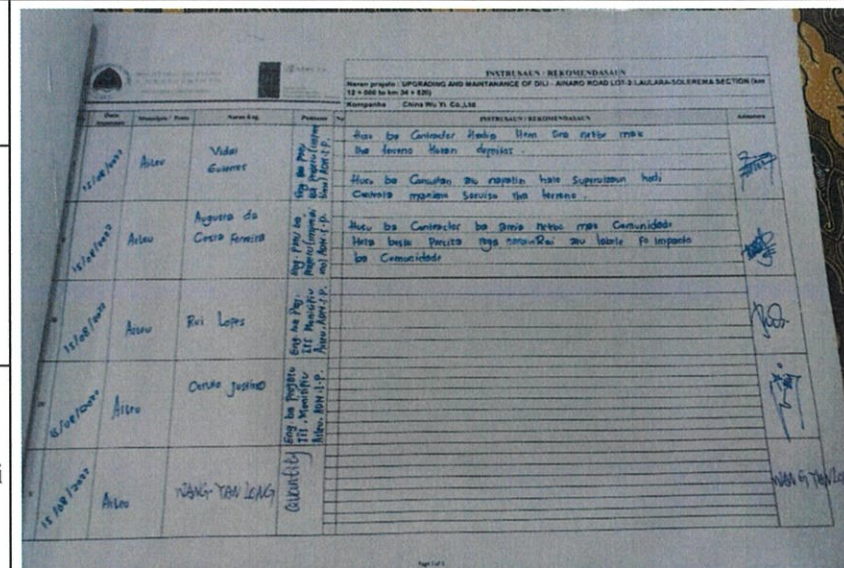

PLANU INSPESAUN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PLANU INSPESAUN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PLANU INSPESAUN

[illegible]

[illegible]

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		Agosto																														
								Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Th	We
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	18	Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of Municipio Roads Package 7 : Seloi - Aileu to Gleno - Ermera (162)	Raya Konsultan LDA	MPW- Cs 2000020	LM	MOP	Plan Actual																															
	19	Preparation of Detail Engineering & Bidding Dokument Preparation for New Bridges in 2019 suco Liurai maubara l Bera Railako, Sanfuk, tutu luru same fahi nehan	Lelo eng. Unip Lda Jv, P/ Multi Kaidi - Gona Jara & PT. Cipta Design Indonesia	MPW-Cs -2000032	LM	MOP	Plan Actual																															
	20	Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of Municipio Roads Package 2 : Uatulari - Iaisorulai	Bragetjot Unip Lda	MPW-CS -2000025	LM	MOP	Plan Actual																															
	21	For Preparation of detailed engineering for Rehabilitation of Municipios Roads Package 12 : Luca to Lacluta	Hilobadi Jv Pt. Siarplan Utama	MPW - CS- 2000022	LM	MOP	Plan Actual																															
	22	Preparation of Detailed Engineering For Rehabilitation of Municipio Roads Package : 1 JCT A - 16 (bobonaro) to lolotoe Town	Hilobadi Jv Pt. Siarplan Utama	MPW - CS- 2000030	LM	MOP	Plan Actual																															
	23	preparation of DED for Rehabilitation of Municipio Roads Package 10 : Soibada to Soibada town	Hilobadi Jv Pt. Siarplan Utama	MPW- CS 2000024	LM	MOP	Plan Actual																															
	24	Preparation of detailed Design for Rahabilitation municipio Roads Package 4 : turiscail to Alas	Wan Husin & Associates SDN. BHD Jv Consultant & eng. Intercontinental Unip Lda	MPW- CS 2000028	LM		Plan Actual																															
	25	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Detile Consultant	MPW- CS 2000029	LM	MOP	Plan Actual																															
	26	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Detile Consultant	MPW- CS 2000027	LM	MOP	Plan Actual																															
	27	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Nicoles Unip Lda	MPW- CS 2000026	LM	MOP	Plan Actual																															
	28	Preparation of Detailed Engineering & bid Preparation for new Bridge in 2019 package 1 : Samalari, sana uatulari- lai sorulai, sumaco (lacluta uma tolu) molas matadoro - RTK, Comoro mota ulun	Vox Da Vinci Consultant Engineering Lda	MPW- CS 2000031	LM	MOP	Plan Actual																															
	29	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Team Consultant Jv ATT & ATT & Triangle	MPW- CS 2000021	LM	MOP	Plan Actual																															
	30	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	Aureum Solis Consultant, Unip Lda Jv PT Bikarna	MPW CS 2000033	LM	MOP	Plan Actual																															
	31	Preparation Deitaled Design for Rahbilitation of Municipios	PT. Bikarna JV Aureum Solis Consultant, Unip Lda	MPW- CS 2000023	LM	MOP	Plan Actual																															
	32	Interfection in the Existing dili liquitos road to chiese alien road front tibar Bay Port	TPF Tufner Unipconsist Lda	REP009/MOP/2019	FI	MOP	Plan Actual																															
	33	Preparation Deitaled Design for Enginering Desing Dili Urban Roads	Kuat Konsultan				Plan Actual																															
	34	Konsultan Supervisi for Konstruction Supervision of daradau irrigation Schema	PT.Suanda karya Jv KWK	REP042/MAP/2017	FI	MOP	Plan Actual																															
TOTAL PROJETO ON-GOING																																						
Note:								Planu Periode inspesaun iha tereinu Implementa Periode inspesaun iha tereinu Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu																														
Prepara Husi :  (Eng. Augusta da Costa Ferreira) Eng. PMU ba Projeto (Imprestimo), ADN, I.P.								Sertifika Husi :  (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas) Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.								Aprova Husi :  (Eng. Januario Maia Guterres) Adjunto Director Executivo, ADN, I.P.								Konsultan la serviso on iha tereno,maibe pagamento seidauk hotu								PHO						

PLANU INSPESAUN

[illegible]

[illegible]

