



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU MANATUTO

JANEIRO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO


IMPLEMENTASAUN PROJETU INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO MANATUTO

JANEIRO 2022

Prepara Husi :



(Eng. Aleixo da Costa Andrade)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P



(Eng. Jose R. Carlos Gusmão)
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P



(Eng. Adonis Julio Fernandes)
Eng. ba Projeto ME, ADN, I.P



(Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. ba Projeto Insfrasturctura e
Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :



(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé
Saneamentu, ADN, I.P



(Eng. Aniceto da Costa)
Eng. Senior ba Projektu Infraestrutura e
Irigasaun, ADN, I.P



(Eng. Deolindo de F. Marques)
Chefe Seksaun ba Projektu M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN. I.P

Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P



INDICE

SUMÁRIO	1
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Manatuto.....	3
1.3. Lista Projectos	7
II. PROGRESU FISIKU	25
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	25
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	26
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	26
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	27
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu.....	27

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto.....	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto	6
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Manatuto Por Fundus Finansiamientos	7
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Manatuto Por Sectores	11
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Manatuto Por Ministerio	18
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto	25

I. INTRODUSAUN.


1.1. Enkuadramentu Legal.

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN nian maka atu aseguira katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeńu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun qualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno karik nesesaria

1.2. Perfil Municipio Manatuto

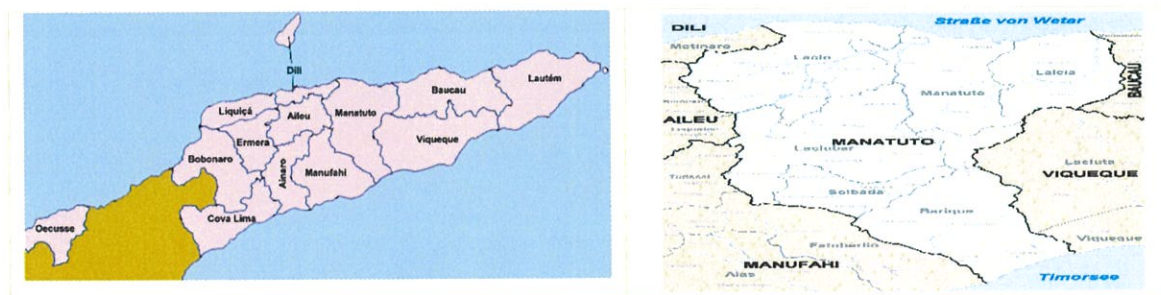

Mapa 2 hatudu pozisaun jeográfika Administrasaun Munisipal Manatuto iha luan 1,706 km² ho populasau nain 42,742 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Manatuto iha Postos Administrativos nen (6), Sukus 29 no aldeias 99, mak hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1 : Postos Administrativos, Sucos no Aldeias.

Natarbora		Laclo		Laklubar		Laleia	
Sukus	Aldeia	Sukus	Aldei	Suku	Aldeia	Sukus	Aldeias
Aubeon	2	Hohorai	4	Batara	4	Cairui	7
Barique	2	Locomesak	5	Hatu ma quere k	3	Hatulara n	3
Fatuwaque	2	Uma kaduak	3	Funar	4	Lifau	3
Manehat	3	Uma naruk	4	Mane lima	6		
Uma Boco	2			-	8		
				Sanan a Na'i	4		
Total	11		18		30		13

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 69

Manatuto		Soibada	
sukus	Aldeia	sukus	aldeias
Ailili	2	Fatuma querek	2
Aitekas	4	Leo-hat	2
Cribas	5	Manlala	2
Iliheu	5	Maun Fahe	2
Ma'abat	2	Somoro	2
Sau	2		
	22		10

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Manatuto

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Manututu								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro	3	3				3	
2	Administrasaun no Financas	0	0				0	
3	Motorista	1	1				1	
4	Seguransa	0	0				0	
Total		4					4	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Manatuto.

ASET ADN,IP MUNICIPIO MANATUTO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio	1	1					
2	Kareta	1	1					
3	Desktop HP / Monitor	1	1					
4	Laptop HP	1	1					
5	Printer Cannon	1	1					
6	UPS	1	1					
7	Armario File	2	2					
8	Armario Tau hena	3	3					
9	Meja escritorio	1	1					
10	Meja han	1	1					
11	Meja TV (kiik)	1	1					
12	Kadeira escritorio	6	6					
13	Kadeira han	4	4					
14	Sofa	1 Set	1 Set					
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3	3 Set	3 Set					
16	Jeleira	1	1					
17	Water Dispenser	1	1					
18	TV + Parabola	1 Set	1 Set					
19	AC	4	4					
20	Kipas Angin	4	4					
21	Kompor	1	1					

22	Kompor Gas	1	1					
23	Rack sepatu	3	3					
24	Rack Piring	1	1					
25	Lampu	11	11					
26	Water Pump Sanyo	1	1					

1.3 : Lista Projectos

Projetu hotu ne'ebe akumula iha lista ne'e bazeia ba dados projetu ne'ebe sei la'o hela no mos projetu ne'ebe abandona ona tinan barak, projetu hirak ne'e fahe tuir lista 1.3.1 Projeto Por Fundus Financiamentos, 1.3.2 Projeto Por Sectors no 1.3.3 Projeto Por Ministerios.

1.3.1 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Fundus Financiamentos

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI+Fundu Covid-19+LM-BS+LM-CD+PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Barique	11	\$ 2,482,015.81	37.43%
2	Laclo	8	\$ 49,669,824.29	73.92%
3	Laclubar	10	\$ 37,186,351.50	77.15%
4	Laleia	4	\$ 4,882,171.02	93.33%
5	Manatuto Villa	14	\$ 45,209,844.83	80.16%
6	Soibada	6	\$ 8,299,455.31	86.29%
	Grand Total	53	\$ 147,729,662.76	77.37%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0.00%
2	Laclo	3	\$ 48,698,873.04	74.18%
3	Laclubar	3	\$ 35,533,229.69	79.69%
4	Laleia	1	\$ 4,434,637.09	100.00%
5	Manatuto Villa	7	\$ 44,188,670.20	81.00%
6	Soibada	2	\$ 7,552,771.35	91.39%
	Grand Total	16	\$ 140,408,181.37	79.47%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Barique		\$ -	0.00%
2	Laclo		\$ -	0.00%
3	Laclubar		\$ -	0.00%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	2	\$ 329,973.56	63.77%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	2	\$ 329,973.56	63.77%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Barique	2	\$ 404,938.08	54.93%
2	Laclo	1	\$ 50,745.00	34.95%
3	Laclubar	2	\$ 675,432.39	29.86%
4	Laleia		\$ -	0.00%
5	Manatuto Villa	1	\$ 29,275.84	15.92%
6	Soibada		\$ -	0.00%
	Grand Total	6	\$ 1,160,391.31	38.48%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Barique	7	\$ 1,882,579.41	30.07%
2	Laclo	2	\$ 646,243.79	54.34%
3	Laclubar	2	\$ 661,982.34	0.00%
4	Laleia	2	\$ 305,588.74	0.00%
5	Manatuto Villa	1	\$ 175,266.63	0.00%
6	Soibada	3	\$ 563,302.80	20.40%
	Grand Total	17	\$ 4,234,963.71	24.37%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Barique	2	\$ 194,498.32	72.19%
2	Laclo	2	\$ 273,962.46	80.30%
3	Laclubar	3	\$ 315,707.08	54.07%
4	Laleia	1	\$ 141,945.19	85.74%
5	Manatuto Villa	3	\$ 486,658.60	47.30%
6	Soibada	1	\$ 183,381.16	78.51%
	Grand Total	12	\$ 1,596,152.81	64.34%

1.3.2 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Sectors

NO	POR SECTOR	TOTAL MUNICIPIO MANATUTO		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370,511.25	15.83%
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 162,377.94	41.85%
3	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	72.74%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	5	\$ 619,316.53	40.71%
5	EDUKASAUN	2	\$ 364,483.49	78.62%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 1,534,082.76	84.97%
7	ESTRADAS	22	\$ 22,119,795.58	76.48%
8	FLOOD CONTROL	1	\$ 242,560.14	63.68%
9	IMPRESTIMO	4	\$ 115,112,106.35	78.13%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157,560.52	41.96%
12	PONTES	1	\$ 3,384,214.14	80.78%
13	SAUDE	7	\$ 840,178.96	62.08%
14	TURISMO	2	\$ 305,556.27	28.66%
Grand Total		53	\$ 147,729,662.76	77.37%

NO	POR SECTOR	Barique		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370,511.25	15.83%
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 162,377.94	41.85%
3	COMERCIO		\$ -	0.00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0.00%
5	EDUKASAUN		\$ -	0.00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
7	ESTRADAS	4	\$ 1,354,507.64	29.33%
8	FLOOD CONTROL	1	\$ 242,560.14	63.68%
9	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157,560.52	41.96%
12	PONTES		\$ -	0.00%
13	SAUDE	2	\$ 194,498.32	54.07%
14	TURISMO		\$ -	0.00%
	Grand Total	11	\$ 2,482,015.81	34.23%

NO	POR SECTOR	Barique		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA	1	\$ 370,511.25	15.83%
2	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 162,377.94	41.85%
3	COMERCIO		\$ -	0.00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0.00%
5	EDUKASAUN		\$ -	0.00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
7	ESTRADAS	4	\$ 1,354,507.64	32.59%
8	FLOOD CONTROL	1	\$ 242,560.14	63.68%
9	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 157,560.52	41.96%
12	PONTES		\$ -	0.00%
13	SAUDE	2	\$ 194,498.32	72.19%
14	TURISMO		\$ -	0.00%
	Grand Total	11	\$ 2,482,015.81	37.43%

NO	POR SECTOR	Laclo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	72.74%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 170,765.07	73.64%
5	EDUKASAUN		\$ -	0.00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	1	\$ 380,582.61	72.08%
7	ESTRADAS	3	\$ 649,558.35	54.52%
8	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
9	IMPRESTIMO	1	\$ 48,314,975.87	74.20%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
12	PONTES		\$ -	0.00%
13	SAUDE		\$ -	0.00%
14	TURISMO		\$ -	0.00%
	Grand Total	8	\$ 49,669,824.29	73.92%

NO	POR SECTOR	Laclubar		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	COMERCIO		\$ -	0.00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0.00%
5	EDUKASAUN		\$ -	0.00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	2	\$ 1,153,500.15	89.22%
7	ESTRADAS	4	\$ 1,337,414.73	15.08%
8	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
9	IMPRESTIMO	1	\$ 34,379,729.54	79.37%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
12	PONTES		\$ -	0.00%
13	SAUDE	3	\$ 315,707.08	54.07%
14	TURISMO		\$ -	0.00%
	Grand Total	10	\$ 37,186,351.50	77.15%

NO	POR SECTOR	Laleia		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	COMERCIO		\$ -	0.00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 419,275.62	29.03%
5	EDUKASAUN		\$ -	0.00%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
7	ESTRADAS	2	\$ 4,462,895.40	99.37%
8	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
9	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
12	PONTES		\$ -	0.00%
13	SAUDE		\$ -	0.00%
14	TURISMO		\$ -	0.00%
	Grand Total	4	\$ 4,882,171.02	93.33%

NO	POR SECTOR	Manatuto Villa		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	COMERCIO		\$ -	0.00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS	1	\$ 29,275.84	15.92%
5	EDUKASAUN	1	\$ 181,102.33	78.74%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
7	ESTRADAS	5	\$ 9,583,559.45	75.15%
8	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
9	IMPRESTIMO	2	\$ 32,417,400.94	82.66%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
12	PONTES		\$ -	0.00%
13	SAUDE	2	\$ 329,973.56	63.77%
14	TURISMO	2	\$ 305,556.27	28.66%
	Grand Total	14	\$ 45,209,844.83	80.16%

NO	POR SECTOR	Soibada		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AGRICULTURA		\$ -	0.00%
2	AGUA E SANEAMENTO		\$ -	0.00%
3	COMERCIO		\$ -	0.00%
4	EDIFICIOS PUBLICOS		\$ -	0.00%
5	EDUKASAUN	1	\$ 183,381.16	78.51%
6	ELETRIFIKASAUN NASIONAL		\$ -	0.00%
7	ESTRADAS	4	\$ 4,731,860.01	90.52%
8	FLOOD CONTROL		\$ -	0.00%
9	IMPRESTIMO		\$ -	0.00%
10	JUVENTUDE NO DESPORTU		\$ -	0.00%
11	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN		\$ -	0.00%
12	PONTES	1	\$ 3,384,214.14	80.78%
13	SAUDE		\$ -	0.00%
14	TURISMO		\$ -	0.00%
	Grand Total	6	\$ 8,299,455.31	86.29%

1.3.3 : Lista Projectos Municipio Manatuto Por Ministerios

NO	DONO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTA KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	4	\$ 567,521.53	55.91%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 370,511.25	15.83%
3	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29,275.84	15.92%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	34	\$142,712,697.43	77.90%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 364,483.49	78.62%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277,330.43	0.00%
7	MINISTERIO SAUDE	7	\$ 840,178.96	62.08%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204,687.39	63.37%
9	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
Grand Total		53	\$147,729,662.76	77.37%

NO	DONO PROJECTO	Barique		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTA KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	1	\$ 370,511.25	15.83%
3	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	8	\$ 1,917,006.24	38.08%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 194,498.32	72.19%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
9	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
	Grand Total	11	\$ 2,482,015.81	37.43%

NO	DONO PROJECTO	Laclo		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTA KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 120,020.07	90.00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 49,345,116.83	73.93%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	2	\$ 204,687.39	63.37%
9	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
	Grand Total	8	\$ 49,669,824.29	73.92%

NO	DONO PROJECTO	Laclubar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTA KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	7	\$ 36,870,644.42	77.35%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 315,707.08	54.07%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
9	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
	Grand Total	10	\$ 37,186,351.50	77.15%

NO	DONO PROJECTO	Laleia		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTA KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	1	\$ 141,945.19	85.74%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	2	\$ 4,462,895.40	99.37%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 277,330.43	0.00%
7	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
9	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
Grand Total		4	\$ 4,882,171.02	93.33%

NO	DONO PROJECTO	Manatuto Villa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTA KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL	2	\$ 305,556.27	28.66%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 29,275.84	15.92%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	7	\$ 42,000,960.39	80.95%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 181,102.33	78.74%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 329,973.56	63.77%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
9	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 2,362,976.44	76.00%
	Grand Total	14	\$ 45,209,844.83	80.16%

NO	DONO PROJECTO	Soibada		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTA KONTRATO (\$)	PRESENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	ESTATAL		\$ -	0.00%
2	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS		\$ -	0.00%
3	MINISTERIO DA JUSTICA		\$ -	0.00%
4	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	5	\$ 8,116,074.15	86.46%
5	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 183,381.16	78.51%
6	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU		\$ -	0.00%
7	MINISTERIO SAUDE		\$ -	0.00%
8	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA		\$ -	0.00%
9	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU		\$ -	0.00%
	Grand Total	6	\$ 8,299,455.31	86.29%

1.4. Dadus Populasaun Munisipiu Manatuto

Posto Administrativo, Suco no Sexu	2022				
	Total	Idade produktivu (idade 15-64)		Ida la produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Barique	5,833	1,924	1,617	1,183	1,109
Laclo	8,193	2,250	2,185	1,919	1,838
Laclubar	12,777	3,445	3,571	2,924	2,836
Laleia	3,930	1,181	1,189	817	743
Manatuto	15,446	4,741	4,609	3,109	2,987
Soibada	3,511	237	213	239	259

Fontes : Projeksaun Populasaun bazea ba Census Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1. Progressu Fisiku Kada Fulan

Progressu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan nia laran, husi lista #anexu B hatudu progresu aktual fulan ida ne'e ho nia presentagen servisu, montante aktual bazeia ba orsamento ne'ebe hetan husi progresu fulan ida ne'e, ikus liu prentangen aktual fulan ida ne'e hatudu progresu fisiku komulativu husi prosentun antrior no fulan ida ne'e nian, lista kompletu ba detallu bele hare iha #anexu B, detallu ba back-up #anexu C, no Instrusaun Servisu #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1. Obtáclo Servisu iha Terenu

Observasaun geral ba projeto hirak nebe mak implementa iha Munisipio Manatuto

1. Projeto Lao la tuir tempo nebee asina entre parte rua
2. Laiha tekniko supervisaun husi projeto nain atu halo kontrolo diaramente
3. Tekniko kompanha la iha tereno
4. Skill badaen neebe mak la dun professional

Obstalku teknik A.D.N hasoru

1. Distansia ne'ebe dook difikulta teknik atu servisu lalais
2. Kondisaun estrada ne'ebe a'at
3. Kontraktor sira ne'ebe mak servisu iha terreno barak mak la tuir Spesifikasaun ne'ebe iha kontartu laran.
4. Planu Mapamentu Engenheiro Munisipiu la konsege realiza tuir planu tamba hare hosi nia distansia ne'ebe dook.
5. Sistema dropbox iha Munisipiu dala ruma iha problema lina internet

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Presija tebes atu aumenta ema iha Munisipiu atu nune bele halo servisu ba administrasaun ne'ebe efektivu.
2. Sebele sistema dropbox tau mos iha dekstop Munisipiu para la bele atraja ami nia servisu.

Note: Asinatura Husi Eng. Municipio Manatuto

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Manatuto						
No	Deskrisaun	Identidade				Asinatura
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	
1	Enjineiru	Aleixo da C. Andrade	081	Enjineiru EPAS		
		José R. Carlos Gusmão	168	Enjineiru ITI		
		Augusta da Costa Ferreira	214	Enjineiru ITI		

		Adonis Julio Fernandes	152	Enjineiru ME		
2	Enjineira	Olivia Soares	112	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Timoteo da Silva Morais	120	Motorista		

#ANEXU A

MUNICIPIO MANATUTO (LISTA GERAL)

Localizasaun Projeto

NU.	NARAN PROJ.	DONO PROJ.	KAT. PROJ.	SECTOR	Posto Administrativo	MUNI.	NARAN COMP.	MONT. KONT. (\$)	PROG. FISIKU (%)	PROG. PAGA. (%)	PAGA. (\$)	BAL. (\$)	Status Projecto	OBS
1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	\$ 2.561.405,06	63,80	57,33%	\$ 1.468.479,04	\$ 1.092.926,02	ON-GOING	
2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	\$ 3.029.514,40	89,20	79,82%	\$ 2.418.275,38	\$ 611.239,02	ON-GOING	
3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipessoal, Lda	\$ 2.362.976,44	82,08	76,00%	\$ 1.795.843,89	\$ 567.132,55	ON-GOING	
4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	\$ 28.011.854,94	93,27%	84,06%	\$ 23.546.774,85	\$ 4.465.080,09	ON-GOING	
5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	\$ 4.405.546,00	73,76	73,76%	\$ 3.249.684,75	\$ 1.155.861,25	ON-GOING	
6	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Ralan Unip. Lda	\$ 181.102,33	91,29%	78,74%	\$ 142.605,32	\$ 38.497,01	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 3,80%
7	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	\$ 79.155,54	88,07	79,26%	\$ 62.737,67	\$ 16.417,87	ON-GOING	
8	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	\$ 226.400,73	43,70	10,97%	\$ 24.834,32	\$ 201.566,41	ON-GOING	
9	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 29.275,84	15,92	15,92%	\$ 4.660,85	\$ 24.614,99	ON-GOING	
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda	\$ 66.989,91	94,75	85,28%	\$ 57.127,26	\$ 9.862,65	ON-GOING	
11	Sumase River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Forte, Unip. Lda	\$ 1.486.885,83	100,00	90,00%	\$ 1.338.197,25	\$ 148.688,58	ON-GOING	Falta Retensaun
12	Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Ilatur, Lda	\$ 2.330.487,53	96,42	84,85%	\$ 1.977.323,53	\$ 353.164,00	ON-GOING	
13	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip.Lda	\$ 262.983,65	73,81%	58,29%	\$ 153.284,47	\$ 109.699,18	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 9,05%
14	New Construction of Gabions Tower No. 4 Section Manatuto - Baucau Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Giovanio Unip. Lda	\$ 175.266,63	91,39%	0,00%	\$ -	\$ -	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 91,39%
15	Rehabilitasaun Kampu Foteboli iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip.Lda	\$ 277.330,43	0,00	0,00%	\$ -	\$ 277.330,43	ON-GOING	
16	Rehabilitasaun Estradas Laleia ba Cemetery (0+000-5+043)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	Flami, Unip. Lda	\$ 4.434.637,09	100,00	100,00%	\$ 4.434.637,09	\$ 0,00	FHO	
17	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	Hare Unip.Lda	\$ 141.945,19	98,92	85,74%	\$ 121.709,07	\$ 20.236,12	ON-GOING	
18	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	\$ 28.258,31	59,98%	0,00%	\$ -	\$ 28.258,31	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 26,95%
19	New Installation MV, LV Line and House Connection From Laclubar Vila to Suco Funar Barique - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Nehek Mean ,Lda	\$ 458.079,32	100,00%	100,00%	\$ 458.079,32	\$ -	FHO	

20	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	\$ 695.420,83	91,24%	82,11%	\$ 571.034,27	\$ 124.386,56	ON-GOING	
21	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	\$ 34.379.729,54	88,19%	79,37%	\$ 27.288.513,33	\$ 7.091.216,21	ON-GOING	
22	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Ladiama Unip. Lda	\$ 112.967,53	22,06	19,85%	\$ 22.429,62	\$ 90.537,91	ON-GOING	
23	Konstrusaun Rezidencia Pesoa Iha iha Suku Funar - Laklubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Tonijo Unip. Lda	\$ 81.776,84	100,00	86,50%	\$ 70.740,86	\$ 11.035,98	ON-GOING	
24	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 481.029,67	13,11	11,80%	\$ 56.774,87	\$ 424.254,80	ON-GOING	
25	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 194.402,72	82,83	74,55%	\$ 144.924,09	\$ 49.478,63	ON-GOING	
26	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	\$ 448.209,39	85,79%	0,00%	\$ -	\$ 448.209,39	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 45,94%
27	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	\$ 213.772,95	0	0,00%	\$ -	\$ 213.772,95	ON-GOING	
28	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 120.962,71	71,23	64,11%	\$ 77.547,51	\$ 43.415,20	ON-GOING	
29	Road Rehabilitation Jct A09 Fatucamanaun Leohat 1, (sta. 0+000 Km - 4+200) Package 1 Municipality of Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	MMM Holding Unipessoal Lda JV PT Wijaya Karya (WIKA)	\$ 4.168.557,21	100,00	100,00%	\$ 4.168.557,21	\$ -	FHO	
30	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESSOAL LDA	\$ 3.384.214,14	91,81%	80,78%	\$ 2.733.851,74	\$ 650.362,40	ON-GOING	
31	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 183.381,16	95,28%	78,51%	\$ 143.967,27	\$ 39.413,89	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 8,05%
32	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	\$ 164.154,00	70,00%	70,00%	\$ 114.907,80	\$ 49.246,20	ON-GOING	
33	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 203.036,57	14,00%	0,00%	\$ -	\$ 203.036,57	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 3,40%
34	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 196.112,23	18,73%	0,00%	\$ -	\$ 196.112,23	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 10,67%
35	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	\$ 242.560,14	70,75	63,68%	\$ 154.455,92	\$ 88.104,22	ON-GOING	
36	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	\$ 370.511,25	17,59	15,83%	\$ 58.645,87	\$ 311.865,38	Abandona	Abandona
37	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	\$ 15.875,56	100,00	87,26%	\$ 13.853,09	\$ 2.022,47	ON-GOING	
38	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	\$ 116.914,88	67,11%	60,40%	\$ 70.617,35	\$ 46.297,53	ON-GOING	
39	Construction of Residence for Health Staff in Suku Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Macucuren Unip. Lda	\$ 77.583,44	99,96	89,97%	\$ 69.800,52	\$ 7.782,92	ON-GOING	
40	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalaran /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	\$ 162.377,94	46,50	41,85%	\$ 67.961,57	\$ 94.416,37	ON-GOING	
41	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 141.684,96	40,98	36,88%	\$ 52.260,01	\$ 89.424,95	ON-GOING	
42	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We'coi Unipessoal Lda	\$ 343.111,47	10,15%	0,00%	\$ -	\$ 343.111,47	ON-GOING	

43	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	\$ 269.211,81	0,93%	0,00%	\$ -	\$ 269.211,81	ON-GOING	
44	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	\$ 300.792,46	4,98%	0,00%	\$ -	\$ 300.792,46	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 1,77%
45	New construction of Gapura and gabion wall protection no jardim de herois de Natarbora	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACÃO NACIONAL	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Barique	Manatuto	Senizu	\$ 408.460,73	0,89%	0,80%	\$ 3.256,60	\$ 405.204,13	ON-GOING	
46	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacro to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacro	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	\$ 380.582,61	94,75%	72,08%	\$ 274.330,03	\$ 106.252,58	ON-GOING	
47	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacro	Manatuto	Sahan I Unip.Lda	\$ 3.314,56	100,00	90,00%	\$ 2.983,11	\$ 331,45	ON-GOING	Sei falta retensaun no Projecto refere tama ona iha pakote ADB
48	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lacro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacro	Manatuto	Aiilli Const. Unip. Lda	\$ 120.020,07	100,00	90,00%	\$ 108.017,87	\$ 12.002,20	PHO	Falta Retensaun
49	Routine Roads Maintenance - Lacro, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacro	Manatuto	Egana, Unip. Lda	\$ 223.843,79	50,93%	24,79%	\$ 55.492,27	\$ 168.351,52	ON-GOING	Progresso Fisiko iha Tereno ba Fulan Janeiro Aumenta 4,53%
50	For Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of "Municipio Roads" Package 9 : Lacro to Lacro Town Road	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacro	Manatuto	PT. Bikarma Jv Aureum Solis Consultant Unip Lda	\$ 422.400,00	70,00%	70,00%	\$ 295.680,00	\$ 126.720,00	ON-GOING	
51	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacro	Manatuto	Esa-Un	\$ 50.745,00	38,83	34,95%	\$ 17.736,12	\$ 33.008,88	PENDENTE	
52	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilmano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacro	Manatuto	Surprise Unip. Lda	\$ 153.942,39	80,82	72,74%	\$ 111.978,83	\$ 41.963,56	PENDENTE	
53	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacro	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	\$ 48.314.975,87	82,44	74,20%	\$ 35.849.928,14	\$ 12.465.047,73	ON-GOING	
TOTAL								\$ 147.696.731,59			\$ 113.854.499,93	\$ 33.666.965,03		

Prepara Husi:

1. Eng. Aleixo da Costa Andrade
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

2. Eng. Jose Roberto C. Gusmão
Eng. ba Projecto Infrastrutura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

3. Eng. Augusta da Costa Ferreira
Eng. ba Projecto Infrastrutura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

4. Eng. Adonis Julio Fernandes
Eng. ba Projecto ME, ADN, I.P

Certifika Husi:

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De Qualidade ADN,I.P

LISTA #ANEXU B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN

LOKALIZASAUN PROJETU										Jan-21		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress	This Month Progress	Komulativo Progress
1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	\$ 2.561.405,06	Aug. 25, 2018	63,80%		63,80%
2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	\$ 3.029.514,40	Aug. 25, 2017	89,20%		89,20%
3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	FI	JUVENTUDE NO DESPORTU	Manatuto Villa	Manatuto	Obrai Unipessoal, Lda	\$ 2.362.976,44	June 30, 2015	82,08%		82,08%
4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	\$ 28.011.854,94	Feb. 10, 2014	93,60%		93,60%
5	Consultant Supervision (M-L & L-N)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Manatuto Villa	Manatuto	Sinotech Engineering Consultant	\$ 4.405.546,00	Sept. 3, 2014	73,76%		73,76%
6	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Manatuto Villa	Manatuto	Ralan Unip. Lda	\$ 181.102,33	Oct. 10, 2019	87,49%	3,80%	91,29%
7	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	\$ 79.155,54	Dec. 18, 2019	88,07%		88,07%
8	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	ESTATAL	PDIM	TURISMO	Manatuto Villa	Manatuto	Carya Timor Leste Lda	\$ 226.400,73	Dec. 18, 2019	43,70%		43,70%
9	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Manatuto Villa	Manatuto	Baboe Unip Lda	\$ 29.275,84	March 1, 2020	15,92%		15,92%
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Kartini Unipessoal Lda	\$ 66.989,91	Jan. 7, 2021	95,34%		95,34%
11	Sumase River	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Forte, Unip. Lda	\$ 1.486.885,83	Sept. 7, 2017	100,00%		100,00%
12	Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Ilalun, Lda	\$ 2.330.487,53	July 25, 2016	96,42%		96,42%
13	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Manatuto Villa	Manatuto	Talamori Unip.Lda	\$ 262.983,65	09-Dec-20	64,76%	9,05%	73,81%
14	New Construction of Gabions Tower No. 4 Section Manatuto - Baucau Municipality Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Manatuto Villa	Manatuto	Giovania Unip. Lda	\$ 175.266,63	02-Aug-21	83,15%	8,24%	91,39%

15	Rehabilitasaun Estradas Laleia ba Cemetary (0+000-5+043)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	Flami, Unip. Lda	\$ 4.434.637,09	Sept. 7, 2017	100,00%		100,00%
16	Rehabilitasaun Kampu Foteboli iha Postu Administrativu Laleia	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	DCO Unip.Lda	\$ 277.330,43	July 18, 2019	0,00%		0,00%
17	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Laleia	Manatuto	Hare Unip.Lda	\$ 141.945,19	Oct. 8, 2019	98,92%		98,92%
18	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laleia	Manatuto	As Jazesia Unipessoal Lda	\$ 28.258,31	June 10, 2021	33,03%	26,95%	59,98%
19	New Installation MV, LV Line and House Connection From Laclubar Vila to Suco Funar Barique - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Nehek Mean ,Lda	\$ 458.079,32	Sept. 1, 2016	100,00%		100,00%
20	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Laclubar	Manatuto	Tasibala III Unip. Lda	\$ 695.420,83	June 7, 2016	92,88%		92,88%
21	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Laclubar	Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	\$ 34.379.729,54	Nov. 20, 2014	88,19%		88,19%
22	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Ladiama Unip. Lda	\$ 112.967,53	Sept. 23, 2019	22,06%		22,06%
23	Konstrusaun Rezidencia Pesoa Iha iha Suku Funar - Laklubar	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Tonijo Unip. Lda	\$ 81.776,84	Oct. 8, 2019	100,00%		100,00%
24	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 481.029,66	Aug. 25, 2020	13,11%		13,11%
25	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 194.402,72	Dec. 20, 2019	82,83%		82,83%
26	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	\$ 448.209,39	June 10, 2021	39,85%	45,94%	85,79%
27	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Laclubar	Manatuto	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	\$ 213.772,95	June 10, 2021	0,00%		0,00%
28	Kontinusaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Laclubar	Manatuto	Hatuwari Unip. Lda	\$ 120.962,71	July 28, 2019	71,23%		71,23%
29	Road Rehabilitation Jct A09 Fatucamanaun Leohat 1, (sta. 0+000 Km - 4+200) Package 1 Municipality of Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	MMM Holding Unipessoal Lda JV PT Wijaya Karya (WIKI)	\$ 4.168.557,21	Feb. 27, 2017	100,00%		100,00%
30	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada,	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Soibada	Manatuto	FIRDO UNIPESSOAL LDA	\$ 3.384.214,14	Feb. 27, 2017	91,81%		91,81%
31	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 183.381,16	Sept. 23, 2019	87,23%	8,05%	95,28%
32	For Preparation of Detailed Engineering Design for Road Rehabilitation of "Municipal Road" Package 10 Soibada to Soibada Town	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Hilobadi Unip. Lda JV PT. Siarplan Utama Konsultan	\$ 164.154,00	March 25, 2020	70,00%		70,00%
33	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 203.036,57	June 10, 2021	10,59%	3,40%	14,0%
34	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Soibada	Manatuto	Ryzena Unipessoal Lda	\$ 196.112,23	June 10, 2021	8,06%	10,67%	18,73%

35	Construction of Sahen Bridge Approach Protection (A14) Manatuto (MPW-W-190157) (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	FLOOD CONTROL	Barique	Manatuto	Yoku Unipessoal Lda	\$ 242.560,14	Oct. 24, 2019	70,75%		70,75%
36	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	LM-CD	AGRICULTURA	Barique	Manatuto	Tasibala II Const	\$ 370.511,25	Sept. 13, 2016	17,59%		17,59%
37	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality (Manutensaun)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Zenobia Diak Unip.Lda	\$ 15.875,56	Jan. 7, 2017	100,00%		100,00%
38	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Malack II Unip. Lda	\$ 116.914,88	Sept. 23, 2019	67,11%		67,11%
39	Construction of Residence for Health Staff in Suku Aimeta Laran-Barique	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Barique	Manatuto	Macucuren Unip. Lda	\$ 77.583,44	Oct. 8, 2019	99,96%		99,96%
40	Rural Roads Routine Maintenance Uma Boco - Aubeon, Sta. 0+000 - 6+000, Manututo Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We'coi Jv Manulai Caboran Unip Lda	\$ 441.391,90	Nov. 5, 2020	100,00%		100,00%
41	Konstrusaun Sistema Bee Mos Iha Suco Aubeon no Aimetalan /162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	AGUA E SANEAMENTO	Barique	Manatuto	Malaca Unip Lda	\$ 162.377,94	Oct. 8, 2019	46,50%		46,50%
42	R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage 0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Barique	Manatuto	Manufahi Kiik Unip. Lda	\$ 141.684,96	Aug. 25, 2019	41,78%		41,78%
43	R4D Rural Road Spot Improvement Agriculture Center - Aubeon Chainage 3+000-6+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	We'coi Unipessoal Lda	\$ 343.111,47	June 10, 2021	12,33%		12,33%
44	R4D Rural Road Spot Improvement Uma Boco - Agriculture Center Chainage 0+000 - 3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Linoel	\$ 296.211,82	June 10, 2021	0,93%		0,93%
45	R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Barique	Manatuto	Gimso Brothers Unip. Lda	\$ 300.792,46	July 10, 2021	3,21%	1,77%	4,98%
46	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacro to Mantane - Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Lacro	Manatuto	Anopa Electrical Unip. Lda	\$ 380.582,61	Sept. 1, 2016	94,75%		94,75%
47	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Lacro	Manatuto	Sahan I Unip.Lda	\$ 3.314,56	Sept. 27, 2016	100,00%		100,00%
48	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lacro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacro	Manatuto	Aillili Const. Unip. Lda	\$ 120.020,07	Oct. 8, 2019	100,00%		100,00%
49	Routine Roads Maintenance - Lacro, Manatuto Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacro	Manatuto	Egana, Unip. Lda	\$ 223.836,50	Dec. 13, 2019	46,40%	4,53%	50,93%
50	For Preparation of Detailed Engineering Design for Rehabilitation of "Municipio Roads" Package 9 : Lacro to Lacro Town Road	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Lacro	Manatuto	PT. Bikarma Jv Aureum Solis Consultant Unip Lda	\$ 422.400,00	April 25, 2020	40,00%		40,00%
51	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Lacro	Manatuto	Esa-Un	\$ 50.745,00	May 2, 2016	38,83%		38,83%
52	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Ilimano	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	PDIM	COMERCIO	Lacro	Manatuto	Surprise Unip. Lda	\$ 153.942,39	Sept. 12, 2016	80,82%		80,82%
53	National Road No.1 Upgrading Project Dili - Manatuto (Package A01-01)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Lacro	Manatuto	Sinohydro Corporation Limited	\$ 48.314.975,87	May.3, 2016	82,44%		82,44%

1. Eng. Aleixo da Costa Andrade
Eng. ba Projecto Edificio Publico Beé no Saneamento Municipio Manatuto, ADN, I.P

4. Eng. Adonis Juho Fernandes
Eng. ba Projecto ME, ADN, I.P

Inspeksaun Husi :

2. Eng. Jose Roberto C. Gusmão
Eng. ba Projecto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

3. Eng. Augusta da Costa Ferreira
Eng. ba Projecto Insfrasturctura e Irigasaun Municipiu Manatuto, ADN, I.P

Verifika Husi :

Eng. Aniceto da Costa
Eng. Senior ba Projecto Insfrasturctura e Irigasaun, ADN, I.P

Eng/Arch. Francisco Xavier de D. Jeronimo
Eng. Senior ba Projecto Edificio Publico Beé no Saneamento, ADN, I.P

Eng. Deolindo de Fatima Marques
ChefeSeksau ME& ITC, ADN, I.P

Certifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa M.Freitas
Coordenadora Da Unidade de Controlo e Validação De Qualidade ADN, I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in
Manatuto Municipality Manatuto

No. kontratu : SSS/062/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 24/1/2022

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 126,041,478, Latetude : -8,518,704

End Point : Long : 126,014,554, Latetude : -8,509,156

Naran Inspector : 1. Eng. Augusta da Costa Ferreira

2. Eng. Jose R.C. Gusmão

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba
Projetu refere remata ona nia fiziku iha
terenu no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in
Manatuto Municipality Manatuto

No. kontratu : SSS/062/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba
Projetu refere remata ona nia fiziku iha
terenu no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba
Projetu refere remata ona nia fiziku iha
terenu no hein Rekomendasaun ikus husi
MOP.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto
No. kontratu : ICB/0128/SEJD-2014

Data Inspesaun : 27 Janeiro 2022

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5219S,

Latetude : 126.0534E,

End Point : Long :

Latetude :

Naran Inspector : Aleixo Da Costa Andrade

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Football Field





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto
No. kontratu : ICB/0128/SEJD-2014

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Serbisu Subgrade Preparation

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.

Serbisu Public Tribune

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto
No. kontratu : ICB/0128/SEJD-2014

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Serbisu Subgrade Preparation



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item Servisu Hand Rail Pipe





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto
No. kontratu : 03/PDIM-II/MNTT/IX/2019

Data Inspesaun : 28 Janeiro 2022

Fatin Inspesaun : Beadi, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.538497,

Latetude : 126.01472

End Point : Long :

Latetude :


Naran Inspector : Aleixo Da Costa Andrade

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Serbisu external water service

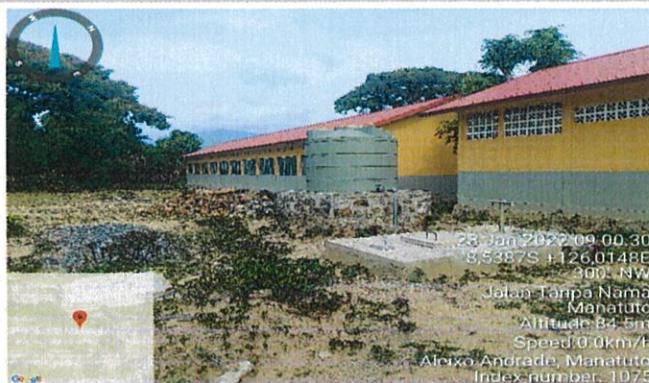



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto
No. kontratu : 03/PDIM-II/MNTT/IX/2019

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .
Serbisu Ring Bendeira




Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Building CA

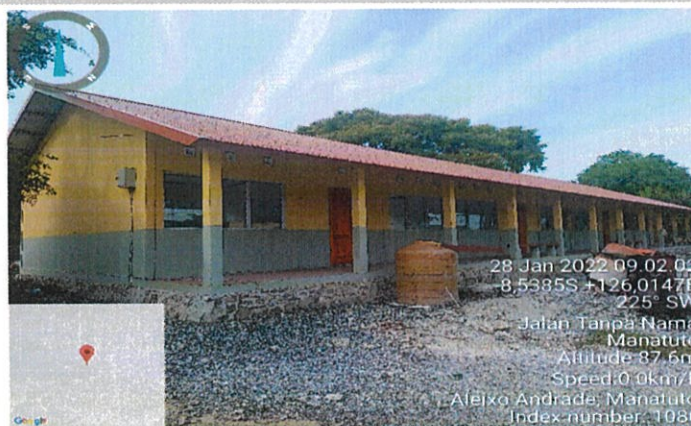



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-6)

SUMMARY BOQ

Projeito Nia Naran : Konstrusaun Escola Sekundario Teknik Vokasional Aiteas Manatuto Vila
Lokalizaun Projeito : Beadi, Aiteas, Manatuto Vila

ORIGINAL CONTRACT			PROGRESS PAYMENT BY A D N					
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (US\$)	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL TO DATE	
			Amount US\$	%	Amount US\$	%	Amount US\$	%
I	PRELIMINARIES (Pekerjaan Persiapan)	\$ 980.00	\$ 767.50	0.42%	\$ 212.50	0.12%	\$ 980.00	0.54%
II	GROUNDWORK (Pekerjaan Tanah)	\$ 1,926.81	\$ 1,926.81	1.06%	\$ -	0.00%	\$ 1,926.81	1.06%
III	CONCRETE (Pekerjaan Beton)	\$ 15,185.60	\$ 15,185.60	8.39%	\$ -	0.00%	\$ 15,185.60	8.39%
IV	STONE MASONRY AND MASONRY BLOCKWORK (Pek. Pasangan batu dan pasang batako)	\$ 2,259.32	\$ 2,259.32	1.25%	\$ 186.00	0.10%	\$ 2,445.32	1.35%
V	Steel Roof Structure & Ceilling (Struktur Atap Baja dan Plafond)	\$ 79,907.42	\$ 79,907.42	44.12%	\$ -	0.00%	\$ 79,907.42	44.12%
VI	JOINERY FIXTURES	\$ 2,233.74	\$ 2,156.94	1.19%	\$ 76.80	0.04%	\$ 2,233.74	1.23%
VII	ROOFING (Pek. Atap)	\$ 4,793.22	\$ 4,502.77	2.49%	\$ -	0.00%	\$ 4,502.77	2.49%
VIII	WINDOWS (Pekerjaan Jendela)	\$ 9,798.00	\$ 9,798.00	5.41%	\$ -	0.00%	\$ 9,798.00	5.41%
IX	DOORS AND HARDWARE (Pek. Pintu, Penggantung dan pengunci)	\$ 4,070.00	\$ 4,070.00	2.25%	\$ -	0.00%	\$ 4,070.00	2.25%
X	FINISHES (Pek Finishing atau plesteran)	\$ 5,797.15	\$ 5,797.15	3.20%	\$ -	0.00%	\$ 5,797.15	3.20%
XI	PAINTING (Pek. Pengecatan)	\$ 4,545.03	\$ 4,545.03	2.51%	\$ -	0.00%	\$ 4,545.03	2.51%
XII	PLUMBING	\$ 2,855.00	\$ 2,765.00	1.53%	\$ 90.00	0.05%	\$ 2,855.00	1.58%
XIII	ELECTRICAL INSTALLATION (full installation)	\$ 4,394.88	\$ 1,776.50	0.98%	\$ 2,618.38	1.45%	\$ 4,394.88	2.43%
XIV	SITE WORK	\$ 8,709.06	\$ 5,713.32	3.15%	\$ 2,995.74	1.65%	\$ 8,709.06	4.81%
XV	GRAND TOTAL,CA,CB,SITE WORK	\$ 147,455.21	\$ 141,171.34	77.95%	\$ 6,179.41	3.41%	\$ 147,350.76	81.36%
XVI	PROFIT 10% X A	\$ 14,745.52	\$ 14,117.13	7.80%	\$ 617.94	0.34%	\$ 14,735.08	8.14%
XVII	OVERHEAD	\$ 549.25	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
XVIII	TAXA 2 % X (A + B + C)	\$ 18,254.54	\$ 3,161.87	1.75%	\$ 79.85	0.04%	\$ 3,241.72	1.79%
XIX	GRAND TOTAL WITH CONTIGENCY	\$ 181,102.33	\$ 158,450.35	87.49%	\$ 6,877.20	3.80%	\$ 165,327.55	91.29%

Prepara husi :

(Eng. Aleixo Da Costa Andrade)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (MV-6)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto

Kompanha : Ralan Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/10/2022	Manatuto Vila	Aleixo Da Costa Andrade	Eng. Municipiu Manatuto	1	Husu ba kompanha atu halo justifikasaun ba utilujasaun osan kontigencia no overhead	
					2	Husu ba kompanha atu instala ona papan tulis	
					3	Husu ba kompanha atu halo serbisu limpeja ikus nian	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-13)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction For Isolation Room Manatuto Municipality
No. kontratu :

Data Inspesaun : 28 Janeiro 2022

Fatin Inspesaun : Aiteas, Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long :-8.5400S,

Latetude : 126.0157,

End Point : Long :.....,

Latetude :

Naran Inspector : Aleixo Da Costa Andrade

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu /Foto Dezenho

Serbisu Plamir/Pinta





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-13)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction For Isolation Room Manatuto Municipality

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu /Foto deznho

Item Serbisu Carpentaria



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu /Foto Dezenho

Serbisu Pintura





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-13)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction For Isolation Room Manatuto Municipality

No. kontratu :

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item Serbisu Septiktank



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item Serbisu Apron no Drainagen





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV-13)

SUMMARY

PROJECT TITLE : NEW CONSTRUCTION FOR ISOLATION ROOM
LOCATION : MANATUTO VILA - MANATUTO MUNICIPALITY - TIMOR LESTE

			PROGRESS PAYMENT BY A D N					
No	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)	PREVIOUS BILLING (USD)	%	THIS BILLING (USD)	%	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
I	PREPARATION WORKS	\$ 9,172.89	\$ 7,641.76	2.91%	\$ 750.00	0.29%	\$ 8,391.76	3.19%
II	FUNDATION WORKS	\$ 596.66	\$ 469.21	0.18%	\$ 127.45	0.05%	\$ 596.66	0.23%
III	CONCRETE WORKS	\$ 42,907.24	\$ 42,907.24	16.32%	\$ -	0.00%	\$ 42,907.24	16.32%
IV	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 27,382.53	\$ 27,382.53	10.41%	\$ -	0.00%	\$ 27,382.53	10.41%
V	CARPENTER WORKS	\$ 24,244.00	\$ 20,464.00	7.78%	\$ 3,780.00	1.44%	\$ 24,244.00	9.22%
VI	ROOFING WORKS	\$ 27,358.42	\$ 26,533.42	10.09%	\$ -	0.00%	\$ 26,533.42	10.09%
VII	CEILING WORKS	\$ 10,715.61	\$ 7,652.81	2.91%	\$ 3,062.80	1.16%	\$ 10,715.61	4.07%
VIII	FLOOR TILE WORKS	\$ 12,860.75	\$ 12,860.75	4.89%	\$ -	0.00%	\$ 12,860.75	4.89%
IX	ELECTRICAL WORKS	\$ 22,285.66	\$ 215.60	0.08%	\$ -	0.00%	\$ 215.60	0.08%
X	SANITASI WORKS	\$ 12,162.13	\$ 1,241.06	0.47%	\$ 8,139.60	3.10%	\$ 9,380.66	3.57%
XI	PAINTING WORKS	\$ 6,469.39	\$ 2,223.93	0.85%	\$ 4,245.45	1.61%	\$ 6,469.39	2.46%
XII	FURNITURE	\$ 14,694.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
XIII	FINAL CLEARING	\$ 310.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONTRUCTION COST	\$ 211,159.28	\$ 149,592.31	56.88%	\$ 20,105.31	7.65%	\$ 169,697.62	64.53%
B	FEE CONTRACTOR (10% x A)	\$ 21,115.93	\$ 14,959.23	5.69%	\$ 2,010.53	0.76%	\$ 16,969.76	6.45%
C	OVERHEAD	\$ 4,850.00	\$ 2,425.00	0.92%	\$ 1,212.50	0.46%	\$ 3,637.50	1.38%
D	TAX (2% x(A+B+C))	\$ 4,742.50	\$ 3,339.53	1.27%	\$ 466.57	0.18%	\$ 3,806.10	1.45%
E	CONTIGENCY (10% OF A)	\$ 21,115.93		0.00%		0.00%		0.00%
F	TOTAL PROJECT COST (A +B + C + D + E)	\$ 262,983.65	\$ 170,316.07	64.76%	\$ 23,794.91	9.05%	\$ 194,110.98	73.81%

Prepara/husi :

(Eng. Aleixo Da Costa Andrade)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (MV-13)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : NEW CONSTRUCTION FOR ISOLATION ROOM

Kompanha : Talamori Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	28/01/2022	Manatuto Vila	Aleixo Da Costa A	Eng. Municipiu Manatuto	1	Husu ba Kompanha atu kontinua serbisu hodi nunee bele finalisa lalais projeit refere	
					2	Husu ba kompanha atu kordena ho projeto nain konaba utulijasaun osan provisionalsum no kontengencia	
					3	Husu ba kompanha atu serbisu nafatin tuir speksifikasaun teknik neebe mensiona iha BoQ	
					4		
					5		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : New Const. of Gabion Tower No. 04 Section Manatuto - Baucau
Manatuto Municipality

No. kontratu : NCB/029/MOP-2020

Data Inspesaun : 13/01/2022

Fatin Inspesaun : Manatuto Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : 126,041,478, Latetude : -8,518,704

End Point : Long : 126,014,554, Latetude : -8,509,156

Naran Inspector : 1. Augusta da Costa Ferreira

2. Jose R. Carlos Gusmão


Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Excavation no

Monta Gabion Box 2 x 1 x 1

L = 60

Excavation = 5 x 2 x 60 = 600 m³



Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : New Const. of Gabion Tower No. 04 Section Manatuto - Baucau
Manatuto Municipality


No. kontratu : NCB/029/MOP-2020

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Back Fill no monta

Geotextil

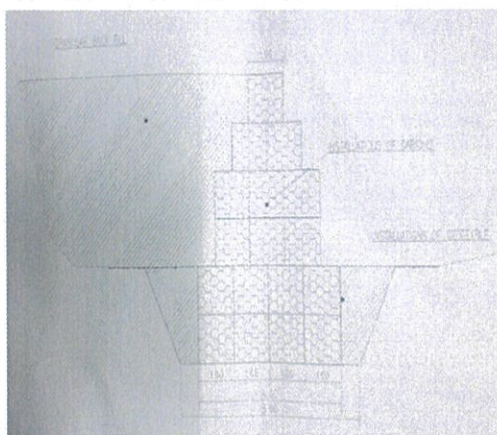

Back fill V = 4 x 3.5 x 60

= 840 m³

Geotextill V = 6 x 1 x 60

= 360 m²

Gabion Box 2 x 1 x 1

L= 60

V = 6 x 17 x 60

= 6.120 m³





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (MV-14)

Back-up Data

Naran Projeto

: New Const. of Gabion Tower No. 04 Section Manatuto - Baucau
Manatuto Municipality

No. kontratu

: NCB/029/MOP-2020





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (MV- 14)

Naran Projeto : New Const. of Gabion Tower No.4 Section Manatuto - Baucau
No. kontratu : NCB/029/MOP-2020
Contractor : Geovani Unipessoal, Lda.

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
I	PRELIMINARY AND GENERAL WORKS	\$ 5,081.02	\$ 3,290.51	1.88%	\$ -	0.00%	\$ 3,290.51	1.88%
II	INSTALLATION OF GABIONS TOWER NO.4	\$ 140,762.19	\$ 125,950.20	71.86%	\$ 11,482.06	6.55%	\$ 137,432.26	78.41%
III	RIVER NORMALIZATION	\$ 7,875.00	\$ -	0.00%	\$ 1,386.00	0.79%	\$ 1,386.00	0.79%
	Construction Cost	\$ 153,718.21	\$ 129,240.71	73.74%	\$ 12,868.06	7.34%	\$ 142,108.77	81.08%
	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 15,371.82	\$ 12,924.07	7.37%	\$ 1,286.81	0.73%	\$ 14,210.88	8.11%
	Over Head	\$ 2,740.00	\$ 715.00	0.41%	\$ -	0.00%	\$ 715.00	0.41%
	Tax 2 % x (A+B)	\$ 3,436.60	\$ 2,857.60	1.63%	\$ 283.10	0.16%	\$ 3,140.69	1.79%
	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 175,266.63	\$ 145,737.38	83.15%	\$ 14,437.96	8.24%	\$ 160,175.34	91.39%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Jose R Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P


2. (Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. Aniceto da Costa
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade, ADN.I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (MV-14) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Naran projeto : New Const. of Gabion Tower No.04 Section Manatuto - Baucau							
Kompanha : Geovani, Unip. Lda							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	13/01/2022	Manatuto/ Manatuto Vila	Jose R Carlos Gusmao	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Eng. Munisipiu halo inspesaun maibe durante ne'e la priense Buku Tamu tanba Kompanhia sira la fo, motivo no razaun Eng. Munisipiu lahatene	
II	13/01/2022	Manatuto/ Manatuto Vila	Augusta da Costa Ferreira	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAL- 4)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage
0+000-9+800

No. kontratu : MPW-W-210055

Data Inspesaun : 25/ 01/ 2022

Fatin Inspesaun : Laleia, Cairui

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.540587°, Latetude : 126.161209°

End Point : Long : -8.609667°, Latetude : 126.143949°


Naran Inspector : 1. Jose R. C Gusmão

2. Augusta da Costa Ferreira

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Gravel Surface

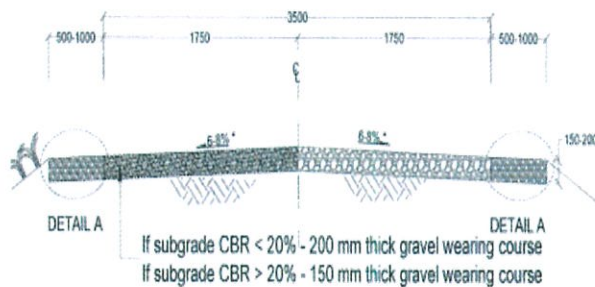

SECTION - 1 GRAVEL SURFACE PAVEMENT

P = 7.5 Km



#ANEXU C1 (LAL- 4)

Back-up Data


Naran Projeto : R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage
0+000-9+800

No. kontratu : MPW-W-210055


Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Gravel Surface




SECTION - 1 GRAVEL SURFACE PAVEMENT

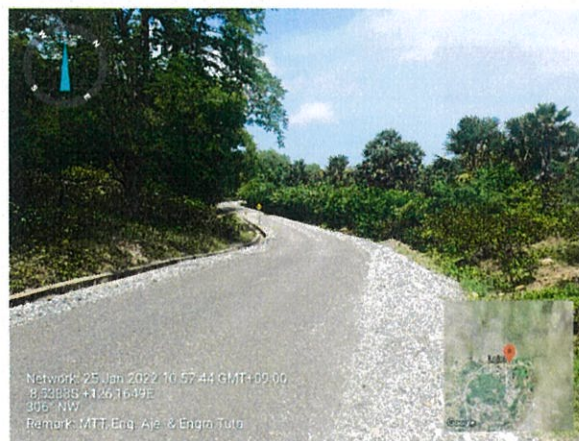

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Clearing Line Drain

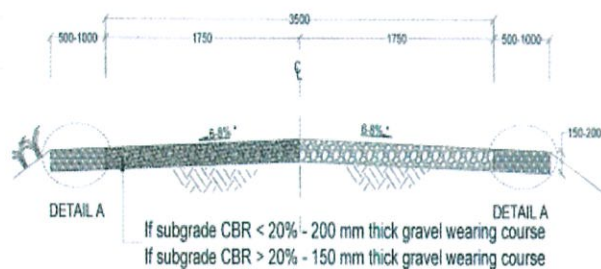

SECTION - 1 GRAVEL SURFACE PAVEMENT





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (LAL- 4)

Naran Projeto : RD4 RURAL ROAD ROUTINE MAINTENANCE HATULARAN - CAIRUI CAINAGE 0+000 - 9 + 800
No. kontratu : MPW-W-210055
Naran Kompanhia : AS Jazesia, Unip, Lda

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)						
R-01	General	\$ 1,350.00	\$ 150.00	0.53%	\$ -	0.00%	\$ 150.00	0.53%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 934.21	\$ -	0.00%	\$ 717.94	2.54%	\$ 717.94	2.54%
R-10	Dayworks	\$ 70.00	\$ 140.00	0.50%	\$ -70.00	-0.25%	\$ 70.00	0.25%
R-11	Routine Maintenance	\$ 15,646.00	\$ 6,660.00	23.57%	\$ 3,360.50	11.89%	\$ 10,020.50	35.46%
R-15	Provisional Sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 18,200.21	\$ 6,950.00	24.59%	\$ 4,008.44	14.2%	\$ 10,958.44	38.8%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 1,820.02	\$ 695.00	2.46%	\$ 400.84	1.42%	\$ 1,095.84	3.88%
C	General Item	\$ 7,684.00	\$ 1,505.25	5.33%	\$ 3,058.00	10.82%	\$ 4,563.25	16.15%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 554.08	\$ 152.90	0.65%	\$ 149.35	0.53%	\$ 332.35	1.18%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 28,258.31	\$ 9,303.15	33.03%	\$ 7,616.63	26.95%	\$ 16,949.88	59.98%

Verifika Husi :

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Jose R Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte
e Irigação Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

2. (Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte
e Irigação Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

(Eng. Aniceto da Costa)
Eng. Senior ba projeto
Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN.I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (LAL-4)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800

Kompanha : As Jazesia Unipessoal Lda

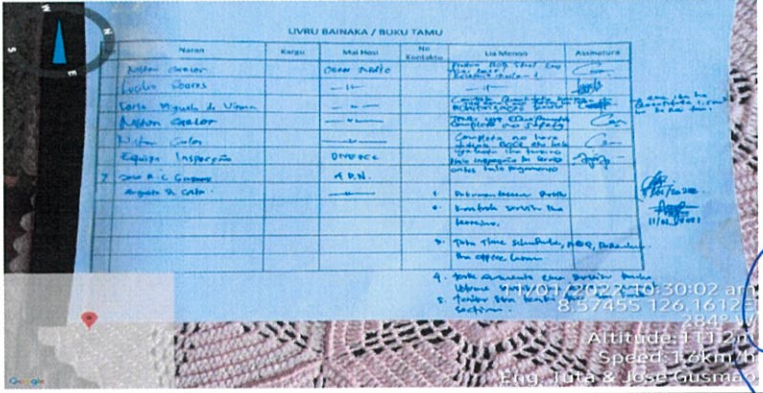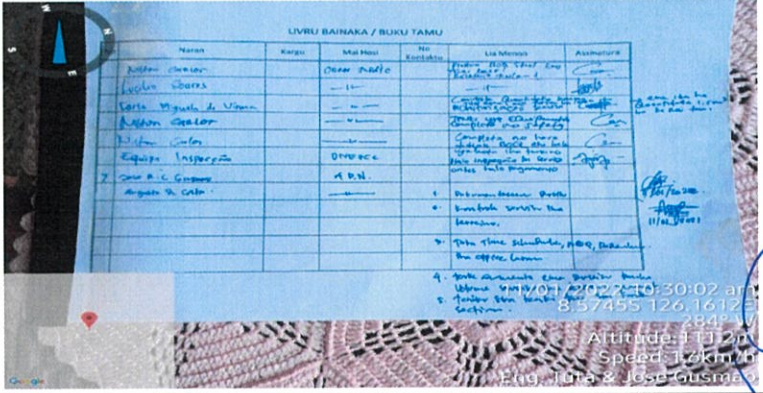No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	25/ 01/ 2022	Manatuto/ Laleia	Eng. Jose Roberto Carlos Gusmão	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Dokumentasaun servisu	
					2	kontrola servisu iha terreno	
					3	Taka Time Schedule no BOQ iha Office laran	
					4	husu ba Engenheiro sira tenki monta Sta. ba kada section.	
II	25/ 01/ 2022	Manatuto/ Laleia	Eng. Augusta da Costa Ferreira	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Dokumentasaun servisu	
					2	kontrola servisu iha terreno	
					3	Taka Time Schedule no BOQ iha Office laran	
					4	husu ba Engenheiro sira tenki monta Sta. ba kada section.	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC- 8)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage
12+000 - 27+000

No. kontratu : MPW-W-210057

Data Inspesaun : 02/ 12 /2021

Fatin Inspesaun : Laclubar - Fatuk Makerek, Manatuto

Koordinadas :

Start Point : Long : 8.7484S, Latetude : 125.9052E


End Point : Long : 8.7804S, Latetude : 125.77.14E

Naran Inspector : 1. Augusta da Costa Ferreira

2. Jose Roberto. C Gusmão

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu loke Estrada no ateru
gravel



Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LAC- 8)

Back-up Data


Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage
12+000 - 27+000

No. kontratu : MPW-W-210057

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu ateru gravel



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu ateru gravel tuir nia
medida 5 m





#ANEXU C2 (LAC - 8)

Road Name Funar-Fatumaquerec
Municipality Manatuto
Postu Laclubar
Sukos Orlalan, Funar and Fatumaquerec

Chainage start 12+000
Chainage end 27+000
Length 15.0 Km

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 2,540.00	\$ 1,150.00	0.26%	\$ 150.00	0.03%	\$ 1,300.00	0.29%
R-03	Earth Work	\$ 49,163.64	\$ 156,733.60	34.97%	\$ 178,700.50	39.87%	\$ 335,434.10	74.84%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 1,083.60	\$ -	0.00%	\$ 1,083.60	0.24%	\$ 1,083.60	0.24%
R - 08	Structure	\$ 293,471.16	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-10	Dayworks	\$ 175.00	\$ 105.00	0.02%	\$ -	0.00%	\$ 105.00	0.02%
R-11	Routine Maintenance	\$ 26,101.20	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional Sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 372,734.60	\$ 157,988.60	35.25%	\$ 179,934.10	40.1%	\$ 337,922.70	75.39%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 37,273.46	\$ 15,798.86	3.52%	\$ 17,993.41	4.01%	\$ 33,792.27	7.54%
C	General Item	\$ 29,412.91	\$ 1,324.20	0.30%	\$ 3,948.70	0.88%	\$ 5,272.90	1.18%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 8,788.42	\$ 3,475.75	0.78%	\$ 4,037.52	0.90%	\$ 7,539.76	1.68%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 448,209.39	\$ 411.98	39.85%	\$ 205,913.73	45.94%	\$ 384,527.62	85.79%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Jose R/ Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Municipiu Matatuto, ADN.I.P




2. (Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Municipiu Matatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. Aniceto da Costa
Eng. Senior ba projeto
Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P

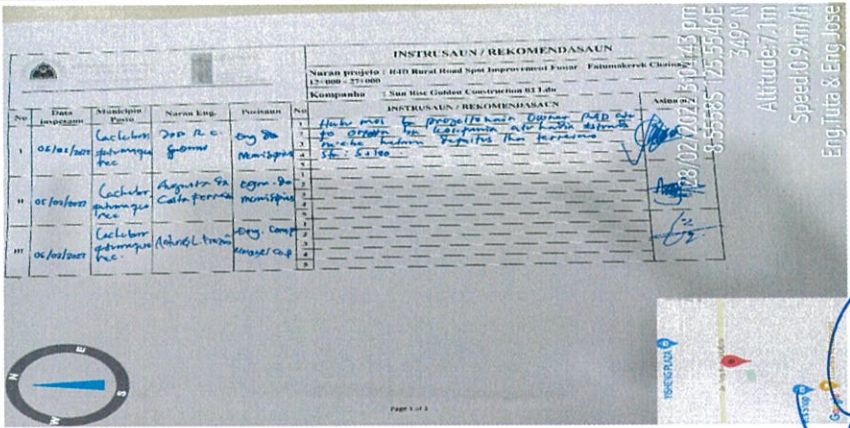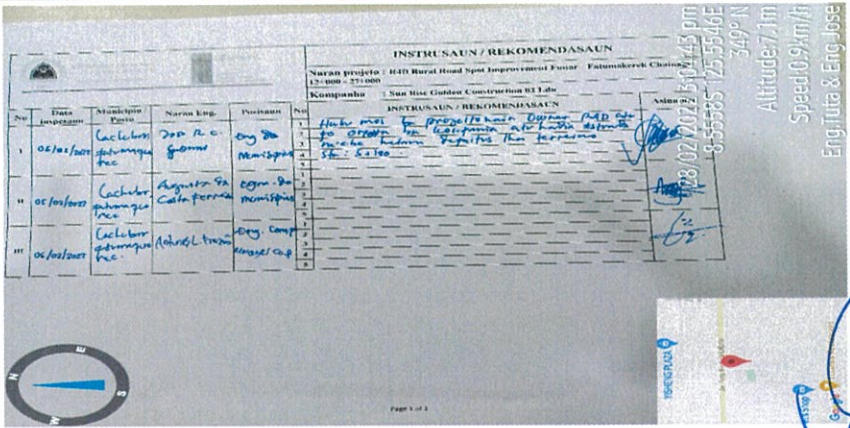 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público						INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000 Kompanha : Sun Rise Golden Construction 02 Lda		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	27/01/2022	Manatuto/ Soibada	Jose R. Carlos Gusmão	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	husu mos ba Projetu Nain (Owner) R4D atu fo orientasaun ba Kompanhia atu hadia estrada ne'ebe hetan defeitus iha terenu iha Sta. 5+120 		
					2			
					3			
					4			
					5			
II	27/01/2022	Manatuto/ Soibada	Augusta da Costa Ferreira	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	husu mos ba Projetu Nain (Owner) R4D atu fo orientasaun ba Kompanhia atu hadia estrada ne'ebe hetan defeitus iha terenu iha Sta. 5+120 		
					2			
					3			
					4			
					5			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-2)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river,
jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste

No. kontratu : SSS/013/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 27/ 01/ 2022

Fatin Inspesaun : Soibada, Fatucamanau

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.864667917S Latetude : 125.95837902E

End Point : Long : -8.86475834S, Latetude : 125.95738057E


Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmão

2. Eng. Augusta da Costa Fereirra

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu la iha tanba kompanhia
seidauk kontinua servisu.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

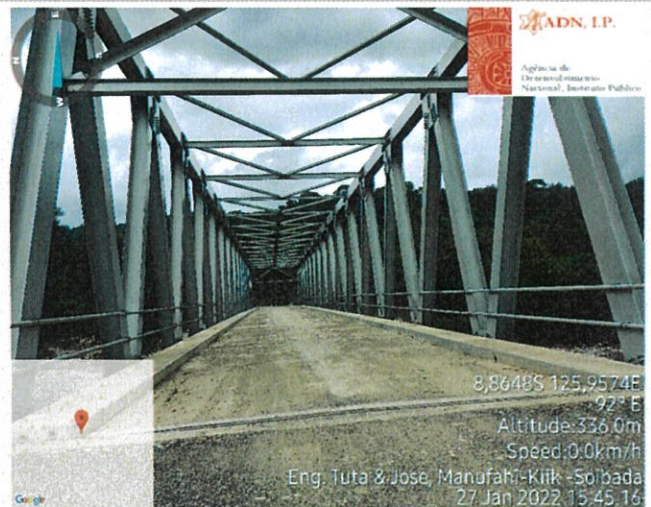



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-2)

Back-up Data

Naran Projeto

: Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river,
jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste

No. kontratu

: SSS/013/MOPTC-2017





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Escola Sekundario Teknik Vokasional Soibada Suko
Manlala-Posto Adm Soibada-Municipiu Manatuto
No. kontratu : Kontratu 01/PDIM-II/MNTT/IX/2019

Data Inspesaun : 12 Janeiro 2022

Fatin Inspesaun : Soibada

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.8601,

Latetude : 125.9394

End Point : Long :,

Latetude :

Naran Inspector : Aleixo Da Costa Andrade

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu .

Item serbisu Pinta no lutu (Pagar
pengaman)





#ANEXU C1 (SO-3)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Escola Sekundario Teknik Vokasional Soibada Suko
Manlala-Posto Adm Soibada-Municipiu Manatuto**


No. kontratu : **Kontratu 01/PDIM-II/MNTT/IX/2019**

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu

Item Serbisu Varanda/Teras

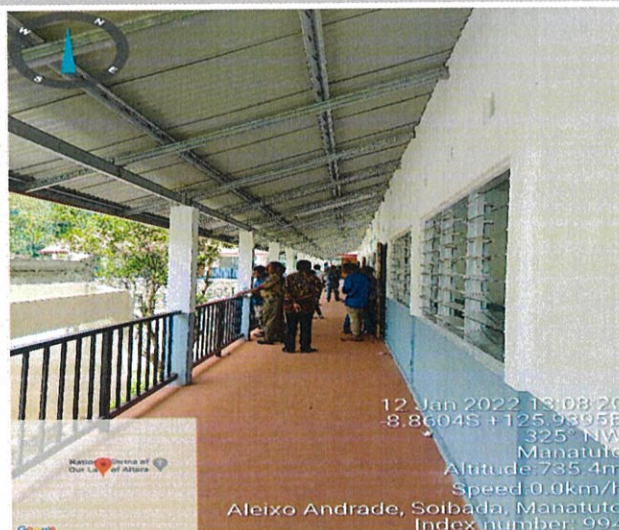

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu.

Item servisu Kuadro no Acessories





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Escola Sekundario Teknik Vokasional Soibada Suko
Manlala-Posto Adm Soibada-Municipiu Manatuto
No. kontratu : Kontratu 01/PDIM-II/MNTT/IX/2019

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu.

Item servisu eletricidade

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu .

Serbisu Pagar Pengaman no Rampa

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

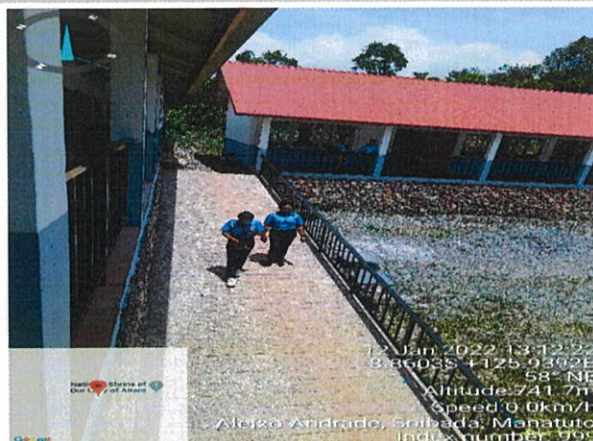



#ANEXU C2 (SO-3)
SUMMARY BOQ

Projeito Nia Naran : Konstrusaun Escola Sekundario Teknik Vokasional Soibada Suko Manlala-Posto Adm Soibada-
Lokalizasaun Projeito : Manlala Soibada

ORIGINAL CONTRACT			PROGRESS PAYMENT BY A D N					
NO	DESCRIPTION	AMOUNT (US\$)	PREVIOUS BILLING		THIS BILLING		TOTAL TO DATE	
			Amount US\$	%	Amount US\$	%	Amount US\$	%
I	PRELIMINARIES (Pekerjaan Persiapan)	\$ 2,800.00	\$ 2,195.00	1.20%	\$ 605.00	0.33%	\$ 2,800.00	1.53%
II	GROUNDWORK (Pekerjaan Tanah)	\$ 9,043.57	\$ 9,043.09	4.93%	\$ -	0.00%	\$ 9,043.09	4.93%
III	CONCRETE (Pekerjaan Beton)	\$ 27,583.58	\$ 25,900.29	14.12%	\$ 404.19	0.22%	\$ 26,304.48	14.34%
IV	STONE MASONRY AND MASONRY BLOCKWORK (Pek. Pasangan batu dan pasang batako)	\$ 16,295.38	\$ 15,669.41	8.54%	\$ 625.98	0.34%	\$ 16,295.38	8.89%
V	Steel Roof Structure & Ceiling (Struktur Atap Baja dan Plafond)	\$ 28,601.71	\$ 28,491.76	15.54%	\$ 30.00	0.02%	\$ 28,521.76	15.55%
VI	JOINERY FIXTURES	\$ 1,572.86	\$ -	0.00%	\$ 1,572.86	0.86%	\$ 1,572.86	0.86%
VII	ROOFING (Pek. Atap)	\$ 18,803.75	\$ 17,689.18	9.65%	\$ 1,114.57	0.61%	\$ 18,803.75	10.25%
VIII	WINDOWS (Pekerjaan Jendela)	\$ 8,738.40	\$ 8,666.40	4.73%	\$ 72.00	0.04%	\$ 8,738.40	4.77%
IX	DOORS AND HARDWARE (Pek. Pintu, Penggantung dan pengunci)	\$ 4,135.00	\$ 4,132.00	2.25%	\$ 0.00	0.00%	\$ 4,132.00	2.25%
X	FINISHES (Pek Finishing atau plesteran)	\$ 14,719.49	\$ 14,058.52	7.67%	\$ 660.97	0.36%	\$ 14,719.49	8.03%
XI	PAINTING (Pek. Pengecatan)	\$ 4,377.79	\$ 4,377.79	2.39%	\$ -	0.00%	\$ 4,377.79	2.39%
XII	PLUMBING	\$ 8,669.41	\$ 4,590.05	2.50%	\$ 4,068.36	2.22%	\$ 8,658.41	4.72%
XIII	ELECTRICAL INSTALLATION (full installation)	\$ 4,366.45	\$ 2,302.65	1.26%	\$ -	0.00%	\$ 2,302.65	1.26%
XIV	SITE WORK	\$ 10,874.75	\$ 3,608.49	1.97%	\$ 4,011.06	2.19%	\$ 7,619.54	4.16%
XV	GRAND TOTAL,CA,CB,SITE WORK	\$ 160,582.14	\$ 140,724.61	76.74%	\$ 13,164.98	7.18%	\$ 153,889.59	83.92%
XVI	PROFIT 10% X A	\$ 16,058.21	\$ 14,072.46	7.67%	\$ 1,316.50	0.72%	\$ 15,388.96	8.39%
XVII	OVERHEAD	\$ 2,900.00	\$ 2,030.00	1.11%	\$ -	0.00%	\$ 2,030.00	1.11%
XVIII	TAXA 2 % X (A + B + C)	\$ 3,590.81	\$ 3,136.54	1.71%	\$ 289.63	0.16%	\$ 3,426.17	1.87%
XIX	CONTIGENCY	\$ 250.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
XX	GRAND TOTAL WITH CONTIGENCY	\$ 183,381.16	\$ 159,963.62	87.23%	\$ 14,771.11	8.05%	\$ 174,734.72	95.28%

Prepara husi :

(Eng. Aleixo Da Costa Andrade)
Eng. ba Porjecto Edificio Publico Beé no
Saneamento Municipio Manatuto,ADN,I.P

Verifika Husi :

(Arch. Francisco Xavier De D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edificio Publico no Agua
Saneamento ADN, I.P.

Sertifika husi :

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN,I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, LP.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (SO-3)
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)

Kompanha : Manufahi Kiik Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	12/01/2022	Soibada	Aleixo Da Costa Andrade	Eng. Municipiu Manatuto	1	Husu ba kompanha atu halo justifikasaun ba item serbisu hirak neebe mak iha mudansa	
					2	Husu ba kompanha atu halo mos justifikasaun ba utilajasaun osan Overhead ho osan Contigency	
					3	Husu ba kompanha atu halo asbuiltdrawing	
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO - 5)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada
Chainage 0+000-2+000

No. kontratu : MPW-W-210059

Data Inspesaun : 27/01/2022

Fatin Inspesaun : Soibada, Buah Rahun

Koordinadas :

Start Point : Long : 8,8399S Latetude: 125,9171E


End Point : Long : 8,82990S Latetude: 125,9223E

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R C Gusmão

2. Eng. Augusta da Costa Ferreira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Line Drain

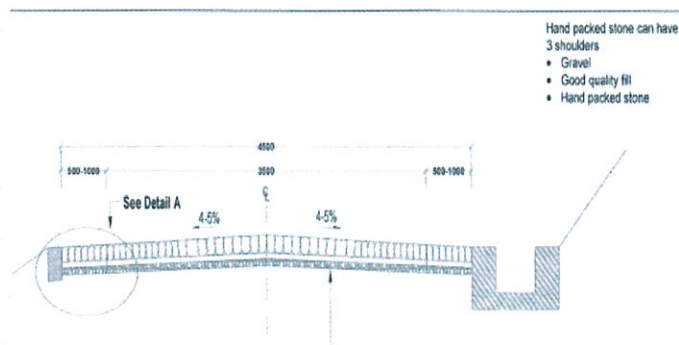

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



$P = 25.6m$, $L = 1.20 m$, $T = 0.40m$

Volume= 12.288 m³



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL




ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


#ANEXU C1 (SO - 5)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada
Chainage 0+000-2+000
No. kontratu : MPW-W-210059



Drain Type - I



Drain Type - II




Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Stone Masonry

$$P = 110m, (0.3+0.6)/2 * 1.2$$

$$V = 13.056 m^3$$

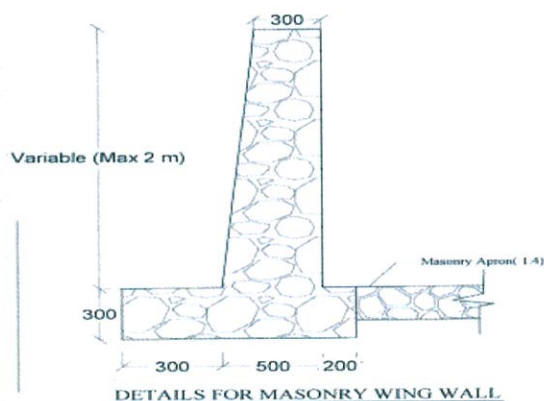

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (SO - 5)

Road Name : Manlala(Manufahi Kiik) - Soibada Chainage start 0 + 000
Municipality : Manatuto Chainage end 2+000
Postu : Soibada Length 2.0 Km
Sukos : Manufahi Kiik

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 2,990.00	\$ 1,750.00	0.86%	\$ -	0.00%	\$ 1,750.00	0.86%
R-03	Earth work	\$ 11,037.21	\$ 370.92	0.18%	\$ 255.49	0.13%	\$ 626.42	0.31%
R-05	Sub-base, Base and Pavament	\$ 13,353.74	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structures	\$ 121,257.00	\$ 12,369.58	6.09%	\$ 5,903.81	2.91%	\$ 18,273.39	9.00%
R-10	Dayworks	\$ 1,750.00	\$ 105.00	0.05%	\$ -	0.00%	\$ 105.00	0.05%
R-11	Routine maintenance	\$ 4,205.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-15	Provisional sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 154,792.95	\$ 14,595.50	7.19%	\$ 6,159.30	3.0%	\$ 20,754.80	10.2%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 15,479.29	\$ 1,459.55	0.72%	\$ 615.93	0.30%	\$ 2,075.48	1.02%
C	General Item	\$ 28,783.23	\$ 5,034.50	2.48%	\$ -	0.00%	\$ 5,034.50	2.48%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 3,981.11	\$ 321.10	0.21%	\$ 135.50	0.07%	\$ 557.30	0.27%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 203,036.57	\$ 136.30	10.59%	\$ 6,910.73	3.40%	\$ 28,422.08	14.00%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Jose R Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Matatuto, ADN.I.P


2. (Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. Aniceto da Costa
Eng. Senior ba projeto
Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público			#ANEXU D (SO-5)	
								INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
								Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kiik) - Soibada Chainage 0+000-2+000 Kompanha : Manufahi Kiik Unip. Lda	
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura	
I	27/01/2022	Manatuto/ Soibada	Jose Roberto Carlos Gusmão	Eng. Ba Projetu ITI Munispiu Manatuto	1	Engenheiro Munisipiu halo duni inspesaun maibe iha terreno Kompanhia la servisu			
II	27/01/2022	Manatuto/ Soibada	Agusta da Costa Ferreira	Eng. Ba Projetu ITI Munispiu Manatuto					



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-6)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage
8+000-10+700

No. kontratu : MPW-W-210057

Data Inspesaun : 27/ 01 /2022

Fatin Inspesaun : Soibada, Fatuk Makerek

Koordinadas :

Start Point : Long : 8,8510S Latetude : 125,8697E


End Point : Long : 8,8683S Latetude : 125,8736E

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. C. Gusmão

2. Eng. Augusta da Costa Ferreira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu Excavation for line drain

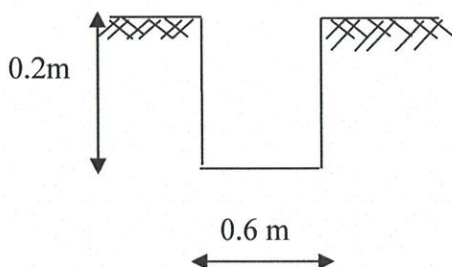

$P = 158\text{m}$, $L = 0.6\text{m}$, $t = 0.2\text{m}$

Volume = 31.60 m³

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SO-6)

Back-up Data


Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage
8+000-10+700

No. kontratu : MPW-W-210057

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu stone masonry

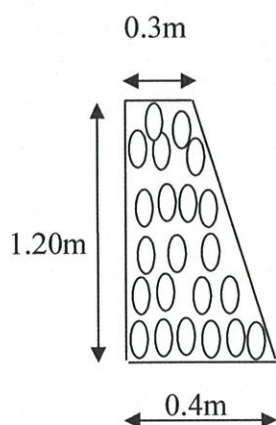


P=74.70m, L= 0.30 cm, t=1.20cm

Volume= 35.86m³



Sketch & Foto Desenho item Servisu Line Drain

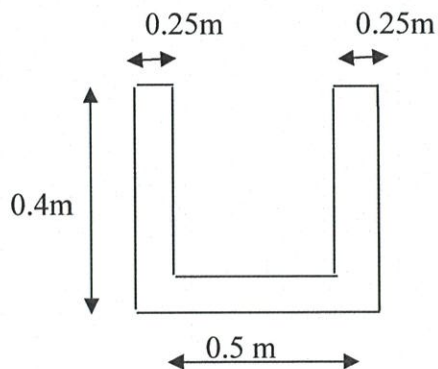

P = 158.50m, L= 0.5m, T = 0.4m

Volume = 31.70m³

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (SO - 6)

PROJECT NAME : R4D RURAL ROAD SPOT IMPROVEMENT, SOIBADA - FATUMAKEREK CHAINAGE 8+000 - 10+700

CONT.NUMBER : MPW - W - 210060

SUCO SASAHI - FATUMAQUEREC

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 3,040.00	\$ 1,000.00	0.51%	\$ 300.00	0.15%	\$ 1,300.00	0.66%
R-03	Earth Work	\$ 9,242.27	\$ 557.28	0.28%	\$ 959.09	0.49%	\$ 1,516.37	0.77%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 12,677.94	\$ -	0.00%	\$ 5,762.70	2.94%	\$ 5,762.70	2.94%
R - 08	Structure	\$ 119,043.38	\$ 11,096.12	5.66%	\$ 8,565.70	4.37%	\$ 19,661.82	10.03%
R-10	Dayworks	\$ 1,750.00	\$ -	0.00%	\$ 420.00	0.21%	\$ 420.00	0.21%
R-11	Routine Maintenance	\$ 5,800.25	\$ -	0.00%	\$ 638.00	0.33%	\$ 638.00	0.33%
R-15	Provisional Sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 151,753.84	\$ 12,653.40	6.45%	\$ 16,645.49	8.49%	\$ 29,298.89	14.9%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 15,175.38	\$ 1,265.34	0.65%	\$ 1,664.55	0.85%	\$ 2,929.89	1.49%
C	General Item	\$ 25,337.67	\$ 1,570.00	0.80%	\$ 2,203.50	1.12%	\$ 3,773.50	1.92%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 3,845.34	\$ 278.37	0.16%	\$ 410.27	0.21%	\$ 720.05	0.37%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 196,112.23	\$ 15,767.12	8.06%	\$ 20,923.80	10.67%	\$ 36,722.32	18.73%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Jose R Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Matatuto, ADN.I.P



2. (Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. Aniceto da Costa
Eng. Senior ba projeto
Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P

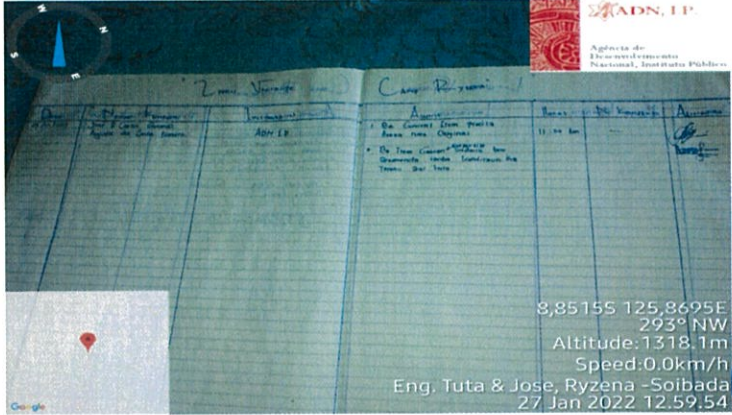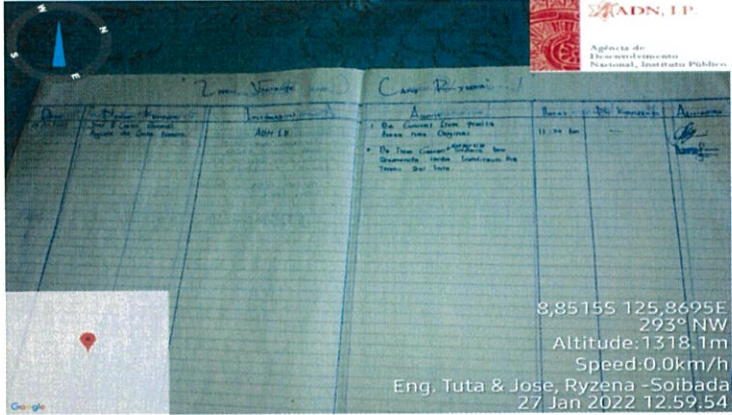 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (SO- 6) INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700							
Kompanha : Ryzena Unipessoal Lda							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	27/01/2022	Manatuto/ Soibada	Jose Roberto Carlos Gusmão	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Ba General Item presiza anexa nota Orijinal	
					2	ba Item Gabion no Geotextile seidauk bele rekomenda no presiza hadia tanba kondisaun iha terreno aat hela	
II	27/01/2022	Manatuto/ Soibada	Augusta da Costa Ferreira	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Ba General Item presiza anexa nota Orijinal	
					2	ba Item Gabion no Geotextile seidauk bele rekomenda no presiza hadia tanba kondisaun iha terreno aat hela	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA- 8)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Periodic Maintenance Kaen Laran - Barique Chainage
0+000 - 9+000 & Routine, Hatularan-Cairui Chainage 0+000-9+800 (162)
No. kontratu : MPW-W-W-190080

Data Inspesaun : 12/ 01/ 2022

Fatin Inspesaun : Barique

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°50'13.288"S, Latitude: 126°1'4.064"E

End Point : Long : -8°50'11.206"S, Latitude: 126°126'053"E

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmão
2. Eng. Augusta da Costa Ferreira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu laiha tanba Kompanhia
la halo servsiu iha terreno

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C1 (BA - 11)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage
0+000-9+000

No. kontratu : MPW-W-210058

Data Inspesaun : 12/01/2022

Fatin Inspesaun : Barique, Kaen laran

Koordinadas :

Start Point : Long : -8.839898°, Latetude : 126.004266°


End Point : Long : -8.853010°, Latetude : 126.061603°

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmão
2. Eng. Augusta da Costa Ferreira
3. Eng. Aleixo de Andrade

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Stone masonry
for Line Drain

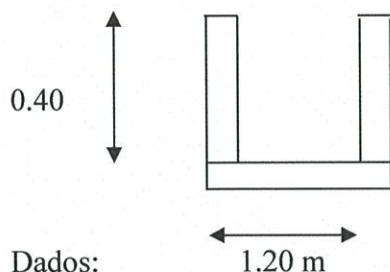

Dados:

P= 305 m

L= 1.20 m

t= 0.40 m

Resolução:

Formula: $P \times L \times t$

Volume= 219. 60 m3





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (BA - 11)

Back-up Data

Naran Projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage
0+000-9+000

No. kontratu : MPW-W-210058

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Routine
maintenance - dry season no dry
season





#ANEXU C2 (BA - 11)

Naran Projeto : R4D RUAL ROAD SPOT IMROVEMENT, KEAN LARAN - BARIQUE CHAINAGE 0+000 - 9 + 000
No. kontratu : MPW - W - 210058
Postu : Barique
Sukos : Barique
Naran Companhia : Gimso ,Unip. Lda

SUMMARY

SECTION NO	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST (US\$)	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PREVIOUS BILLING (USD)	PERCENT PREVIOUS BILLING	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS MONTH	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
R-01	General	\$ 2,980.11	\$ 500.00	0.17%	\$ 800.00	0.27%	\$ 1,300.00	0.43%
R-03	Earth work	\$ 11,414.65	\$ 406.41	0.14%	\$ 199.93	0.07%	\$ 606.34	0.20%
R - 05	Sub-base, Base and Pavement	\$ 32,040.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
R-08	Structures	\$ 181,126.91	\$ 5,764.06	1.92%	\$ 223.68	0.07%	\$ 5,987.74	1.99%
R-10	Dayworks	\$ 175.00	\$ 105.00	0.03%	\$ -	0.00%	\$ 105.00	0.03%
R-11	Routine Maintenance	\$ 14,384.50	\$ -	0.00%	\$ 1,310.00	0.44%	\$ 1,310.00	0.44%
R-15	Provisional Sum	\$ 200.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	Construction Cost	\$ 242,321.16	\$ 6,775.48	2.25%	\$ 2,533.61	0.84%	\$ 9,309.08	3.09%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ 24,232.12	\$ 677.55	0.23%	\$ 253.36	0.08%	\$ 930.91	0.31%
C	General Item	\$ 28,341.30	\$ 2,000.00	0.66%	\$ 2,445.00	0.81%	\$ 4,445.00	1.48%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ 5,897.89	\$ 189.06	0.06%	\$ 104.64	0.03%	\$ 293.70	0.10%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 300,792.46	\$ 57.33	3.21%	\$ 5,336.61	1.77%	\$ 14,978.69	4.98%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Jose R Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e
Irrigação Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

2. (Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Irrigação
Munisipiu Matatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. Aniceto da Costa
Eng. Senior ba projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN.I.P



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU D (BA-11)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : R4D Rural Road Spot Improvement Kaen-Laran - Barique Chainage 0+000-9+000

Kompanha : Gimso Brothers Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura
I	24/01/2022	Manatuto/ Barique	Jose R. Carlos Gusmão	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Manatuto	1	Husu ba Eng. Companhia atu orienta servisu iha terenu atu lao tuir nafatin spesifikasaun, Desenho no BOQ ne'ebe iha.		
					2	Kompania persija hadia time schedule ho rajaun tamba projeto refere lao tarde, tamba ne'e husu ba projeto nai atu kompania atu muda time schedule		
II	24/01/2022	Manatuto/ Barique	Augusta da Costa Ferreira	Eng. Ba Projeto ITI Munisipiu Manatuto	1	Husu ba Eng. Companhia atu orienta servisu iha terenu atu lao tuir nafatin spesifikasaun, Desenho no BOQ ne'ebe iha.		
					2	Kompania persija hadia time schedule ho rajaun tamba projeto refere lao tarde, tamba ne'e husu ba projeto nai atu kompania atu muda time schedule		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA - 4)

Back-up Data

Naran Projeto : Routine Roads Maintenance - Lacro, Manatuto Municipality
No. kontratu : MPW-W-190251

Data Inspesaun : 13-26 / 01 / 2021

Fatin Inspesaun : Manatuto/ Lacro

Koordinadas :


Start Point : Long : 125°9'15.24541, Latetude : -8.55757187

End Point : Long : 125°9'13.84094, Latetude : -8.55721745

Naran Inspector : 1. Eng. Jose R. Carlos Gusmão
2. Eng. Augusta da Costa Ferreira

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item Servisu Excavation Stone
Masonry ba pondasi

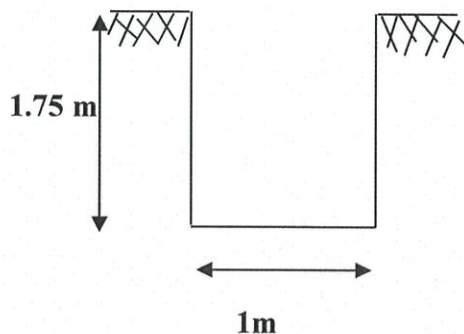

RESOLUÇÃO:

$P = 50 \text{ m}$, $L = 1 \text{ m}$, $T = 1.75 \text{ m}$

$V = 56.25 \text{ m}^3$

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (LA - 4)


Back-up Data

Naran Projeto : Routine Roads Maintenance - Lacle, Manatuto Municipality
No. kontratu : MPW-W-190251

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Sketch Item servisu Pondasi Stone

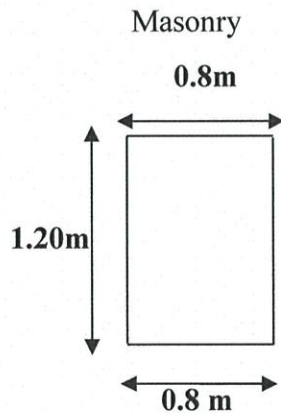


Dadus

$P = 50m$, $La = 0.8m$, $Lb = 0.8m$, $T = 0.8m$

$V = 32 m^3$



Sketch Item servisu Stone Masonry

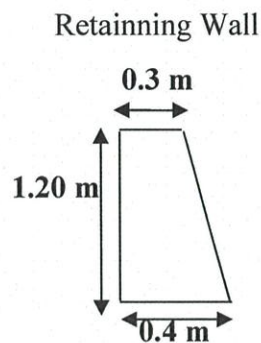

Dadus :

$P = 50$, $L = 0.35m$, $T = 1.20m$

$V = 21m^3$





#ANEXU C2 (LA-4)

Projeitu : Routine Roads Maitanece Lacio, Manatuto Municipality Sta: 0+000 - 0+8.500
Fatin Projeitu : Posto Administrativo Lacio, Municipio Manatuto
Contraktor : EGANA UNIP,Lda
No. kontratu : MPW-W-190251

SUMMARY

SECTION NO.	DESCRIPTION	TOTAL CONTRACT COST	PROGRESS PAYMENT BY A D N					
			PERECENT PREVIOUS	PERECENT PREVIOUS	THIS BILLING (USD)	PERCENT THIS	TOTAL TO DATE (USD)	% TO DATE
		(US\$)	BILLING			MONTH		
100	GENERAL REQUIRMENTS	\$ 11,391.20	\$ 6,650.00	2.97%	\$ -	0.00%	\$ 6,650.00	2.97%
200	EARHTWORK	\$ 38,906.52	\$ 5,125.59	2.29%	\$ 441.39	0.20%	\$ 5,566.98	2.49%
400	SUB BASE AND BASE COURSE	\$ 33,672.53	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 1,091.53	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 138,774.72	\$ 77,653.99	34.69%	\$ 8,597.54	3.84%	\$ 86,251.52	38.53%
A	Construction Cost	\$ 223,836.50	\$ 89,429.57	39.95%	\$ 9,038.93	4.04%	\$ 98,468.50	43.99%
B	Profit & Over Head (10% x A)	\$ -	\$ 8,942.96	4.00%	\$ 903.89	0.40%	\$ 9,846.85	4.40%
C	OverHead	\$ -	\$ 3,450.00	1.54%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
D	Tax 2 % x (A+B)	\$ -	\$ 2,036.45	0.91%	\$ 198.86	0.09%	\$ 2,166.31	0.97%
E	GRAND/GROSS TOTAL	\$ 223,836.50	\$ 103,858.98	46.40%	\$ 10,141.68	4.53%	\$ 110,481.66	50.93%

Inspeksaun Husi:

1. (Eng. Jose R Carlos Gusmão)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Iririgação
Munisipiu Manatuto, ADN.I.P



2. (Eng. Augusta da Costa Ferreira)
Eng. ba Projecto Infraestrutura Transporte e Iririgação
Munisipiu Manatuto, ADN.I.P

Verifika Husi :

Eng. Aniceto da Costa
Eng. Senior ba projeito Infraestrutura, Transporte e
Irigasaun, ADN.I.P

Sertifika husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validaçã
Qualidade, ADN.I.P

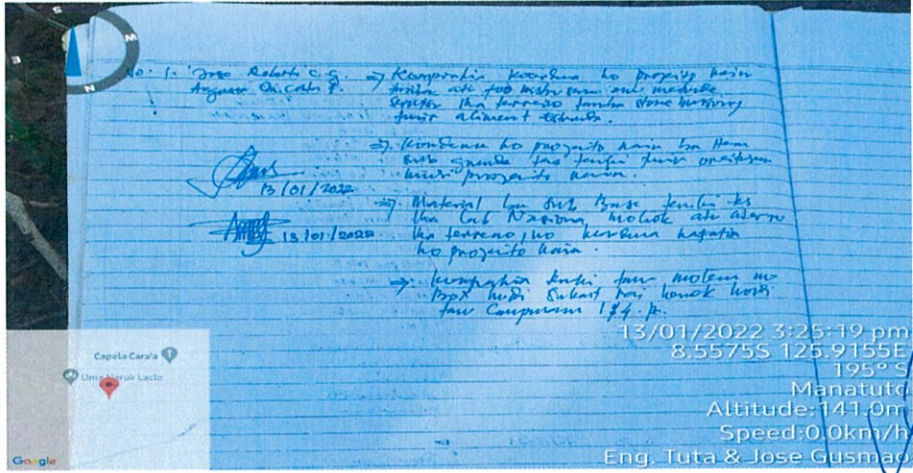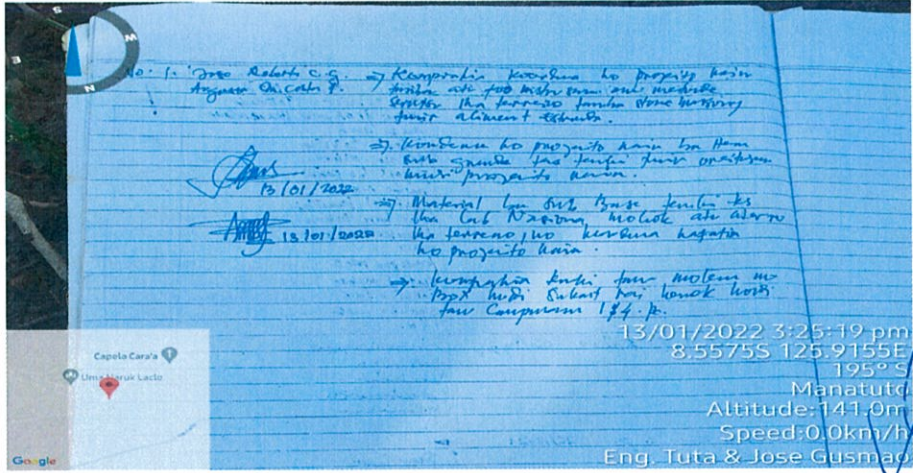 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					#ANEXU D (LA-4)			
INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN								
Naran projeto : Routine Roads Maintenance - Lacro, Manatuto Municipality								
Kompanha : Egana, Unip. Lda								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura
I	13-26/01/2021	Manatuto/ Lacro	Eng. Jose Roberto Carlos Gusmão	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Kompanha koordena ho Projetu Nain kona ba atu fo instrusaun no metodu servisu iha terreno tanba Stone Masonry tenki tuir alinhamento estrada.		
					2	Koordena ho Projeti nain ba item sub grade tenki test no tuir orientasaun husi projetu nain		
					3	Material ba Sub Base tenki tenki tes iha lab molok atu aterro iha terreno, no koordena nafatin ho projetu nain.		
					4	Kompanhia tenki uza box hodi sukat rai henek hodi halo campuran 1:4		
II	13-26/01/2021	Manatuto/ Lacro	Eng. Augusta da Costa Ferreira	Eng. Ba Projetu ITI Munisipiu Manatuto	1	Kompanha koordena ho Projetu Nain kona ba atu fo instrusaun no metodu servisu iha terreno tanba Stone Masonry tenki tuir alinhamento estrada.		
					2	Koordena ho Projeti nain ba item sub grade tenki test no tuir orientasaun husi projetu nain		
					3	Material ba Sub Base tenki tenki tes iha lab molok atu aterro iha terreno, no koordena nafatin ho projetu nain.		
					4	Kompanhia tenki uza box hodi sukat rai henek hodi halo campuran 1:4		



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.		Aleixo de Andrade						2022																															
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiro																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MANATUTO VILA (MV)	3	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																												On Going				
							Actual																																Projeto refere kontinua Lao
	6	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	Ralan Unip. Lda	03/PDIM-II/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																												On Going				
							Actual																																Inspeksaun realija dala ida deit projeto refere remata ona
	7	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																												Pendenti				
							Actual																																Planu refere muda no halo inpeksaun ba projeto Foun husi MS nian no serbisu seluk
	8	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																													Pendenti			
							Actual																																Planu refere muda no halo inpeksaun ba projeto Foun husi MS nian no serbisu seluk
	9	Servisu Manutensaun Edifisiu CRC Munisipiu Manatuto	Baboe Unip Lda	019/Janeiro/2020	LM	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																													FHO			
							Actual																																Projeto refere remata ona
	10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-186	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													On Going			
							Actual																																Projeto refere hein halo inpeksaun ba tempo retensaun nian
13	Konstrusaun Fatin Isolamentu iha Munisipiu Manatuto	Talamori Unip,Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													On Going				
						Actual																																Projeto refere kontinua lao	
LALEA (LAL)	1	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/VII/DILI/2019/E DIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																												Pendenti				
							Actual																																
	2	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	Hare Unip.Lda	02/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																												PHO				
							Actual																																Projeto refere hein halo inpeksaun ba tempo retensaun 10%
LACLUBAR (LAC)	3	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	Ladiama Unip. Lda	04/PDIM I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																											On Going					
							Actual																																Planu refere muda no halo inpeksaun ba projeto Foun husi MS nian no serbisu seluk
	4	Konstrusaun Rezidencia PesoaI Iha iha Suku Funar - Laklubar	Tonijo Unip. Lda	05/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																											PHO					
							Actual																																
	9	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	Hatuwari Unip. Lda	02/PDD-II/MNTT/VII/2015	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																												On Going				
							Actual																																Planu refere muda no halo inpeksaun ba projeto Foun husi MS nian no serbisu seluk
SOIBADA (SO)	2	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	Manufahi Kiik Unip. Lda	01/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																											On Going					
							Actual																																Projeto refere hein halo inpeksaun 100%

Naran Eng.	Aleixo de Andrade							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiro																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
BARIQUE (BA)	2	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	Tasibala II Const	RDTL/PO:2016-11272	LM	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng. Jose R. Carlos Gusmão							2022																																
Município Manatuto																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiro																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MANATUTO VILA (MV)	1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Progressu Fiziku 100%				
							Actual																																iha Data 04-10/01/2022 Eng. Munisipiu seidaok ba Muisipiu tanba prepara Schedule Planu Inpesaun, 14/01/2022 mai Dili Entrega Relatoriu Dezastre Naturais ne'ebe acontese iha fulan Dezembro 2021 ; no iha Data 17-21/01/2022 Eng. Hotu la ba Munisipiu tanba parte Logistic dehan sei encontro hodi hetan lai Karta Sirkulasaun ba Transporte Governo nian mak foin bele ba Mnisipiu
	2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	Nananki, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	SSS/061/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Progressu Fiziku 100%				
							Actual																																iha Data 04-10/01/2022 Eng. Munisipiu seidaok ba Muisipiu tanba prepara Schedule Planu Inpesaun, 14/01/2022 mai Dili Entrega Relatoriu Dezastre Naturais ne'ebe acontese iha fulan Dezembro 2021 ; no iha Data 17-21/01/2022 Eng. Hotu la ba Munisipiu tanba parte Logistic dehan sei encontro hodi hetan lai Karta Sirkulasaun ba Transporte Governo nian mak foin bele ba Munisipiu
	4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	ICB/023/MPW-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going				
							Actual																																iha Data 04-10/01/2022 Eng. Munisipiu seidaok ba Muisipiu tanba prepara Schedule Planu Inpesaun, 14/01/2022 mai Dili Entrega Relatoriu Dezastre Naturais ne'ebe acontese iha fulan Dezembro 2021 ; no iha Data 17-21/01/2022 Eng. Hotu la ba Munisipiu tanba parte Logistic dehan sei encontro hodi hetan lai Karta Sirkulasaun ba Transporte Governo nian mak foin bele ba Mnisipiu
	6	Manatuto to Laclubar (Orhua Bridge)	Manu Aman Unip.Lda	nn	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													PHO			
							Actual																																Projetu refere la iha kontinuasaun ona.
	12	Sumase River	Forte, Unip. Lda	SSS/113/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													PHO			
							Actual																																Projetu PHO maibe realidadeTerrenu Gabion kuaze 365M monu, 76m mak hetan pergeseran no Rai henek nebe alteru fali iha Gabion kotuk mos 52m hetan estragus/ nakfera.
	13	Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu, Manatuto Municipality	Ilatun, Lda	SSS/115/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													Progressu Fiziku 100%			
							Actual																																Projetu refere remata ona nia fiziku iha terenu no hein rekomendasaun ikus MOP
	14	New Const. of Gabion Tower No.04 Section Manatuto - Baucau	Geovanio Unip. Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going			
							Actual																																iha Data 04-10/01/2022 Eng. Munisipiu seidaok ba Muisipiu tanba prepara Schedule Planu Inpesaun, 14/01/2022 mai Dili Entrega Relatoriu Dezastre Naturais ne'ebe acontese iha fulan Dezembro 2021 ; no iha Data 17-21/01/2022 Eng. Hotu la ba Munisipiu tanba parte Logistic dehan sei encontro hodi hetan lai Karta Sirkulasaun ba Transporte Governo nian mak foin bele ba Mnisipiu.
3	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	As Jazesia Unipessoal Lda	MPW-W-210055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going				
						Actual																																iha Data 03/02/2022 sei toleransi de Ponto. Data 21/01/2022 Eng. Hotu la ba Munisipiu tanba parte Logistic dehan sei encontro hodi hetan lai Karta Sirkulasaun ba Transporte Governo nian mak foin bele ba Munisipiu.	
LACUBAR (LAC)	2	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	China Nuclear Industry Z2ND Construction Co; LTD	ICB/04/MPW-2014	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going				
							Actual																																Projetu refere Eng. Sira toma konta ba imprestimo mak responsabiliza
	5	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	Hatuwari Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190035	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											On Going					
							Actual																																Eng. Munisipiu labele halo monitorizasaun no razaun tanba dalan asesu kotu kauza husi Calamidade 04 Abril 2021. ADN coordena ho MOP kona ba assunto refere no sira dehan sei hein aprovasaun husi Nasional atu halo fali Re-Alinhamento foun
	6	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	Ryzena Unipessoal Lda	MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											On Going					
							Actual																																
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	MPW-W-210057	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going				
							Actual																																Projetu refere durante ne'e Eng Munisipiu la dun halo Inpesaun ho maximo tanba dalan asesu husi Laclubar kotu no wainhira Inpesaun tenki liu fali husi Turiscain.
	8	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	Adahiak Oriao Unipessoal Lda	MPW-W-210056	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going				
							Actual																																Eng. Munisipiu labele halo monitorizasaun no razaun tanba dalan asesu kotu kauza husi Calamidade 04 Abril 2021. ADN coordena ho MOP kona ba assunto refere no sira dehan sei hein aprovasaun husi Nasional atu halo fali Re-Alinhamento foun
SOIBADA (SO)	1	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	FIRDO UNIPESOAAL LDA	SSS/013/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											On Going					
							Actual																																Projetu refere nia Fiziku iha Tereno remata ona hein deit rekomendasaun ikus husi MOP
	4	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kilik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	Manufahi Kilik Unip. Lda	MPW-W-210059	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											On Going					
							Actual																																iha Data 04-10/01/2022 Eng. Munisipiu seidaok ba Muisipiu tanba prepara Schedule Planu Inpesaun, 14/01/2022 mai Dili Entrega Relatoriu Dezastre Naturais ne'ebe acontese iha fulan Dezembro 2021 ; no iha Data 17-21/01/2022 Eng. Hotu la ba Munisipiu tanba parte Logistic dehan sei encontro hodi hetan lai Karta Sirkulasaun ba Transporte Governo nian mak foin bele ba Mnisipiu
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	Ryzena Unipessoal Lda	MPW-W-210060	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going				
							Actual																																iha Data 04-10/01/2022 Eng. Munisipiu seidaok ba Muisipiu tanba prepara Schedule Planu Inpesaun, 14/01/2022 mai Dili Entrega Relatoriu Dezastre Naturais ne'ebe acontese iha fulan Dezembro 2021 ; no iha Data 17-21/01/2022 Eng. Hotu la ba Munisipiu tanba parte Logistic dehan sei encontro hodi hetan lai Karta Sirkulasaun ba Transporte Governo nian mak foin bele ba Munisipiu



Note:	Plano Período inspeção iha tereinu	Implementasaun Plano Período inspeção iha tereinu	Relatório avaliação mensal iha Dili	Inspeção Pagamento Anual iha tereinu
	Preparatúris :  (Eng. José Carlos Guspiro) Eng. do Projeto Infraestrutura e Irrigação Municipal Manatuto, ADNLP	Sertifica Husi :  (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas) Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADNLP		Aprova Häs  (Eng. Juvêncio Maia Guterres) Adjunto Director Executivo, ADNLP

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Investigação e Normalização Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Naran Eng.	Jose Roberto Carlos Gusmão						2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Município																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiro																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MANATUTO VILA (MV)	1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



[illegible]



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.		Augusta da Costa Ferreira						2022																															
Município		Manatuto																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiro																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MANATUTO VILA (MV)	1	Rehabilitation Estrada Urbanas Manatuto Vila (3.72 km) area in Manatuto Municipality Manatuto	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	SSS/062/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Progressu Fiziku 100%		
							Actual																																
	2	Rehabilitacao Estrada Urbanas Jct. Ma'abat - Manatuto Vila - Sau Ponte (4.68 km) in Manatuto Municipio Manatuto	Nananiu, Unip. Lda JV Ina Forek, Lda	SSS/061/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Progressu Fiziku 100%		
							Actual																																
	4	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	ICB/023/MPW-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going		
							Actual																																
	6	Manatuto to Laclubar (Orhua Bridge)	Manu Aman Unip.Lda	nn	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PHO	
							Actual																																
	12	Sumase River	Forte, Unip. Lda	SSS/113/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PHO	
							Actual																																
	13	Rehabilitation of Roads Monumento - Laclubar, Mercado Hua-Lu, Manatuto Municipality	Ilatun, Lda	SSS/115/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Progressu Fiziku 100%		
							Actual																																
	14	New Const. of Gabion Tower No.04 Section Manatuto - Baucau	Geovanio Unip. Lda		LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going		
							Actual																																
LALEIA (LAL)	3	R4D Rural Road Routine Maintenance Haturalan - Cairui Chainage 0+000-9+800	As Jazesia Unipessoal Lda	MPW-W-210055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going			
							Actual																																
LACLUBAR (LAC)	2	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	China Nuclear Industry 22ND Construction Co; LTD	ICB/04/MPW-2014	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going			
							Actual																																
	5	Rural Roads (R4D) Periodic Maintenance Laclubar Fatumakerek Chainage 0+000 - 27+000 (162)	Hatuwari Unip. Lda	MPW-W-NCB-R-190035	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Eng. Munisipiu labele halo monitorizasaun no razaun tanba dalan asesu kotu kauza husi Calamidade 04 Abril 2021. ADN coordena ho MOP kona ba assunto refere no sira dehan sei hein aprovasaun husi Nasional atu halo fali Re-Alinhamento foun				
							Actual																																
	6	Routine Roads Maintenance - JCTA09 Laclubar (C15) Manatuto Municipality (162)	Ryzena Unipessoal Lda	MOP/DGOP/DNEPCC/0871-VIII/2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going			
							Actual																																
	7	R4D Rural Road Spot Improvement Funar - Fatumakerek Chainage 12+000 - 27+000	Sun Rise Golden Construction 02 Lda	MPW-W-210057	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going		
							Actual																																
8	R4D Rural Road Spot Improvement Laclubar - Funar Chainage 0+000 - 12+000	Adahiak Orlao Unipessoal Lda	MPW-W-210056	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														On Going			
						Actual																																	
SOIBADA (SO)	1	Construction of New Steel Bridge 100m in Milotu Sahe river, jct.Fatucamanau, Soibada, Timor Leste	FIRDO UNIPESOAAL LDA	SSS/013/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going			
							Actual																																
	4	R4D Rural Road Spot Improvement Manlala (Manufahi Kilik) - Soibada Chainage 0+000-2+000	Manufahi Kilik Unip. Lda	MPW-W-210059	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Going				
							Actual																																
	5	R4D Rural Road Spot Improvement Soibada - Fatumakerek Chainage 8+000-10+700	Ryzena Unipessoal Lda	MPW-W-210060	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													On Going			
							Actual																																

14

2022

Note:				
Plano Periode inspesaun iha tereinu	Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu	Relatoriu avaliasun mensal iha Dili	Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu	

Prepara Husi :

(Eng. Augusta da Costa Ferrerira)
Eng. ba Projeto Infraestrutura e Irrigação Municipal
Manatuto, ADNEP

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Mata Freitas)
 Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN.I.P.

Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Ejecutivo, ADN.LP

2021



Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T.M.Eng)



PLANU INSPESAUN

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VI GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, L.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Adonis Julio Fernandes						2022																																
Município	MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MANATUTO VILA (MV)	1	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	Ralan Unip. Lda	03/PDIM-II/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	3	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	4	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	5	Costrusaun Fatin Izolamento Iha Municipio Manatuto	Talamori Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	LM	SAUDE	Plan																																
							Actual																																
6	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-186	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
						Actual																																	
LALEIA (LAL)	1	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/VI/DILI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	Hare Unip.Lda	02/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
LACLUBAR (LAC)	1	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	Ladiama Unip. Lda	04/PDIM I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
3	Konstrusaun Rezidencia Pesoa Iha iha Suku Funar - Laklubar	Tonijo Unip. Lda	05/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
						Actual																																	
4	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	Hatuwari Unip. Lda	02/PDD-II/MNTT/VI/2015	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
						Actual																																	
5	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	Manufahi Kiik Unip. Lda	01/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
						Actual																																	
BARIQUE (BA)	1	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	Tasibala II Const	RDTL/PO:2016-11272	LM	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	Malack II Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	3	Construction of Residence for Health Staff in Suku Aimeta Laran-Barique	Macucuren Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LACLO (LA)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacio to Mantane - Manatuto Municipality	Anopa Electrical Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000421	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili


Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :



(Adonis Julio Fernandes)
Eng. Electricidade, ADN,I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade, ADN,I.P

Aprova Husi :



(Eng. Januario Maia Guterres)
Adjunto Director Executivo, ADN,I.P



PLANU INSPESAUN

Naran Eng.		Adonis Julio Fernandes						2022																															
Município		MUNICIPIO MANATUTO NO POSTOS																																					
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MANATUTO VILA (MV)	1	Construção de novo Estadio de Futebol em Manatuto	Obrai Unipesoal, Lda	ICB/0128/SEJD-2014	FI	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun ESTV Beadi-Manatuto	Ralan Unip. Lda	03/PDIM-II/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
	3	Continuacao Requalificacao do Jardim Onde se Localiza Monumento Municipal Manatuto	Carya Timor Leste Unip. Lda	08/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	4	Continuacao e Finalizacao dos Acessores Monumentos Municipio Manatuto	Carya Timor Leste Lda	01/PDIM-I/MNTT/XII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	5	Costrusaun Fatin Izolamento Iha Municipio Manatuto	Talamori Unip.Lda	RDTL-MS-DNA-DC-20-254	LM	SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	6	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Manatuto, Ministry of Helath, Timor Leste	Kartini Unipessoal Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-186	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
LALEIA (LAL)	1	Rehabilitasaun Kampu Foteboll iha Postu Administrativu Laleia	DCO Unip.Lda	011LM/AND/MPIE/VI/DILI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Laleia	Hare Unip.Lda	02/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
LACLUBAR (LAC)	1	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	Tasibala III Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000412	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun Posto Saude Iha iha Suku Funar - Laklubar	Ladiama Unip. Lda	04/PDIM I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	3	Konstrusaun Rezidencia Pesoad Iha iha Suku Funar - Laklubar	Tonijo Unip. Lda	05/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
SOIBADA (SO)	4	Kontinuasaun Konst. Postu Saude Iha Suku Fatumakerek	Hatuwari Unip. Lda	02/PDD-II/MNTT/VI/2015	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	5	Konstrusaun ESTV Soibada Manatuto (CA + CB)	Manufahi Kiik Unip. Lda	01/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																
							Actual																																
BARIQUE (BA)	1	New Construction Centre of Rice Milling, Fence, Office & Housing in Natarbora	Tasibala II Const	RDTL/PO:2016-11272	LM	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun Postu Saude Aimeta Laran-Barique	Malack II Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																
	3	Construction of Residence for Health Staff in Suku Aimeta Laran-Barique	Macucuren Unip. Lda	03/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																
							Actual																																

Handwritten signature or mark.

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Kompanhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
LACLO (LA)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacro to Mantane - Manatuto Municipality	Anopa Electrical Unip. Lda	RDTL/MOPTC- VMOPTC/CGI-PEN : 00000421	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	2	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Lacro	Ailili Const. Unip. Lda	02/PDIM-I/MNTT/IX/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																
							Actual																																
	3	Rehabilitation of Behau Mini Tradisional Food	Esa-Un	RDTL:74/GMTAC/X/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																
							Actual																																
	4	Konstrusaun Mercado Komunitaria Kikan Iliriano	Surprise Unip. Lda	07/PDIM-II/MNTT/VIII/2016	PDIM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																
							Actual																																
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							

Note:

Plano Periode inspesaun iha tereinu

Implementasaun Plano Periode inspesaun iha tereinu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Pagamentu Anual iha tereinu

Prepara Husi :



(Adonis Julio Fernandes)
Eng. Electricidade, ADN,I.P


Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de
Qualidade, ADN,I.P



Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T.M.,Eng)
Director Executivo, ADN,I.P





JANEIRO





2022
JANEIRO

[illegible]



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.		Teresa Gomes						2022																															OBSERVASAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		JANEIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMPRESTIMO	1	National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	Shanghai Construction Group Co.,Ltd Jv PT. Brantas Abipraya(Persero)		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Handwritten signature or mark.

2022

MUNICIPIO DILI NO POSTOS

[illegible]

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. Eng. Vidal Guterres

2022

Municipio MUNICIPIO DILI NO POSTOS

Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	Município	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto		JANEIRO																															OBSERVASAUN
									Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	fr	Sa	Su	Mo	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
IMPRESTIMO	1	National road no. 1 Upgrading project Manatuto - Baucau (package A01-02)Package A01-02/sta 56+400-114+102(56.82km)	Shanghai Construction Group Co.,Ltd Jv PT. Brantas Abipraya(Persero)	Manatuto		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	2	National road no. 1 Upgrading project Dili - Manatuto (package A01-01) (km 12+966.66-km 61+706.66)	Sinohydro Corporation Limited	Manatuto		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	3	Road Network Upgrading Sector Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar Junction (Sta. 65+235 - 100+355)	R.D Interior Junior Construction / Hebei Road and Bridge Group	Manatuto		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	4	RNUSP/ Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Baucau - Lautem Section : Sta. 123 + 105 to Sta. 182 + 040 (with Exceptions)	CBMI Const.Co.,Ltd. / Chongqing Road Engineering GroupCo.,Ltd.(Joint venture)	Baucau- Lautem		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	5	RNUSP / Road Link No. A01 - 03 : Upgrading and Maintenance of Maubara - Karimbala Road (Km. 49.7 to Km. 54.1 and Km.58.1 to Km. 62.6)and Atabae - Mota Ain Road (Km 85.3 to Km.114.2)	CBMI Const.Co.,Ltd. / Chongqing Road Engineering GroupCo.,Ltd.(Joint venture)	Liquica- bobonaro		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	6	Road Network Upgrading Project (RNUP) Upgrading and Maintanace of Dili (Air Port Junction - Tibar)Road - Section 2 (Tasiolu - Tibar Road Link A03-01/ Sta 8 + 740 - Sta 13 + 290)	China Wu Yi Co.,Ltd	Dili		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	7	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding project and maintanace of Dili- Ainaro Road Lot 3(Solerema - Bandudatu Section (Km 34 +620 - Km 64 + 000)(29km)	Chongqing International Construction Corporation	Aileu		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	8	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 4 Bandudatu-Aituto section (km 64+00 -km 89+000) (ICB/034/MPW-2013)	Chongqing International Construction Corporation	Ainaro		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	9	Road Climate Resilience project (RCRP) upgrnding and maintenance of Dili- Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	Chongqing International Construction Corporation	Ainaro		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	10	Road Network Upgrading Sector Project Consulting Services : Preparation of Designs for 169 Km of National Roads (Baucau to Lospalos, Lautem to Com and Baucau to Viqueque) (ADB LOAN no. 3020 - TIM and 3021 - TIM)	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.,Ltd.	Multiposto		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	11	Road Network Upgrading Project (Additional Financing) - Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem, Maubara to Karimbala and Atabae to Mota Ain Roads	Dongsung Engineering Co.,Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co.,Ltd.	Bobonaro	RFP/038/MOPTC-2016	IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	12	Upgrading and Maintenance of Laclubar Jct Natarbora Roads Sta. 100+360 - 144+995 Manatuto	China Nuclear Industry 22ND Construction CO.Lda	Manatuto		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	13	Selection of Consulting Service for : Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Dili - Ainaro Road, Lot 2 : Laulara - Solerema Section (12+000 - 34+620) and Post Upgrading Economic Evaluation of the Entire Dili - Ainaro Road (Lots 1 - 5)	Kunhwa Eng. & Consulting Co.,Ltd in Joint Venture with Dongsung Eng. Co.,Ltd., and in Association with Desing Science, INC., and Kai Watu Kmanek Consultants, Unip Lda	Aileu		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	14	Upgrading and Maintenance of Dili - Ainaro Road Lot 2 : Laulara - Solerema Section (km 12+000 - 34+620 km) Municipality Aileu	China Wu Yi Co.,Ltd	Aileu		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	15	Consulting Services for Project Implementation and Construction Supervision for the Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120), Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste.	Intercontinental Consultanst and Technocrats Pvt.Ltd. (India) in Association With Infra Consultants in the Philis. (Icp) Inc. (Philippines) (As Sub - Consultant) and Dezemvolve Timor Leste (Dettle) Consultant, Lda (Timor Leste (As sub - Consultant)	Baucau		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	16	Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 1 : Baucau - Venilale Section (Sta. 3+740 - Sta. 27+120)	China Railway JV COVEC	Baucau		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																
	17	Upgrading and Maintenance of the Baucau - Venilale - Viqueque Highway Project, Lot 2 : Venilale - Viqueque Section (Sta. 27+120 - Sta. 62+010), Timor Leste.	China Railway JV COVEC	Viqueque		IMPRESTIMO	ADB (LOAN)	Plan																																
								Actual																																

2022

[illegible]

