



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU COVALIMA

JANEIRO 2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO


IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA IHA MUNICÍPIO COVALIMA

JANEIRO 2022


Prepara Husi :


(Eng. Madelino D J Magno)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Covalima ADN, I.P


(Eng. Domingos Soares Martins)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Covalima ADN, I.P


(Eng. Prezenzio L C D Ximenes)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Covalima ADN, I.P


(Eng. Bosco Dinis de Sousa)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transporte e
Irigação, Município Covalima ADN, I.P


(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Município Covalima ADN, I.P


Verifica Husi :


(Arc. Fransisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P


(Eng. Aniceto da Costa)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura,
Transporte e Irigação, ADN, I.P


(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifica Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO.....	1
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Covalima.....	3
1.3. Lista Projectos.....	6
II. PROGRESU FISIKU	21
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan.....	21
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	21
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	21
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	22
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu	22

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias.....	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Covalima.....	5
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Covalima	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Covalima Por Fundus Finansiamentos	7
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Covalima Por Sectores.....	11
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Covalima Por Ministerio.....	16
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Covalima	20

Administrativo Zumalai iha Sukus barak liu kompara ho Sukus seluk iha Administrasaun Munisipal Cova-Lima.

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias

Fatululik		Fohorem		Zumalai		Maucatar	
Sukus	Aldeia	Sukus	Aldeia	Suku	Aldeia	Sukus	Aldeia
Fatululik	3	Dato 2	3	Tashilin	4	Belecassac	7
Taroman	5	Dato 3	3	fatutetu	5	Holpilat	6
		Fohorem	5	Iepo	5	Matai	4
		Lactos	4	Lour	7	Ogues	5
				Mape	3		
				Raimea	4		
				Ucecai	2		
				Zulo	4		
Total	8		15		34		22
Suai		Timolar		Fatumean			
sukus	Aldeia	sukus	Aldeia	Suku	Aldeia		
Beco	11	Beiseuk	7	Belulik leten	4		
Debos	9	lalawa	6	fatumean	4		
Camnaça	4	Maudemo	7	Nunu	4		
Labarai	5	Casabauk	3				
Suai Loro	5						
	43		23		12		

Data husi: Livro 3 B OJE 2021, pag 39

Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Covalima

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Covalima/Suai								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		4				4	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
Total			5				5	

Tabela 1.2. : Lista Asset ADN,I.P Municipio Covalima

ASET ADN,IP MUNICIPIO COVALIMA								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	Eletricidade, odamatan, janela, ho plumbing presija hadia no pinta foun
2	Kareta		1				1	
3	Desktop HP / Monitor		1				1	Diak
4	Laptop HP		1				1	Presija Troka no aumenta 1
5	Printer HP (Kiik hitam&Mutin)		1				1	Aat presija troka (A3 warna)
6	UPS		1				0	
7	Armario File		2				2	1 Aat
8	Armario Tau hena		3				3	Diak
9	Meja escritorio		1				1	Diak
10	Meja han		1				1	Diak

11	Meja TV (kiik)		1				1	Diak
12	Kadeira han		6				6	Diak
13	Kadeira Rotan + Massa		6				6	Diak
14	Sofa		1 Set				1	Aat presija troka
15	Springbed +sumasu 4+sprei 3		3 Set				3	Sprei presija troka
16	Jeleira		1				1	Diak
17	Water Dispenser		1				1	Aat
18	TV + Parabola		1 Set				1	Aat
19	AC		4				4	1 aat, 3 presija manutensaun
20	Kompor		1				1	Aat
21	Kompor Gas		1				1	Aat
22	Rack Piring		1				1	Diak
23	Water Pump Sanyo		1				1	Diak

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumulá iha lista neé bazeia ba dados projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela

1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3

Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Covalima Por Fundus Finansiamentos

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + FUNDU COVID-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik	2	\$ 2,745,409.37	81.02%
2	Fatumea	2	\$ 3,635,921.28	79.49%
3	Fohorem	4	\$ 7,282,268.51	95.05%
4	Maucatar	2	\$ 1,198,224.04	72.60%
5	Multy Posto	5	\$ 5,614,470.32	81.98%
6	Suai Villa	14	\$ 84,212,213.94	90.68%
7	Tilomar	7	\$ 1,560,769.70	63.40%
8	Zumalai	11	\$ 21,093,583.69	60.89%
Grand Total		47	\$ 127,342,860.85	84.58%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik	1	\$ 2,445,005.95	86.59%
2	Fatumea	1	\$ 3,407,674.66	78.79%
3	Fohorem	4	\$ 7,282,268.51	95.05%
4	Maucatar	1	\$ 955,722.62	78.02%
5	Multy Posto	3	\$ 5,471,153.29	83.57%
6	Suai Villa	8	\$ 83,092,050.32	91.14%
7	Tilomar	2	\$ 806,244.40	80.14%
8	Zumalai	8	\$ 19,458,769.74	59.90%
Grand Total		28	\$ 122,918,889.49	85.48%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik			
2	Fatumea			
3	Fohorem			
4	Maucatar			
5	Multy Posto	2	\$ 143,317.03	21.06%
6	Suai Villa	3	\$ 597,003.40	44.28%
7	Tilomar	3	\$ 534,590.93	32.71%
8	Zumalai	1	\$ 260,523.18	35.26%
Grand Total		9	\$ 1,535,434.54	36.55%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik			
2	Fatumea	1	\$ 228,246.62	89.92%
3	Fohorem			
4	Maucatar			
5	Multy Posto			
6	Suai Villa			
7	Tilomar	1	\$ 186,843.31	77.43%
8	Zumalai	1	\$ 177,630.77	87.11%
Grand Total		3	\$ 592,720.70	85.14%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik	1	\$ 300,403.42	35.69%
2	Fatumea			
3	Fohorem			
4	Maucatar	1	\$ 242,501.42	51.26%
5	Multy Posto			
6	Suai Villa			
7	Tilomar	1	\$ 33,091.06	72.00%
8	Zumalai			
Grand Total		3	\$ 575,995.90	44.33%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik			
2	Fatumea			
3	Fohorem			
4	Maucatar			
5	Multy Posto			
6	Suai Villa			
7	Tilomar			
8	Zumalai	1	\$ 1,196,660.00	78.70%
Grand Total		1	\$ 1,196,660.00	78.70%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FUNDU COVID-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Fatululik			
2	Fatumea			
3	Fohorem			
4	Maucatar			
5	Multy Posto			
6	Suai Villa	3	\$ 523,160.22	70.19%
7	Tilomar			
8	Zumalai			
Grand Total		3	\$ 523,160.22	70.19%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Covalima Por Sectores

NO	SECTOR PROJECTO	TOTAL MUNICIPIO COVALIMA		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos	2	\$ 72,430,992.54	92.84%
2	Agua E Saneamento	1	\$ 264,381.80	100.00%
3	Edificios Publicos	8	\$ 2,248,461.47	58.24%
4	Edukasaun	1	\$ 177,630.77	87.11%
5	Eletrifikasaun Nasional	5	\$ 2,730,729.02	61.19%
6	Estradas	17	\$ 38,289,259.71	70.92%
7	Flood Control	1	\$ 260,523.18	35.26%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	7	\$ 1,507,681.83	62.76%
9	Pontes	2	\$ 8,755,658.60	95.58%
10	Saude	3	\$ 677,541.93	73.15%
	Grand Total	47	\$ 127,342,860.85	84.58%

NO	SECTOR PROJECTO	Fatululik		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos			
4	Edukasaun			
5	Eletrifikasaun Nasional			
6	Estradas	1	\$ 300,403.42	35.69%
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun			
9	Pontes	1	\$ 2,445,005.95	
10	Saude			86.59%
	Grand Total	2	\$ 2,745,409.37	81.02%

NO	SECTOR PROYECTO	Fatumea		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeropertos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos			
4	Edukasaun			
5	Eletrifikasaun Nasional			
6	Estradas	1	\$ 3,407,674.66	78.79%
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun			
9	Pontes			
10	Saude	1	\$ 228,246.62	89.92%
Grand Total		2	\$ 3,635,921.28	79.49%

NO	SECTOR PROYECTO	Fohorem		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeropertos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos			
4	Edukasaun			
5	Eletrifikasaun Nasional			
6	Estradas			
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 971,615.86	68.98%
9	Pontes	1	\$ 6,310,652.65	99.06%
10	Saude			
Grand Total		4	\$ 7,282,268.51	95.05%

NO	SECTOR PROYECTO	Maucatar		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos			
4	Edukasaun			
5	Eletrifikasaun Nasional			
6	Estradas	1	\$ 955,722.62	78.02%
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	1	\$ 242,501.42	51.26%
9	Pontes			
10	Saude			
Grand Total		2	\$ 1,198,224.04	72.60%

NO	SECTOR PROYECTO	Multy Posto		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos			
4	Edukasaun			
5	Eletrifikasaun Nasional			
6	Estradas	3	\$ 5,430,116.11	82.93%
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	2	\$ 184,354.21	53.84%
9	Pontes			
10	Saude			
Grand Total		5	\$ 5,614,470.32	81.98%

NO	SECTOR PROYECTO	Suai Villa		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos	2	\$ 72,430,992.54	92.84%
2	Agua E Saneamento	1	\$ 264,381.80	100.00%
3	Edificios Publicos	4	\$ 593,329.82	37.34%
4	Edukasaun			
5	Eletrifikasaun Nasional	2	\$ 1,218,543.47	34.52%
6	Estradas	4	\$ 9,442,514.31	85.36%
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun			
9	Pontes			
10	Saude	1	\$ 262,452.00	55.51%
	Grand Total	14	\$ 84,212,213.94	90.68%

NO	SECTOR PROYECTO	Tilomar		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeroportos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos	3	\$ 458,471.65	31.90%
4	Edukasaun			
5	Eletrifikasaun Nasional	1	\$ 323,539.34	87.54%
6	Estradas	1	\$ 482,705.06	75.18%
7	Flood Control			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	1	\$ 109,210.34	48.01%
9	Pontes			
10	Saude	1	\$ 186,843.31	77.43%
	Grand Total	7	\$ 1,560,769.70	63.40%

NO	SECTOR PROYECTO	Zumalai		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aeropertos			
2	Agua E Saneamento			
3	Edificios Publicos	1	\$ 1,196,660.00	78.70%
4	Edukasaun	1	\$ 177,630.77	87.11%
5	Eletrifikasaun Nasional	2	\$ 1,188,646.21	81.35%
6	Estradas	6	\$ 18,270,123.53	58.50%
7	Flood Control	1	\$ 260,523.18	35.26%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun			
9	Pontes			
10	Saude			
	Grand Total	11	\$ 21,093,583.69	60.89%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Covalima Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro	1	\$ 1,196,660.00	78.70%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 260,523.18	35.26%
3	Ministerio Da Justica	1	\$ 149,292.80	0.00%
4	Ministerio Das Obras Publicas	31	\$ 51,283,329.16	74.37%
5	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	2	\$ 360,959.57	42.87%
6	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 264,381.80	100.00%
7	Ministerio Saude	7	\$ 1,363,630.74	61.57%
8	Ministerio Tranportes E Komunikaun	2	\$ 72,430,992.54	92.84%
9	Ministerio Turismo Komerio E Industria	1	\$ 33,091.06	72.00%
Grand Total		47	\$ 127,342,860.85	84.58%

NO	DONO DO PROJECTO	Fatululik		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	2	\$ 2,745,409.37	81.02%
5	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu			
6	Ministerio Planu E Ordenamentu			
7	Ministerio Saude			
8	Ministerio Tranportes E Komunikaun			
9	Ministerio Turismo Komerio E Industria			
Grand Total		2	\$ 2,745,409.37	81.02%

NO	DONO DO PROJECTO	Fatumea		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	1	\$ 3,407,674.66	78.79%
5	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu			
6	Ministerio Planu E Ordenamentu			
7	Ministerio Saude	1	\$ 228,246.62	89.92%
8	Ministerio Tranportes E Komunikasaun			
9	Ministerio Turismo Komerccio E Industria			
Grand Total		2	\$ 3,635,921.28	79.49%

NO	DONO DO PROJECTO	Fohorem		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	4	\$ 7,282,268.51	95.05%
5	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu			
6	Ministerio Planu E Ordenamentu			
7	Ministerio Saude			
8	Ministerio Tranportes E Komunikasaun			
9	Ministerio Turismo Komerccio E Industria			
Grand Total		4	\$ 7,282,268.51	95.05%

NO	DONO DO PROJECTO	Maucatar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	2	\$ 1,198,224.04	72.60%
5	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu			
6	Ministerio Planu E Ordenamentu			
7	Ministerio Saude			
8	Ministerio Tranportes E Komunikasaun			
9	Ministerio Turismo Komerccio E Industria			
Grand Total		2	\$ 1,198,224.04	72.60%

NO	DONO DO PROJECTO	Multy Posto		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas			
5	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	\$ 5,614,470.32	81.98%
6	Ministerio Planu E Ordenamentu			
7	Ministerio Saude			
8	Ministerio Tranportes E Komunikasaun			
9	Ministerio Turismo Komerccio E Industria			
Grand Total		5	\$ 5,614,470.32	81.98%

NO	DONO DO PROJECTO	Suai Villa		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica	1	\$ 149,292.80	0.00%
4	Ministerio Das Obras Publicas	6	\$ 10,661,057.78	79.55%
5	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	1	\$ 183,328.80	0.00%
6	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 264,381.80	100.00%
7	Ministerio Saude	3	\$ 523,160.22	70.19%
8	Ministerio Tranportes E Komunikaun	2	\$ 72,430,992.54	92.84%
9	Ministerio Turismo Komerzio E Industria			
Grand Total		14	\$ 84,212,213.94	90.68%

NO	DONO DO PROJECTO	Tilomar		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	3	\$ 915,454.74	76.31%
5	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu			
6	Ministerio Planu E Ordenamentu			
7	Ministerio Saude	3	\$ 612,223.90	43.63%
8	Ministerio Tranportes E Komunikaun			
9	Ministerio Turismo Komerzio E Industria	1	\$ 33,091.06	72.00%
Grand Total		7	\$ 1,560,769.70	63.40%

NO DONO DO PROJECTO		Zumalai		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Gabinete Do Primeiro Ministro	1	\$ 1,196,660.00	78.70%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 260,523.18	35.26%
3	Ministerio Da Justica			
4	Ministerio Das Obras Publicas	8	\$ 19,458,769.74	59.90%
5	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	1	\$ 177,630.77	87.11%
6	Ministerio Planu E Ordenamentu			
7	Ministerio Saude			
8	Ministerio Tranportes E Komunikaun			
9	Ministerio Turismo Komercio E Industria			
Grand Total		11	\$ 21,093,583.69	60.89%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Covalima

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Poduktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Fatululic	2,173	1,840	1,989	1,878	1,782
Fatumean	3,516	830	903	921	862
Fohorem	4,442	1,216	1,282	981	963
Maucatar	9,764	2,886	2,893	2,056	1,930
Suai	28,195	8,707	8,409	5,590	5,488
Tilomar	8,515	2,394	2,281	1,967	1,873
Zumalai	14,266	3,923	3,966	3,255	3,122

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

Direccao Geral de Estatistika, MoF

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu porsentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

1. Durante Equipa ADN, I.P. Covalima halo monitorizasaun no Inspeksaun hasoru obstaklo sira iha Terreno mak hanesan:
 - Projeto husi Lina Ministerial balu la iha site Supervisor.
 - Projeto balu parado liu husi fulan ida ona maibe *owner* la iha desizaun ruma ba kompanha refere.
2. Durante Equipa ADN, I.P. Covalima halo servisu Iha Eskritorio ADN, I.P. Municipio hasoru obstaklo sira mak hanesan:
 - Ami nafatin hasoru difikuldade ba Printer, tamba printer ne'ebe iha at no la funsiona ona.
 - Obstáculo parte Eletricidade
1. Iha Fulan Janeiro nia laran ami labele ba halo inspeksaun ba Munisipiu, tamba transporte neébe atu lori ami mak laiha.

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

- Rekomenda ba Superior sira atu fo hela informsaun ba kada Lina Ministerial katak atu implementa projeto tenke iha site supervisor husi ministerio refere.
 - Rekomenda ba Superior sira atu informa hela ba superior sira husi projeto nain atu kontrola sira nia projeto ne'ebe durante ne parado hodi foti desizaun
 - Husu ba Parte ITC atu Prepara Printer ida ba Municipio Covalima hodi nune bele Fasilita servisu iha Municipio
 - Rekomendasaun parte Eletricidade
1. Husu ba Parte superior atu bele hare ba kestaun hirak ne'e tamba susar mai ami atu desloka ba munisipiu hodi hare / inspeksaun ba projetu hirak ne'ebe presija ba halo monitorizasaun.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Covalima

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Covalima/Suai						
No	Deskrisaun	Identidade				Asinatura
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	
1	Enjineiru	Madelino Deonizo José Magno	170	Enjineiru EPAS		
		Domingos Soares Martins	160	Enjineiru ITI		
		Prezenzio Legorio do Carmo Dias Ximenes	212	Enjineiru EPAS		
		Bosco Dinis de Sousa	215	Enjineiru ITI		
		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		

2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Agustinho Amaral	068	Motorista		



ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL JANEIRO)

LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Suai Villa	Covalima	Divita Unip. Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052	\$ 230,560.12	July 18, 2017	100.00%	90.00%	\$ 207,504.11	\$ 23,056.01	PHO	Projeto ida ne iha Fase Retensaun
2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Halihun, MDGS, Matai, MDGS Halihun - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Suai Villa	Covalima	Eron Power, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000435	\$ 987,983.35	Sept. 1, 2016	24.00%	21.57%	\$ 213,139.22	\$ 774,844.13	PENDENTE	Projeto ida ne Parado Hela
3	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	AEROPORTOS	Suai Villa	Covalima	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	ICB/035/TGAP-2013	\$ 67,687,412.46	April 24, 2014	100.00%	92.65%	\$ 62,709,401.97	\$ 4,978,010.49	PHO	Inspeksaun geral ba pagamentu retensaun, devolve dokumentus tamba sei iha defeitus nebe'e seidauk hadia husi contractor.
4	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	AEROPORTOS	Suai Villa	Covalima	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	ICB/035/TGAP-2013	\$ 4,743,580.08	May 30, 2014	100.00%	95.67%	\$ 4,538,294.94	\$ 205,285.14	PHO	
5	New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Suai Villa	Covalima	Consortorio Naroman Covalima, Group Lda	SSS/266/MOPTC-2016	\$ 1,223,216.12	July 10, 2016	62.66%	51.65%	\$ 631,782.25	\$ 591,433.87	ON-GOING	On Progress
6	Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Suai Villa	Covalima	Consortorio Zemo Lda	SSS/346/MOPTC-2016	\$ 970,974.30	Dec. 12, 2016	74.13%	74.13%	\$ 719,783.67	\$ 251,190.63	ABANDONA	Abandona servisu iha tinan 2017 to agora, la iha informasaun klaru husi kompanhia konnabada kontinuidade servisu iha tereno.
7	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II 5+020 - 10+140 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Suai Villa	Covalima	Nobre Labadai Unipessoal, Lda	SSS/051/MOPTC-2017	\$ 3,802,446.29	Sept. 11, 2017	98.83%	88.95%	\$ 3,382,301.17	\$ 420,145.12	ON-GOING	Fisiku 100%, PHO.
8	New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Giovanio	RDTL-MS-DNA-NCB-20-150	\$ 189,960.54	Sept. 1, 2020	95.44%	85.89%	\$ 163,162.64	\$ 26,797.90	PHO	Projeto ida nee agora iha fase retensaun
9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Suai Villa	Covalima	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	\$ 262,452.00	Sept. 23, 2020	65.21%	55.51%	\$ 145,679.52	\$ 116,772.48	ON-GOING	Tuir Observasaun ikus ADN ,IP, Iha dia06-12-2021 Projeto refere parado hela
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	\$ 70,747.68	Jan. 11, 2021	91.69%	82.52%	\$ 58,383.19	\$ 12,364.49	PHO	Projeto ida nee agora iha fase retensaun
11	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge - Zumalai Jct. Phase I 0+000 - 5+020 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Suai Villa	Covalima	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/322/MOPTC-2016	\$ 3,445,877.60	Nov. 21, 2016	100.00%	96.54%	\$ 3,326,487.08	\$ 119,390.52	FHO	Halo pagamentu retensaun 12% (FHO)
12	New Construsaun of Interior Fence for Prison in Suai Municipality	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Fraternity Unipessoal Lda	MJ-062/OUTUBRO/2021	\$ 149,292.80	Sept. 19, 2021	35.26%	0.00%	\$ -	\$ 149,292.80	ON-GOING	Projeto ida ne agora lao hela
13	Prefurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Suai Villa	Covalima	Paya's Sisters	002 LM/RDTL/MPIE/A.D.N /Da Rfq/VI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	\$ 264,381.80	July 3, 2019	100.00%	100.00%	\$ 264,381.80	\$ -	FHO	Projeto ida nee halo ona pagamento retensaun balu, tuir CPV nebe parte finansas ADN,I.P Prepara, no balansu \$ 1,398.61 sei halo tan pagamento iha tinan 2022
14	Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB:04/MEJD/DNA/2021	\$ 183,328.80	26-11-2021	0.77%	0.00%	\$ -	\$ 183,328.80	ON-GOING	On Progress
15	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Tilomar	Covalima	Lalenok Fronteira, unip.lida	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 323,539.34	July 6, 2016	97.00%	87.54%	\$ 283,223.74	\$ 40,315.60	ON-GOING	Projeto ida ne remata ona no la iha tan item seluk atu kontinua



ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL JANEIRO)

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL JANEIRO)																
LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
16	River normalization and protection in Fatuk Oan	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Tilomar	Covalima	Consortio Lorico Covalima	SSS/263/MOPTC-2016	\$ 482,705.06	July 10, 2016	75.18%	75.18%	\$ 362,886.49	\$ 119,818.57	PENDENTE	Projecto refere abandona kleur ona husi kompanhia ate agora la iha aktividade servisu iha tereno.
17	Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Suai- Covalima	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Tilomar	Covalima	Ota Gelor	RDTL:73/GMTAC/X/2015	\$ 33,091.06	Aug. 8, 2014	80.00%	72.00%	\$ 23,825.57	\$ 9,265.49	ON-GOING	Projeto ida ne agora rehabilita fali ona ba fatin karantina
18	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Tilomar	Covalima	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019	\$ 186,843.31	Sept. 16, 2019	86.71%	77.43%	\$ 144,679.23	\$ 42,164.08	ON-GOING	Projeto ida ne'e remata ona, osan resto no osan Externa Works owner sei orienta atu halo tan servisu balun
19	Lookeu Chainage 0+000 - 6+000, Casabau 008 Chainage 0+000 - 3+000, Casabau 012 Chainage 0+000 - 3+500, Casabau 018 Chainage 0+000 - 2+700, Naguidal - Lour Chainage 0+000 - 4+000, Boardikun - Mape Chainage 0+000 - 8+000, Data - Tolu Chainage 0+000 - 9+600 / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Tilomar	Covalima	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	RDTL	\$ 109,210.34	Aug. 13, 2019	72.42%	48.01%	\$ 52,437.14	\$ 56,773.20	ABANDONA	Projeto ne'e parado hela, husi fulan Abril 2021 to agora, Halo ona konfirmasaun ho kompanhia, resposta katak sira nia servisu remata ona iha fulan Marsu 2021, prosesu husu pagamentu maka seidauk realiza
20	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Tilomar	Covalima	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	\$ 129,595.17	Abr. 21, 2021	79.08%	69.75%	\$ 90,394.32	\$ 39,200.85	ON-GOING	Projeto ida ne lao hela
21	New Construction of Health Post and Doctor House Buiding in Beisuk, Tilomar, Covalima, Timor Leste (Niquir)	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Tilomar	Covalima	Caramé Unip Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-071	\$ 295,785.42	Aug. 18, 2021	19.78%	10.82%	\$ 32,018.72	\$ -	ON-GOING	Projeto ida ne lao hela
22	R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Fohorem	Covalima	Unidade Unip Lda	RT/027/MOP-2019	\$ 284,245.59	Dec. 20, 2019	100.00%	89.64%	\$ 254,811.22	\$ 29,434.37	PHO	Projecto ne'e PHO tia ona ba dono projecto
23	R4D Rural Road Rehabilitation Dato- Tolu Chainage 11+100 - 12+600 Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Fohorem	Covalima	Verde Caisahe Lda	NCB/057/MOP-2019	\$ 283,833.62	March 1, 2020	100.00%	90.00%	\$ 255,450.25	\$ 28,383.37	PHO	Progresu Fisiku 100% PHO
24	Construction, Rehabilitation and Installation of Clean Water with System Gravitation in Suco Fohorem Villa	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Fohorem	Covalima	Loro Metan Unipesola. Lda	SSS/293/MOPTC-2016	\$ 403,536.65	Nov. 22, 2016	45.05%	39.65%	\$ 159,993.44	\$ 243,543.21	PENDENTE	Projeto ida ne abandona hela
25	Construction of Baer Bridge	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Fohorem	Covalima	PT. Duta Graha	RDTL- 120002189	\$ 6,310,652.65	23-May-10	100.00%	99.06%	\$ 6,251,415.94	\$ 59,236.71	PENDENTE	Projeto refere atinge 100% iha tinan 7 liu ba kotuk, balansu nebe'e iha presija halo konfirmasaun ho dono projeto e nomos hare fila fali iha pagamentu anterior nian, hodi nune bele hatene los osamentu nebe'e sei iha balansu nia disposizaun
26	Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Fatumea	Covalima	Be'e horis, Unip. Lda	SSS/103/MOPTC-2017	\$ 3,407,674.66	Sept. 15, 2017	90.63%	78.79%	\$ 2,685,016.49	\$ 722,658.17	ON-GOING	Progressu Fisiku finaliza ona 100% iha tereno, no hein aprovasaun CCO No.2 husi Dono projecto hodi lori ba prosesu pagamentu nian iha periode tuir mai.
27	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Nanu	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Fatumea	Covalima	Unidade Unip Lda	05/A.M.Covalima/KDM-AMP/VII/2019	\$ 228,246.62	Sept. 16, 2019	99.91%	89.92%	\$ 205,240.23	\$ 23,006.39	ON-GOING	Projeto ida ne iha fase retensaun, no tempo retensaun remata ona seidauk bele prosesa pagamento tamba sei hein desizaun konaba rai halai
28	Road Maintenance Section Taraman - Datorua - Fatumeta (A016) 13.15 Km Section Covalima Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Fatululik	Covalima	Jufado	NCB-MOP-190014	\$ 300,403.42	Oct. 8, 2019	39.66%	35.69%	\$ 107,214.96	\$ 193,188.46	ABANDONA	kondisaun aktual agora iha tereno parado hela tamba kompanhia la iha finaseiru nebe'e suficiente hodi apoiu aktividade servisu iha tereno
29	Construction of Taraman Bridge	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Fatululik	Covalima	Ensul Engenharia, S.A.	RDTL- 11005004	\$ 2,445,005.95	Nov. 10, 2011	100.00%	86.59%	\$ 2,117,121.82	\$ 327,884.13	PENDENTE	Projeto refere atinge 100% iha tinan 7 liu ba kotuk, balansu nebe'e iha presija halo konfirmasaun ho dono projeto e nomos hare fila fali iha pagamentu anterior nian, hodi nune bele hatene los osamentu nebe'e sei iha balansu nia disposizaun



ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL JANEIRO)

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL JANEIRO)																
					LOKALIZASAUN PROJETU											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
30	Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to Aldeia iha Roads Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Maucatar	Covalima	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/135/MOPTC-2016	\$ 955,722.62	July 29, 2016	97.84%	78.02%	\$ 745,653.07	\$ 210,069.55	ON-GOING	Progressu fisiku finaliza ona 100% iha tereno, Maibe dezenho no Variation seidaik iha aprovasaun husi dono projecto
31	Rebidding of Project Road Maintenance Sections ; Suai, Maucatar - Lelaus Municipality Covalima (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maucatar	Covalima	Verde Caisahe Lda	NCB-MOP-190010	\$ 242,501.42	Dec. 15, 2019	56.96%	51.26%	\$ 124,309.81	\$ 118,191.61	ABANDONA	Kondisaun aktual agora iha tereno parado hela tamba kompanhia la iha finaseiru nebe'e suficiente hodi apoiu aktividade servisu iha tereno
32	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Zumalai	Covalima	Foho Rua Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000404	\$ 466,841.13	July 6, 2016	54.00%	73.80%	\$ 344,551.37	\$ 122,289.76	ON-GOING	Projeto ida ne remata ona no la iha tan item seluk atu kontinua
33	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Zumalai	Covalima	Mania Unip, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000427	\$ 721,805.08	Sept. 1, 2016	96.00%	86.24%	\$ 622,455.90	\$ 99,349.18	ON-GOING	Projeto ida ne remata ona no la iha tan item seluk atu kontinua
34	Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Clardel Interprice Unip Lda	SSS/227/MOPTC-2016	\$ 3,026,312.56	Sept. 13, 2016	70.39%	60.64%	\$ 1,835,036.16	\$ 1,191,276.40	ABANDONA	Obra ne'e sei iha balansu osamentu ba fisiku kontrusaun nian, maibe obra ne'e parado iha tinan 2019 to agora la iha informasaun ruma husi kompanhia konaba kontinuidade obra refere.
35	Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction (0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Star Suai, Lda	SSS/050/MOPTC-2017	\$ 3,461,708.40	Sept. 7, 2017	99.46%	89.51%	\$ 3,098,636.12	\$ 363,072.28	PHO	Fisiku 100%, PHO.
36	Rehabilitation of be'e mean roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Roman Junior Unipessoal, Lda	SSS/049/MOPTC-2017	\$ 3,645,870.73	Sept. 5, 2017	95.40%	92.75%	\$ 3,381,632.29	\$ 264,238.44	ON-GOING	Hein prosesu pagamentu 100%,no halo PHO ba dono projecto
37	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Zumalai	Covalima	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/II/2015	\$ 1,196,660.00	Aug. 1, 2015	87.44%	78.70%	\$ 941,722.09	\$ 254,937.91	ON-GOING	Projeto ida remata ona no ate a data kompanhia seidaik submete pagamento final
38	Konstrusaun Eskola Tekniko Professional Zumalai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Zumalai	Covalima	Sabudoi Unip. Lda	03/A.M.Covalima/KDM-AMP/VII/2019	\$ 177,630.77	July 15, 2019	96.79%	87.11%	\$ 154,742.01	\$ 22,888.76	PHO	Projeto ida nee agora iha fase retensaun
39	Rural Roads Periodik Maintenance Lepo - Lour Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	MPW-W-190260	\$ 73,033.49	Dec. 19, 2019	84.51%	38.51%	\$ 28,127.77	\$ 44,905.72	ABANDONA	Obra ne'e remata ona 100%,iha fulan Junho 2021 hein submisaun pagamentu husi kompanhia ba dono projecto
40	Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai Road Section 8 : Zulo - Jct Zumalai (30+100 - 35+120 km) Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Octogono Constr. Unip. Lda	SSS/067/MOPTC-2017	\$ 3,748,915.76	Sept. 7, 2017	39.24%	30.95%	\$ 1,160,430.04	\$ 2,588,485.72	ON-GOING	On Progres, maibe servisu la dun aselera servisu tamba finaseiru la sufisiente
41	Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50+900 km), Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai (35+120) Road Section 7 : Fatulito - Zulo (25+800 - 30+100) Municipality Bobonaro - Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Marino Enterprises, Lda	SSS/065/MOPTC-2017	\$ 4,314,282.59	Sept. 12, 2017	37.80%	27.46%	\$ 1,184,893.23	\$ 3,129,389.36	ON-GOING	On Progres, maibe servisu la dun aselera servisu tamba finaseiru la sufisiente
42	Manutensaun no Konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba - Covalima	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	FLOOD CONTROL	Zumalai	Covalima	Lifran Unip. Lda	RDTL-2021-15595	\$ 260,523.18	Oct. 5, 2021	69.44%	35.26%	\$ 91,856.83	\$ 168,666.35	ON-GOING	Progressu iha tereno finaliza ona 100%,hein prosesu pagamentu
43	Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro and Manufahi	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Multy Posto	Covalima	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/029/MOPTC-2017	\$ 379,631.20	July 7, 2017	100.00%	84.10%	\$ 319,270.12	\$ 60,361.08	ON-GOING	
44	Rehabilitation of Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Multy Posto	Covalima	Expres Distribution Services Unip. Lda	SSS/318/MOPTC-2016	\$ 4,941,274.57	Dec. 9, 2016	100.00%	84.68%	\$ 4,184,042.48	\$ 757,232.09	ON-GOING	Obra ne'e remata ona 100%, iha tinan 2019 hein submisaun pagamentu husi kompanhia ba dono projecto, nomos iha problema adisional nebe'e seidaik iha aprovasaun husi dono do projetu.



ANEXU A

MUNICIPIO COVALIMA (LISTA GERAL JANEIRO)

LOKALIZASAUN PROJETU																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
45	Manutensaun Estrada Lookou. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200-Municipal of Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Multy Posto	Covalima	Manu Bey Unip Lda	RT/079/MOPTC-2016	\$ 150,247.52	Aug. 19, 2016	51.08%	45.97%	\$ 69,074.95	\$ 81,172.57	PENDENTE	Projecto refere abandona / parado iha tinan 2019 ate agora tamba problema menus financeiro, Agora dadaun iha ona projetu foun halo manutensaun ba lokasaun refere husi ILO-R4D nebee implementa hela husi kompania Futuru Manemesak
46	Rural Roads Routine Maintenance Lepo-Lour Sta 0+000-3+000, Naguidal - Lour Sta 0+000-5+000, Boardikun - Mape Sta 0+000-8+000 / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Multy Posto	Covalima	Futuro Mane Mesak Unip Lda	MPWTC-CD-170015	\$ 34,106.69	Jan. 8, 2017	88.48%	88.48%	\$ 30,176.89	\$ 3,929.80	PENDENTE	Agora dadaun iha ona projetu foun halo manutensaun ba lokasaun refere husi ILO-R4D nebee implementa hela husi kompania Futuru Manemesak, ho kontratu foun
47	Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Cha 0+000 - 9+600, Lookou Cha 0+000 - 6+000, Casabauc 008 Cha 0+000 - 3+000, Casabauc 012 Cha 0+000 - 3+500, Casabauc 018 Cha 0+000 - 2+700, Lalawa Cha 0+000 - 3+500, Boraikun Mape Cha 0+000 - 8+000, Naguidal Lepo Cha 0+000 - 4+000 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Multy Posto	Covalima	Lufi Raica Unip Lda	MPW/WNCB/R/190048	\$ 109,210.34	Aug. 13, 2019	0.00%	0.00%	\$ -	\$ 109,210.34	PENDENTE	Projetu ne'e seidak implementa iha tereno, no iha ona projetu foun husi R4D implementa ona area refere husi kompanhia Futuru-Manemesak.
TOTAL									\$ 127,342,860.85			84.58%	\$ 107,702,642.25	\$ 19,376,451.90		

Prepara Husi :

(Eng. Madelino D.J. Magno)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Covalima ADN, I.P.

(Eng. Prezenzio L.C.D. Ximenes)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Covalima ADN, I.P.

(Eng. Domingos Soares Martins)

Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Covalima ADN, I.P.

(Eng. Bosco Dinis de Sousa)

Eng. ba Projetu Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Covalima ADN, I.P.

(Silvino D.R.R. Soares)

Eng. M & E, Municipio Covalima ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Avaliacao de Qualidade, ADN, I.P.



ANEXO B
PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Jan-22		
											Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
1	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Suai Villa	Covalima	Divita Unip. Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052	\$ 230,560.12	July 18, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Haliun, MDGS, Matai, MDGS Haliun - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Suai Villa	Covalima	Eron Power, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000435	\$ 987,983.35	Sept. 1, 2016	24.00%	0.00%	24.00%
3	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	AEROPORTOS	Suai Villa	Covalima	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	ICB/035/TGAP-2013	\$ 67,687,412.46	April 24, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
4	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	FI	AEROPORTOS	Suai Villa	Covalima	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	ICB/035/TGAP-2013	\$ 4,743,580.08	May 30, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
5	New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Suai Villa	Covalima	Consortio Naroman Covalima, Group Lda	SSS/266/MOPTC-2016	\$ 1,223,216.12	July 10, 2016	51.65%	11.01%	62.66%
6	Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Suai Villa	Covalima	Consortio Zemo Lda	SSS/346/MOPTC-2016	\$ 970,974.30	Dec. 12, 2016	74.13%	0.00%	74.13%
7	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II 5+020 - 10+140 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Suai Villa	Covalima	Nobre Labadai Unipessoal, Lda	SSS/051/MOPTC-2017	\$ 3,802,446.29	Sept. 11, 2017	98.83%	0.00%	98.83%
8	New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Giovanio	RDTL-MS-DNA-NCB-20-150	\$ 189,960.54	Sept. 1, 2020	95.44%	0.00%	95.44%
9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Suai Villa	Covalima	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	\$ 262,452.00	Sept. 23, 2020	61.89%	3.32%	65.21%
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	\$ 70,747.68	Jan. 11, 2021	91.69%	0.00%	91.69%
11	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge - Zumalai Jct. Phase I 0+000 - 5+020 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Suai Villa	Covalima	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/322/MOPTC-2016	\$ 3,445,877.60	Nov. 21, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
12	New Construsaun of Interior Fence for Prison in Suai Municipality	MINISTERIO DA JUSTICA	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Fraternity Unipessoal Lda	MJ-062/OUTUBRO/2021	\$ 149,042.88	Sept. 19, 2021	22.54%	12.72%	35.26%
13	Prefurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	LM-CD	AGUA E SANEAMENTO	Suai Villa	Covalima	Paya's Sisters	002.LM/RDTL/MPIE/A.D.N/Da Rfq/VI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	\$ 264,381.80	July 3, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
14	Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Suai Villa	Covalima	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB:04/MEJD/DNA/2021	\$ 183,328.80	26-11-2021	0.00%	0.77%	0.77%
15	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Tilomar	Covalima	Lalenok Fronteira, unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 323,539.34	July 6, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
16	River normalization and protection in Fatuk Oan	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Tilomar	Covalima	Consortio Lorico Covalima	SSS/263/MOPTC-2016	\$ 482,705.06	July 10, 2016	75.18%	0.00%	75.18%
17	Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Sua- Covalima	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	LM-BS	EDIFICIOS PUBLICOS	Tilomar	Covalima	Ota Gelor	RDTL:73/GMTAC/X//2015	\$ 33,091.06	Aug. 8, 2014	80.00%	0.00%	80.00%
18	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Tilomar	Covalima	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019	\$ 186,843.31	Sept. 16, 2019	86.04%	0.67%	86.71%
19	Lookeu Chainage 0+000 - 6+000, Casabau 008 Chainage 0+000 - 3+000, Casabau 012 Chainage 0+000 - 3+500, Casabau 018 Chainage 0+000 - 2+700, Naguidal - Lour Chainage 0+000 - 4+000, Boardikun - Mape Chainage 0+000 - 8+000, Data - Tolu Chainage 0+000 - 9+600 / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Tilomar	Covalima	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	RDTL	\$ 109,210.34	Aug. 13, 2019	72.42%	0.00%	72.42%
20	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Tilomar	Covalima	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	\$ 129,595.17	Abr. 21, 2021	77.50%	1.58%	79.08%
21	New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk, Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)	MINISTERIO SAUDE	LM-CD	SAUDE	Tilomar	Covalima	Caramé Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-21-071	\$ 295,785.42	Aug. 18, 2021	12.19%	7.59%	19.78%
22	R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Fohorem	Covalima	Unidade Unip Lda	RT/027/MOP-2019	\$ 284,245.59	Dec. 20, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
23	R4D Rural Road Rehabilitation Dato- Tolu Chainage 11+100 - 12+600 Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Fohorem	Covalima	Verde Caisahe Lda	NCB/057/MOP-2019	\$ 283,833.62	March 1, 2020	100.00%	0.00%	100.00%
24	Construction, Rehabilitation and Installation of Clean Water with System Gravitation in Suco Fohorem Villa	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Fohorem	Covalima	Loro Metan Unipessola. Lda	SSS/293/MOPTC-2016	\$ 403,536.65	Nov. 22, 2016	45.05%	0.00%	45.05%
25	Construction of Baer Bridge	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Fohorem	Covalima	PT. Duta Graha	RDTL- 120002189	\$ 6,310,652.65	23-May-10	100.00%	0.00%	100.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHIA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Jan-22		
											Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
26	Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Fatumea	Covalima	Be'e horis, Unip. Lda	SSS/103/MOPTC-2017	\$ 3,407,674.66	Sept. 15, 2017	90.63%	0.00%	90.63%
27	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Nanu	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Fatumea	Covalima	Unidade Unip Lda	05/A.M.Covalima/KDM-AMP/VII/2019	\$ 228,246.62	Sept. 16, 2019	99.91%	0.00%	99.91%
28	Road Maintenance Section Taroman - Datorua - Fatumeta (A016) 13.15 Km Section Covalima Municipality (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	ESTRADAS	Fatululik	Covalima	Jufado	NCB-MOP-190014	\$ 300,403.42	Oct. 8, 2019	39.66%	0.00%	39.66%
29	Construction of Taroman Bridge	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Fatululik	Covalima	Ensul Engenharia, S.A.	RDTL- 11005004	\$ 2,445,005.95	Nov. 10, 2011	100.00%	0.00%	100.00%
30	Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to Aldeia iha Roads Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Maucatar	Covalima	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/135/MOPTC-2016	\$ 955,722.62	July 29, 2016	88.66%	9.18%	97.84%
31	Rebidding of Project Road Maintenance Sections ; Suai, Maucatar - Lelaus Municipality Covalima (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maucatar	Covalima	Verde Caisahe Lda	NCB-MOP-190010	\$ 242,501.42	Dec. 15, 2019	56.96%	0.00%	56.96%
32	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Zumalai	Covalima	Foho Rua Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000404	\$ 466,841.13	July 6, 2016	54.00%	0.00%	54.00%
33	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Zumalai	Covalima	Mania Unip, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000427	\$ 721,805.08	Sept. 1, 2016	96.00%	0.00%	96.00%
34	Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Clardel Interprice Unip Lda	SSS/227/MOPTC-2016	\$ 3,026,312.56	Sept. 13, 2016	68.90%	1.48%	70.38%
35	Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction (0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Star Suai, Lda	SSS/050/MOPTC-2017	\$ 3,461,708.40	Sept. 7, 2017	94.97%	4.49%	99.46%
36	Rehabilitation of be'e mean roads	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Roman Junior Unipessoal, Lda	SSS/049/MOPTC-2017	\$ 3,645,870.73	Sept. 5, 2017	94.26%	1.14%	95.40%
37	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	LM-TP	EDIFICIOS PUBLICOS	Zumalai	Covalima	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/VII/2015	\$ 1,196,660.00	Aug. 1, 2015	87.44%	0.00%	87.44%
38	Konstrusaun Eskola Tekniko Professional Zumalai	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Zumalai	Covalima	Sabudoir Unip. Lda	03/A.M.Covalima/KDM-AMP/VII/2019	\$ 177,630.77	July 15, 2019	96.79%	0.00%	96.79%
39	Rural Roads Periodik Maintenance Lepo - Lour Chainage 0+000-3+000	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	MPW-W-190260	\$ 73,033.49	Dec. 19, 2019	84.51%	0.00%	84.51%
40	Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai Road Section 8 : Zulo - Jct Zumalai (30+100 - 35+120 km) Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Octogono Constr. Unip. Lda	SSS/067/MOPTC-2017	\$ 3,748,915.76	Sept. 7, 2017	34.39%	4.85%	39.24%
41	Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50+900 km), Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai (35+120) Road Section 7 : Fatulito - Zulo (25+800 - 30+100) Municipality Bobonaro - Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Zumalai	Covalima	Marino Enterprises, Lda	SSS/065/MOPTC-2017	\$ 4,314,282.59	Sept. 12, 2017	30.52%	7.29%	37.80%
42	Manutensaun no konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba - Covalima	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	FLOOD CONTROL	Zumalai	Covalima	Lifran Unip. Lda	RDTL - 2021 - 15595	\$ 260,523.18	Oct. 5, 2021	39.18%	30.26%	69.44%
43	Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro and Manufahi	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Multy Posto	Covalima	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/029/MOPTC-2017	\$ 379,631.20	July 7, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
44	Rehabilitation of Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Multy Posto	Covalima	Expres Distribution Services Unip. Lda	SSS/318/MOPTC-2016	\$ 4,941,274.57	Dec. 9, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
45	Manutensaun Estrada Lookeu. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200- Municipal of Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Multy Posto	Covalima	Manu Bey Unip Lda	RT/079/MOPTC-2016	\$ 150,247.52	Aug. 19, 2016	51.08%	0.00%	51.08%
46	Rural Roads Routine Maintenance Lepo-Lour Sta 0+000-3+000, Naguidal - Lour Sta 0+000-5+000, Boardikun - Mape Sta 0+000-8+000 / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Multy Posto	Covalima	Futuro Mane Mesak Unip Lda	MPWTC-CD-170015	\$ 34,106.69	Jan. 8, 2017	88.48%	0.00%	88.48%



ANEXO B
PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU COVALIMA

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Jan-22		
											Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
47	Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Cha 0+000 - 9+600, Lookeu Cha 0+000 - 6+000, Casabauc 008 Cha 0+000 - 3+000, Casabauc 012 Cha 0+000 - 3+500, Casabauc 018 Cha 0+000 - 2+700, Lalawa Cha 0+000 - 3+500, Boraikun Mape Cha 0+000 - 8+000, Naguidal Lepo Cha 0+000 - 4+000 Municipality Covalima	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Multy Posto	Covalima	Lufi Raica Unip Lda	MPW/WNCB/R/190048	\$ 109,210.34	Aug. 13, 2019	0.00%	0.00%	0.00%

Prepara Husi :

(Eng. Madeiro D J Magno)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Covalima
ADN, I.P.

(Eng. Prezenzio L C D Ximenes)

Eng. ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu, Municipio Covalima
ADN, I.P.

(Silvino D R R Soares)

Eng. M & E, Municipio Covalima ADN, I.P.

(Eng. Domingos Soares Martins)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio
Covalima
ADN, I.P.

(Eng. Bosco Dinis de Sousa)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio
Covalima
ADN, I.P.

Verifika Husi :

(Arc. Francisco X D D Jeronimo)

Eng. Senior ba Edificio Publiku no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.

(Eng. Aniceto da Costa)

Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun,
ADN, I.P.

(Deolindo de P Marques)

Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-5)

Back-up Data

Naran Projeto : New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)
No. kontratu : SSS/266/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 19/01/2022

Fatin Inspesaun : Suai Villa- Suai Loro

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.32708999715697, Latetude: 125.261079110205

End Point : Long : -9.35355117970772, Latetude: 125.259350091218

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins
2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Informasaun

Drainagen in Suai Loro Projecto ne,e item stone masonry/Drainagen nian ba parte wall nian sorin balun hotu ona, maibe agora projecto refere provisoriamente iha tereno parado hela tamba problema financeiro.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-5)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)
: SSS/266/MOPTC-2016

Informasaun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Item servisu ba Reinforcing steel bars and
structural concrete 21 Mpa



Informasaun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Item servisu ba stone masonry/Drainagen





ANEXU C2 (SV-5)

CONTRAC NO : SSS/266/MOPTC-2016
PROJECT TITLE : EMERGENCY - NEW CONSTRUCTION OF DRAINAGE IN SUAI LORO
LOCATION : BAKUN, SUAI LORO, MUNICIPALITY OF COVALIMA
CONTRACTOR : CONCORCIO NAROMAN COVALIMA (CNC) GROUP Lda

SUMARRY

ORIGINAL CONTRAC and REVISED				ADN BACK UP										Remarks
PEY ITEM NUMBER	DESCRIPTION	CONTRAC AMOUNT		BILLED AMUNT										
				Halo ona rekomendasaun pagamentu		Seidauk halo rekomendasaun pagamentu						TO - DATE	Porsentu (%)	
		ORIGINAL	REVISED	PREVIOUS	Porsentu (%)	Fulan Kotuk	Porsentu (%)	Fulan ida ne'e	Porsentu (%)	THIS PERIOD	Porsentu (%)			
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 6,732.00	\$ 11,732.00	\$ 6,732.00	0.55%	-	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 6,732.00	0.55%	
200	EARTH WORKS	\$ 913,128.98	\$ 140,934.45	\$ 102,417.54	8.37%	1,429.58	0.12%	\$ 1,633.80	0.13%	\$ 3,063.38	0.25%	\$ 105,480.91	8.62%	
400	SURFACE COURSE	\$ -	\$ 117,274.19	\$ -	0.00%	-	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
500	CONCRETET WORKS	\$ -	\$ 9,621.22	\$ -	0.00%	-	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION WORKS	\$ 303,355.14	\$ 938,649.71	\$ 522,632.72	42.73%	\$ 57,569.80	4.71%	\$ 74,018.31	6.05%	\$ 131,588.11	10.76%	\$ 654,220.83	53.48%	
	GRAND TOTAL	\$ 1,223,216.12	\$ 1,218,211.57	\$ 631,782.26	51.65%	\$ 58,999.37	4.82%	\$ 75,652.11	6.18%	\$ 134,651.48	11.01%	\$ 766,433.74	62.66%	

Prepara Husi

I. Eng. Domingos Soares Martins

II. Eng. Bosco Dinis de Sousa
Engenheiro ba Projecto Infrastructura, Transportes e
Irigasaun Munisipiu Covalima A D N, I.P..










Verifika Husi:

Eng. Aniceto da Costa
Engenheiro Senior ba Projecto Infrastructura, Transportes e Irigasaun A D N, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade A D N, I.P.

ANEXU D (SV-5)

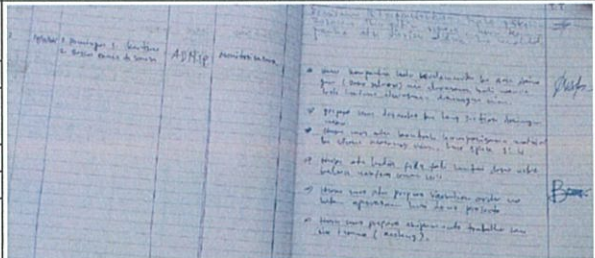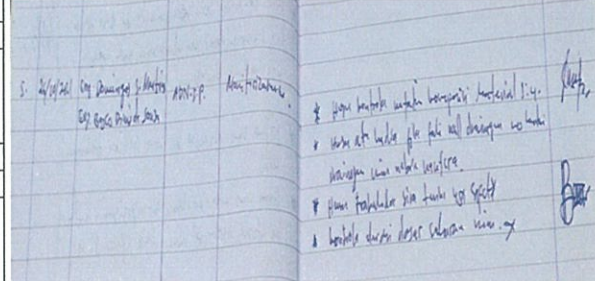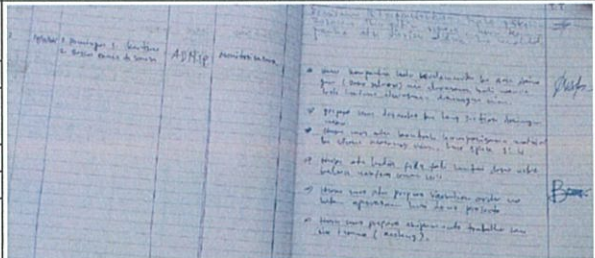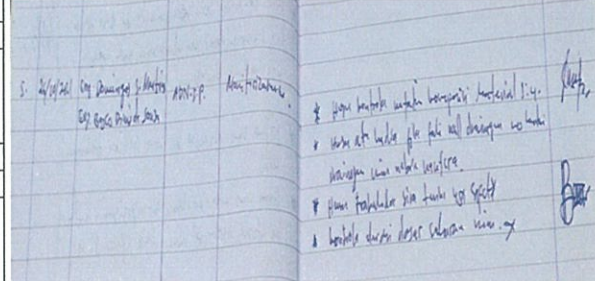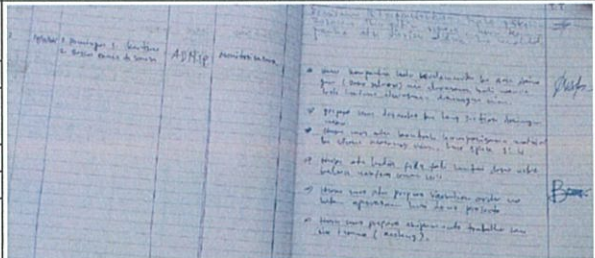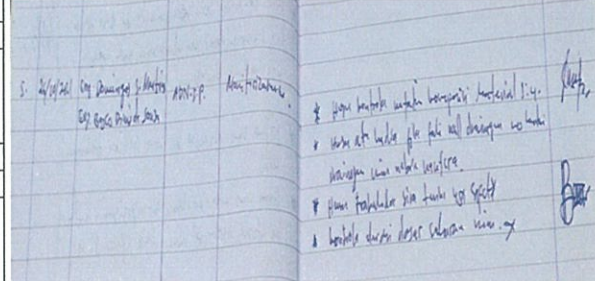 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro) Kompanha : Consorcio Naroman Covalima, Group Lda <tr><th>No</th><th>Data inspesaun</th><th>Municipiu / Posto</th><th>Naran Eng.</th><th>Pozisaun</th><th>No</th><th>INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN</th><th></th><th>Asinatura</th></tr> <tr><td rowspan="6">I</td><td rowspan="3">14/10/2021</td><td rowspan="3">Suai Villa</td><td rowspan="3">Eng. Domingos Soares Martins</td><td rowspan="3">Engineiru Munisipiu</td><td>1</td><td>Husu kompania halo levantamento ba base drainagen (dasar saluran) nia elevasaun hodi nune,e bele hatene elevasi drainage nian</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>2</td><td>Prepara mos ba desenho long section drainage</td></tr> <tr><td>3</td><td>Husu mos atu kontrola ba komposisaun material ba stone masonry nian tuir spek. 1:4</td></tr> <tr><td rowspan="3">14/10/2021</td><td rowspan="3">Suai Villa</td><td rowspan="3">Eng. Bosco Dinis de Sousa</td><td rowspan="3">Engineiru Munisipiu</td><td>4</td><td>Husu atu hadia fila fali ba lantai dasar balun nebe,e mak nakfera</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>5</td><td>Husu mos atu prepara variation order no hetan aprovasaun husi dono projecto</td></tr> <tr><td>6</td><td>Husu mos prepara equipamento trabalho tau iha terreno (moleng)</td></tr> <tr><td rowspan="5">II</td><td rowspan="2">21/10/2021</td><td rowspan="2">Suai Villa</td><td rowspan="2">Eng. Domingos Soares Martins</td><td rowspan="2">Engineiru Munisipiu</td><td>1</td><td>Husu atu kontrola nafatin komposisaun material tuir spesifikasaun 1:4</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>Husu mos atu hadia fila fali ba lantai dasar saluran ne,ebe iha balun nakfera hela</td></tr> <tr><td rowspan="3">21/10/2021</td><td rowspan="3">Suai Villa</td><td rowspan="3">Eng. Bosco Dinis de Sousa</td><td rowspan="3">Engineiru Munisipiu</td><td>3</td><td>Husu mos atu koordena ho dono projecto hodi resolve CCO nian</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="6">III</td><td rowspan="3">26/10/2021</td><td rowspan="3">Suai Villa</td><td rowspan="3">Eng. Domingos Soares Martins</td><td rowspan="3">Engineiru Munisipiu</td><td>1</td><td>Husu kontrola nafatin komposisi material 1:4</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>2</td><td>Husu atu hadia fila fali wall drainagen no lantai drainagen nian nebe'e nakfera</td></tr> <tr><td>3</td><td>Husu trabalhador sira tenke uja safety</td></tr> <tr><td rowspan="3">26/10/2021</td><td rowspan="3">Suai Villa</td><td rowspan="3">Eng. Bosco Dinis de Sousa</td><td rowspan="3">Engineiru Munisipiu</td><td>4</td><td>Kontrola elevasi dasar saluran nian.</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr>					No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura	I	14/10/2021	Suai Villa	Eng. Domingos Soares Martins	Engineiru Munisipiu	1	Husu kompania halo levantamento ba base drainagen (dasar saluran) nia elevasaun hodi nune,e bele hatene elevasi drainage nian			2	Prepara mos ba desenho long section drainage	3	Husu mos atu kontrola ba komposisaun material ba stone masonry nian tuir spek. 1:4	14/10/2021	Suai Villa	Eng. Bosco Dinis de Sousa	Engineiru Munisipiu	4	Husu atu hadia fila fali ba lantai dasar balun nebe,e mak nakfera		5	Husu mos atu prepara variation order no hetan aprovasaun husi dono projecto	6	Husu mos prepara equipamento trabalho tau iha terreno (moleng)	II	21/10/2021	Suai Villa	Eng. Domingos Soares Martins	Engineiru Munisipiu	1	Husu atu kontrola nafatin komposisaun material tuir spesifikasaun 1:4			2	Husu mos atu hadia fila fali ba lantai dasar saluran ne,ebe iha balun nakfera hela	21/10/2021	Suai Villa	Eng. Bosco Dinis de Sousa	Engineiru Munisipiu	3	Husu mos atu koordena ho dono projecto hodi resolve CCO nian		4		5		III	26/10/2021	Suai Villa	Eng. Domingos Soares Martins	Engineiru Munisipiu	1	Husu kontrola nafatin komposisi material 1:4			2	Husu atu hadia fila fali wall drainagen no lantai drainagen nian nebe'e nakfera	3	Husu trabalhador sira tenke uja safety	26/10/2021	Suai Villa	Eng. Bosco Dinis de Sousa	Engineiru Munisipiu	4	Kontrola elevasi dasar saluran nian.		5		6	
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura																																																																											
I	14/10/2021	Suai Villa	Eng. Domingos Soares Martins	Engineiru Munisipiu	1	Husu kompania halo levantamento ba base drainagen (dasar saluran) nia elevasaun hodi nune,e bele hatene elevasi drainage nian																																																																													
					2	Prepara mos ba desenho long section drainage																																																																													
					3	Husu mos atu kontrola ba komposisaun material ba stone masonry nian tuir spek. 1:4																																																																													
	14/10/2021	Suai Villa	Eng. Bosco Dinis de Sousa	Engineiru Munisipiu	4	Husu atu hadia fila fali ba lantai dasar balun nebe,e mak nakfera																																																																													
					5	Husu mos atu prepara variation order no hetan aprovasaun husi dono projecto																																																																													
					6	Husu mos prepara equipamento trabalho tau iha terreno (moleng)																																																																													
II	21/10/2021	Suai Villa	Eng. Domingos Soares Martins	Engineiru Munisipiu	1	Husu atu kontrola nafatin komposisaun material tuir spesifikasaun 1:4																																																																													
					2	Husu mos atu hadia fila fali ba lantai dasar saluran ne,ebe iha balun nakfera hela																																																																													
	21/10/2021	Suai Villa	Eng. Bosco Dinis de Sousa	Engineiru Munisipiu	3	Husu mos atu koordena ho dono projecto hodi resolve CCO nian																																																																													
					4																																																																														
					5																																																																														
III	26/10/2021	Suai Villa	Eng. Domingos Soares Martins	Engineiru Munisipiu	1	Husu kontrola nafatin komposisi material 1:4																																																																													
					2	Husu atu hadia fila fali wall drainagen no lantai drainagen nian nebe'e nakfera																																																																													
					3	Husu trabalhador sira tenke uja safety																																																																													
	26/10/2021	Suai Villa	Eng. Bosco Dinis de Sousa	Engineiru Munisipiu	4	Kontrola elevasi dasar saluran nian.																																																																													
					5																																																																														
					6																																																																														



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II
5+020 - 10+140 Municipality Covalima
No. kontratu : SSS/051/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 20/01/2022

Fatin Inspesaun : Haimanu - Zumalai

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.23598732969325, Latetude: 125.366276018321

End Point : Long : -9.21656586680778, Latetude: 125.391818024218

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins
2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Assunto : Informasaun Projecto finalize ona 100%

1. Projecto neé finaliza 100% no termo entrega provizoriu iha tinan 2020
2. Entrega Final iha tinan 2021 ba ona dono projecto no prosesu pagamentu sei realiza iha tinan 2022 nia laran.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-7)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II
5+020 - 10+140 Municipality Covalima
No. kontratu : SSS/051/MOPTC-2017

Sketch & Foto Desenho

Estrada Haimanu - Zumalai

Kondisaun Estrada Actual diak hela, Luan
Estrada 6 m, FHO ona ba dono Projecto iha
tinan 2021, prosesu pagamentu sei realiza iha
tinan 2022

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Estrada Haimanu - Zumalai

Kondisaun Estrada Actual diak hela, Luan
Estrada 6 m, fisiku konstrusaun atinge ona
100% iha tereno.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU D (SV-7)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II
5+020 - 10+140 Municipality Covalima

Kompanha : Nobre Labadai Unipessoal, Lda

No	Data inspesaun	Municípiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	1/20/2022	Suai-Villa	Eng. Domingos Soares Martins	Engineiru Munisípiu	1	Projectu neé finaliza ona PHO	
					2	Projetu ne'e fisikamente agora iha tereno diak hela	
					3	Pagamentu agora ba retensaun nian hodi determina FHO ba dono Projecto.	
	1/20/2022	Suai-Villa	Eng. Bosco Dinis de Sousa	Engineiru Munisípiu	4		
					5		
					6		
					2		
					3		
					4		
					5		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SV-8)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste
No. kontratu : RDTL-MS-DNA-NCB-20-150

Data Inspesaun : 18-01-2022

Fatin Inspesaun : Suai Debos

Koordinadas :

Start Point : Long: -9.313528 Latetude : 125.255554

Naran Inspector : 1 Madelino Deonizo Jose Magno
2. Prezenzio L C D Ximenes

Informasaun Husi Terreno

Projetu refere remata ona no atinge ona 100%

Projetu ne'e mos agora dadaun ema utiliza ona

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (SV-8)

PROJECT TITLE : NEW CONSTRUCTION FOR ICU ROOM

CONTRACTOR : GIOVANO

LOCATION : DEBOS- COVALIMA

SUMMARY

CONTRACT							PREVIOUS BILL		THIS BILL		UP TO DATE	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT	PERSNTASE	DEDUCTION	ADITIONAL	RIVISED	AMOUNT	PERSNTASE	AMOUNT	PERSNTASE	AMOUNT	PERSNTASE
I	PREPARATION WORKS	\$ 5,187.76	2.73%	-	-	5,187.76	\$ 5,187.76	2.73%	\$ -	0.00%	\$ 5,187.76	2.73%
II	FOUNDATION WORKS	\$ 236.78	0.12%	-	25.99	262.77	\$ 262.77	0.14%	\$ -	0.00%	\$ 262.77	0.14%
III	CONCRETE WORKS	\$ 18,745.96	9.87%	973.40	7,558.78	25,331.34	\$ 25,331.34	13.34%	\$ -	0.00%	\$ 25,331.34	13.34%
IV	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 6,984.55	3.68%	-	-	6,984.55	\$ 6,984.55	3.68%	\$ -	0.00%	\$ 6,984.55	3.68%
V	CARPENTER WORKS	\$ 11,900.00	6.26%	-	-	11,900.00	\$ 11,900.00	6.26%	\$ -	0.00%	\$ 11,900.00	6.26%
VI	ROOFING WORKS	\$ 26,015.97	13.70%	2,443.96	2,860.79	26,432.79	\$ 26,432.79	13.91%	\$ -	0.00%	\$ 26,432.79	13.91%
VII	CEILING WORKS	\$ 5,733.16	3.02%	-	554.74	6,287.89	\$ 6,287.89	3.31%	\$ -	0.00%	\$ 6,287.89	3.31%
VIII	FLOOR TILE WORKS	\$ 8,500.90	4.48%	-	-	8,500.90	\$ 8,500.90	4.48%	\$ -	0.00%	\$ 8,500.90	4.48%
IX	ELECTRICAL WORKS	\$ 14,132.64	7.44%	-	-	14,132.64	\$ 13,570.14	7.14%	\$ -	0.00%	\$ 13,570.14	7.14%
X	SANITASI WORKS	\$ 4,601.48	2.42%	889.93	509.25	4,220.80	\$ 3,970.80	2.09%	\$ -	0.00%	\$ 3,970.80	2.09%
XI	PAINTING WORKS	\$ 2,192.74	1.15%	-	-	2,192.74	\$ 2,192.74	1.15%	\$ -	0.00%	\$ 2,192.74	1.15%
XII	FURNITURE	\$ 15,440.76	8.13%	0.76	-	15,440.00	\$ 15,440.00	8.13%	\$ -	0.00%	\$ 15,440.00	8.13%
XII	CENTRAL OXYGEN + CAPASITY BUILDING	\$ 31,850.00	16.77%	6,225.00	-	25,625.00	\$ 25,625.00	13.49%	\$ -	0.00%	\$ 25,625.00	13.49%
XIV	FINAL CLEARING	\$ 350.00	0.18%	-	-	350.00	\$ 350.00	0.18%	\$ -	0.00%	\$ 350.00	0.18%
A	CONTRUCTION COST	\$ 151,872.67	79.95%	\$ 10,533.05	\$ 11,509.54	\$ 152,849.16	\$ 152,036.66	80.04%	\$ -	0.00%	\$ 152,036.66	80.04%
B	CONTRACTOR FEE (10% X A)	\$ 15,187.27	7.99%	\$ 1,053.31	\$ 1,150.95	\$ 15,284.92	\$ 15,203.67	8.00%	\$ -	0.00%	\$ 15,203.67	8.00%
C	OVERHEAD	\$ 4,470.00	2.35%			\$ 4,470.00	\$ 4,470.00	2.35%	\$ -	0.00%	\$ 4,470.00	2.35%
D	CONSTRUCTION TAX 2% X (A+B+C)	\$ 3,430.60	1.81%	\$ 231.73	\$ 253.21	\$ 3,452.08	\$ 3,434.21	1.81%	\$ -	0.00%	\$ 3,434.21	1.81%
E	CONTIGENCY	\$ 15,000.00	7.90%	\$ 15,000.00		\$ -	\$ 6,147.27	3.24%	\$ -	0.00%	\$ 6,147.27	3.24%
F	TOTAL PROJECT COST (A + B + C + D + E)	\$ 189,960.54	100.00%	\$ 26,818.09	\$ 12,913.71	\$ 176,056.16	\$ 181,291.81	95.44%	\$ -	0.00%	\$ 181,291.81	95.44%

PREPARED BY

(MADELINO D J MAGNO) (PREZENZIO L C D XIMENES)
Tekniko EPAS ADN, I.P. Município Covalima, ADN, I.P.


VERIFIED BY

(ARC FRANCISCO X D D JERONIMO)
Engenheiro Senior do Projeto Edifício Público Água e Saneamento, ADN, I.P.

CERTIFIED BY

(ENG. EMERENCIANA DA COSTA MAIA FREITAS)
Coordenadora da unidade de Controlo e Validação de Qualidade ADN, I.P.

#ANEXU D (SV-8)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público		INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
Naran projeto : New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste								
Kompanha : Giovanio Unip. Lda								
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	18 de Janeiro de 2021	Suai-Villa	Eng. Prezenzio L. C. D. Ximenes	Engineiru Munisipiu	1	Projetu refere remata ona no progressu fiziku atinge ona 100%		
					2	Kontrator tenke halo kontrolo nafatin ba projeto ne durante fulan 6		
					3	Husu ba parte utilizador mos atu kuido didiak edificio refere.		
	18 de Janeiro de 2021	Suai-Villa	Eng. Madelino D. J. Magno	Engineiru Munisipiu	4			
					5			
					6			
III					1			
					2			
					3			
					4			
					5			
IV					1			
					2			
					3			
					4			
					5			
V					1			
					2			
					3			
					4			
					5			



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-9)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital,
Covalima, Timor Leste

No. kontratu : RDTL-MS-DNA-NCB-20-166

Data Inspesaun :24-01-2022

Fatin Inspesaun : Debos Suai Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.313346 Latetude: 125.255521


Naran Inspector : 1 Madelino D J Magno

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu - Supply and Installation of
double Door aluminium with glass Type
D021 2000 mm x 2400mm , including all
assessories & finishing / Pintu Panel
Aluminium

Quantidade = 1 unit

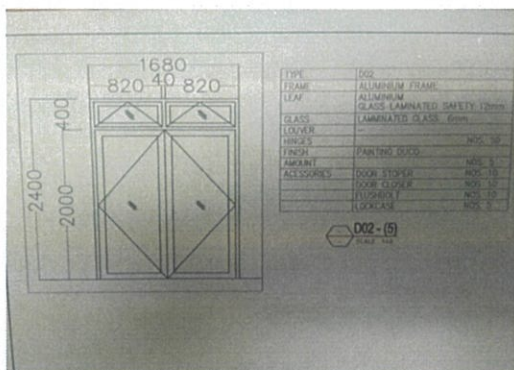

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-9)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital,
Covalima, Timor Leste

No. kontratu : RDTL-MS-DNA-NCB-20-166

Servisu- Supply & install Tile Plint

100mm x 600mm

V = 150 m





#ANEXU C2 (SV-9)

PROJECT TITLE : NEW CONSTRUCTION FOR ISOLATION ROOM

LOCATION : SUAI VILLA- COVALIMA

SUMMARY									
CONTRACT				PREVIOUS PROGRESS		THIS PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
NO	DESCRIPTION	Amount	Persentase	Amount	Persent	Amount	Persent	Amount	Persent
	PREPARATION WORKS	\$ 8,676.28	3.31%	\$ 7,176.28	2.73%	\$ -	0.00%	\$ 7,176.28	2.73%
	FUNDATION WORKS	\$ 686.05	0.26%	\$ 686.05	0.26%	\$ -	0.00%	\$ 686.05	0.26%
	CONCRETE WORKS	\$ 38,669.73	14.73%	\$ 36,764.13	14.01%	\$ -	0.00%	\$ 36,764.13	14.01%
	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 27,095.32	10.32%	\$ 27,095.32	10.32%	\$ -	0.00%	\$ 27,095.32	10.32%
	CARPENTER WORKS	\$ 24,000.00	9.14%	\$ 18,350.00	6.99%	\$ 5,650.00	2.15%	\$ 24,000.00	9.14%
	ROOFING WORKS	\$ 24,008.00	9.15%	\$ 23,108.00	8.80%	\$ -	0.00%	\$ 23,108.00	8.80%
	CEILING WORKS	\$ 7,961.57	3.03%	\$ 7,337.83	2.80%	\$ -	0.00%	\$ 7,337.83	2.80%
	FLOOR TILE WORKS	\$ 13,379.79	5.10%	\$ 9,605.63	3.66%	\$ 2,113.55	0.81%	\$ 11,719.18	4.47%
	ELECTRICAL WORKS	\$ 26,382.48	10.05%	\$ 4,995.48	1.90%	\$ -	0.00%	\$ 4,995.48	1.90%
	SANITASI WORKS	\$ 13,391.33	5.10%	\$ 6,355.00	2.42%	\$ -	0.00%	\$ 6,355.00	2.42%
	PAINTING WORKS	\$ 11,349.78	4.32%	\$ 2,837.47	1.08%	\$ -	0.00%	\$ 2,837.47	1.08%
	FURNITURE	\$ 13,200.00	5.03%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	FINAL CLEARING	\$ 250.00	0.10%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONTRUCTION COST (I + XIII)	\$ 209,050.35	79.65%	\$ 144,311.18	54.99%	\$ 7,763.55	2.96%	\$ 152,074.73	57.94%
	Fee Contractor(10% x A)	\$ 20,905.04	7.97%	\$ 14,431.12	5.50%	\$ 776.35	0.30%	\$ 15,207.47	5.79%
C	Overhead	\$ 1,000.00	0.38%	\$ 500.00	0.19%	\$ -	0.00%	\$ 500.00	0.19%
C	TAX 2% x (A + B)	\$ 4,619.11	1.76%	\$ 3,184.85	1.21%	\$ 170.80	0.07%	\$ 3,355.64	1.28%
D	CONTIGENCY (10% x A)	\$ 26,877.50	10.24%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
E	TOTAL PROJECT COST	\$ 262,452.00	100.00%	\$ 162,427.14	61.89%	\$ 8,710.70	3.32%	\$ 171,137.84	65.21%

PREPARED BY


(Prezenzio L C D Ximenes) (Madelino D J Magno)
Tekniko EPAS - ADN, I.P, Municipio Covalima




VERIFIED BY


(Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo)
Engenheiro Senior EPAS ADN, I.P,

CERTIFIED BY


(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P,

#ANEXU D (SV-9)

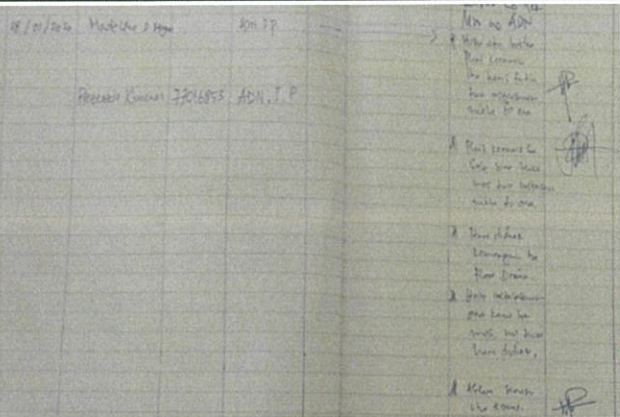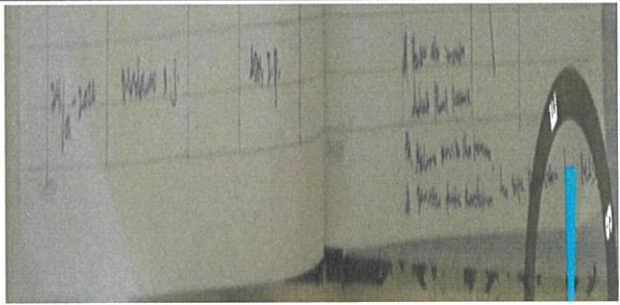 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste		
					Kompanha : Roman Junior Unipessoal, Lda		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/01/2022	Covalima-Suai Villa	Madelino D J Magno	Tekniko Municipio	1	Husu atu Hadia Keramik Iha Haris Fatin Tuir instrusaun ne'ebe fo ona.	
					2	Plint Keramik Iha Sala sira monta tenke tuir instrusaun ne'ebe fo ona	
	18/01/2022	Covalima-Suai Villa	Prezenzio L C D Ximenes	Tekniko Municipio	3	Halo Instalasaun ona kanu be mos, no tenke hare didiak	
					4	Aselere servisu iha terreno	
II	24/01/2022	Covalima-Suai Villa	Madelino D J Magno	Tekniko Municipio	1	Husu atu monta Didiak Plint Keramik	
					2	Aselere servisu iha terreno	
	24/01/2022	Covalima-Suai Villa	Prezenzio L C D Ximenes	Tekniko Municipio	3	Servisu tenke kordena ho Site Supervisor Husi MdS	



#ANEXU C1 (SV-10)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital,
Ministry of Health Timor-Leste

No. kontratu : RDTL-MS-DNA-RBK-20-184

Data Inspesaun : 18 -01 -2022

Fatin Inspesaun : Debos Suai Villa Covalima

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.313002 Latetude: 125.255552

Naran Inspector : 1 Madelino Deonizo Jose Magno

2. Prezenzio L D C Ximenes

Sketch & Foto Desenho

*Projeto ida agora iha fase retensaun, no
balansu osan karik la ezekuta sei fila fali ba
Kofre Estado.*

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (SV-10)

PROJECT TITLE : New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Refral Hospital, Ministry of Health, Timor Leste
LOCATION : Debos-Covalima

CONTRACTOR : Manu Bey Unip Lda

SUMMARY												
AMOUNT CONTRACT				REVISED			A D N, I.P. RECOMMENDATION					
				Deduction	Additional	Revised	Previous		This Bill		Up To Date	
NO	DESCRIPTION	Amount (USD)	Persentase	Amount	Amount	Amount	Amount	Persentase	Amount	Persentase	Amount	Persentase
I	PREPARATION WORKS	\$ 2,601.95	3.68%	\$ -	\$ -	\$ 2,601.95	\$ 2,601.95	3.68%	\$ -	0.00%	\$ 2,601.95	3.68%
II	FUNDATION WORKS	\$ 3,088.88	4.37%	\$ -	\$ -	\$ 3,088.88	\$ 3,088.88	4.37%	\$ -	0.00%	\$ 3,088.88	4.37%
III	CONCRETE WORKS	\$ 3,282.11	4.64%	\$ -	\$ 2.27	\$ 3,284.37	\$ 3,282.10	4.64%	\$ -	0.00%	\$ 3,282.10	4.64%
IV	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 5,678.63	8.03%	\$ -	\$ -	\$ 5,678.63	\$ 5,678.63	8.03%	\$ -	0.00%	\$ 5,678.63	8.03%
V	CARPENTER WORKS	\$ 4,456.00	6.30%	\$ -	\$ -	\$ 4,456.00	\$ 4,456.00	6.30%	\$ -	0.00%	\$ 4,456.00	6.30%
VI	ROOFING WORKS	\$ 9,172.40	12.96%	\$ -	\$ 0.76	\$ 9,172.54	\$ 9,171.77	12.96%	\$ -	0.00%	\$ 9,171.77	12.96%
VII	CEILING WORKS	\$ 3,840.52	5.43%	\$ -	\$ -	\$ 3,840.52	\$ 3,840.52	5.43%	\$ -	0.00%	\$ 3,840.52	5.43%
VIII	FLOOR TILE WORKS	\$ 2,906.54	4.11%	\$ -	\$ -	\$ 2,906.54	\$ 2,906.54	4.11%	\$ -	0.00%	\$ 2,906.54	4.11%
IX	ELECTRICAL WORKS	\$ 4,782.35	6.76%	\$ 2,478.00	\$ 1,593.87	\$ 3,882.47	\$ 3,882.47	5.49%	\$ -	0.00%	\$ 3,882.47	5.49%
X	SANITASI WORKS	\$ 3,911.43	5.53%	\$ 86.31	\$ -	\$ 3,825.12	\$ 3,825.12	5.41%	\$ -	0.00%	\$ 3,825.12	5.41%
XI	PAINTING WORKS	\$ 1,378.34	1.95%	\$ -	\$ -	\$ 1,378.34	\$ 1,378.34	1.95%	\$ -	0.00%	\$ 1,378.34	1.95%
XII	PROVISIONAL SUM FOR FURNITURE	\$ 10,000.00	14.13%	\$ 10,000.00	\$ 8,674.77	\$ 8,674.77	\$ 8,674.77	12.26%	\$ -	0.00%	\$ 8,674.77	12.26%
XIII	FINAL CLEARING	\$ 139.00	0.20%	\$ -	\$ -	\$ 139.00	\$ 139.00	0.20%	\$ -	0.00%	\$ 139.00	0.20%
A	CONSTRUCTION COST (I + XIII)	\$ 55,238.15	78.08%	\$ 12,564.31	\$ 10,271.68	\$ 52,929.13	\$ 52,926.10	74.81%	\$ -	0.00%	\$ 52,926.10	74.81%
B	Fee Contractor(10% x a)	\$ 5,523.81	7.81%	\$ 1,256.43	\$ 1,027.17	\$ 5,292.91	\$ 5,292.61	7.48%	\$ -	0.00%	\$ 5,292.61	7.48%
C	Overhead	\$ 3,183.00	4.50%	\$ -	\$ -	\$ 3,183.00	\$ 3,183.00	4.50%	\$ -	0.00%	\$ 3,183.00	4.50%
D	TAX 2% x (a + b + c)	\$ 1,278.90	1.81%	\$ 276.41	\$ 225.98	\$ 1,228.10	\$ 1,228.03	1.74%	\$ -	0.00%	\$ 1,228.03	1.74%
E	Contingency	\$ 5,523.81	7.81%	\$ 3,286.76	\$ -	\$ 2,237.05	\$ 2,237.05	3.16%	\$ -	0.00%	\$ 2,237.05	3.16%
F	TOTAL PROJECT COST (a + b + c + d + e)	\$ 70,747.68	100.00%	\$ 17,383.92	\$ 11,524.82	\$ 64,870.20	\$ 64,866.80	91.69%	\$ -	0.00%	\$ 64,866.80	91.69%

Prepared by
Date:...../...../2022

(Madelino D J Magno)
Engenheiro ADN, I.P.

(Prezenzio L C D Ximenes)
Engenheiro ADN, I.P.

Verified by
Date:...../...../2022

(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)
Engenheiro Senior ba Projeto Edificio
Publiku, Agua no Saneamento ADN, I.P.

Certified by
Date:/...../2022

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.

#ANEXU D (SV-10)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste Kompanha : Manu Bey Unip Lda		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	18/01/2022	Covalima- Suai Villa	Madelino D J Magno	Tekniko Municipio	1	Husu ba Kompanhia atu nafatin iha responsabilidade to tempo Retensaun Remata	
					2	Husu ba Parte Utilizador atu utiliza ona edificio refere	
	18/01/2022	Covalima- Suai Villa	Prezenzio L C D Ximenes	Tekniko Municipio	3	Husu ba parte utilizador karik iha failansu ruma iha be no parte electrical tenke informa ba teknikos Ministerio Saude nian, hodi nune bele orienta kontrator hodi resolve	
					4		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Road From Haemano Bridge - Zumalai Jct. Phase I
0+000 - 5+020 Municipality Covalima
No. kontratu : SSS/322/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 20 /01/2022

Fatin Inspesaun : Haimanu-Zumalai

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.254084736547574, Latetude: 125.34497860819101

End Point : Long : -9.235987329693254, Latetude: 125.36627601832153

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins
2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Sketch & Foto Desenho

Projecto ne'e remata ona 100%, no fase
retensaun finaliza ona,

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



NB; Projectu ne'e fisicamente atinge ona 100% iha tinan 2020, no pagamentu kompleta 100% nian termina ona iha tinan 2021 nia laran, no husi companhia entrega Final ba dono projectu iha fulan janeiro tinan 2022.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (SV-12)

Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu
Servisu – Sloof,

: New Construsaun of Interior Fence for Prison in Suai Municipality
: MJ-062/OUTUBRO/2021

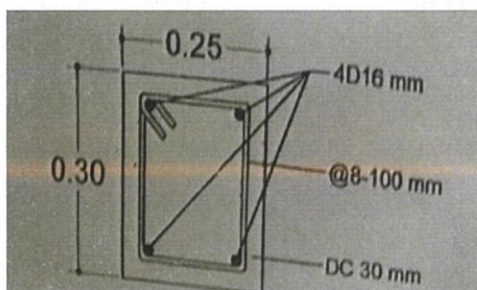

TULANGAN SLOOF

PANJANG SLOOF 270.00 m

PANJANG TOTAL BESI 1,080.00 m

BERAT BESI 16 mm = 1,704.24 Kg

SENKANG

TOTAL SENKANG 2,700.00 Bh

Panjan senkang Per Unit 1 m

Panjang Besi 8 mm 2,700.00 m

Berat Besi 8 mm = 1,080.0000 Kg

= 2,784.24 Kg



25 Jan 2022 11:27:09
9.3184739S 125.2750998E
18° N
Suai
Cova-Lima
ADN Covalima
Index number: 2587



#ANEXU C2 (SV-12)

Project Owner : MINISTRY OF JUSTICE

Project Name : NEW CONSTRUCTION OF INTERIOR FENCE

Location : SUAI PRISON, COVALIMA DISTRICT - TIMOR LESTE

Contract Amount			Previous Progress		This Progress		Up to Date Progress	
No.	Works Description	Amount	Amount	%	Amount	%	Amount	%
I	PREPARATION WORKS	\$ 6,479.50	\$ 3,967.00	2.66%	\$ -	0.00%	\$ 3,967.00	2.66%
II	EARTH WORKS	\$ 4,898.44	\$ 4,667.39	3.13%	\$ 50.28	0.03%	\$ 4,717.67	3.17%
III	MASONRY WORKS	\$ 57,620.88	\$ 9,166.15	6.15%	\$ 5,349.43	3.59%	\$ 14,515.59	9.74%
IV	CONCRETE WORKS	\$ 48,065.61	\$ 10,907.02	7.32%	\$ 10,071.70	6.76%	\$ 20,978.71	14.08%
V	PAINTING WORKS	\$ 7,865.39	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	TOTAL USD	\$ 124,929.81	\$ 28,707.56	19.26%	\$ 15,471.41	10.38%	\$ 44,178.97	29.64%
B	CONTRACTOR FEE (10% X A)	\$ 12,492.98	\$ 2,870.76	1.93%	\$ 1,547.14	1.04%	\$ 4,417.90	2.96%
C	OVERHEAD	\$ 2,875.00	\$ -	0.00%	\$ 862.50	0.58%	\$ 862.50	0.58%
D	TAX (2% x (A+B))	\$ 2,498.60	\$ 574.15	0.39%	\$ 309.43	0.21%	\$ 883.58	0.59%
E	CONTIGENCY 10%	\$ 6,246.49	\$ 1,435.38	0.96%	\$ 773.57	0.52%	\$ 2,208.95	1.48%
F	TOTAL USD	\$ 149,042.88	\$ 33,587.85	22.54%	\$ 18,964.04	12.72%	\$ 52,551.89	35.26%

PREPARED BY


(Prezenzio L C D Ximenes) (Madelino D J Magno)
Tekniko EPAS - ADN, I.P, Município Covalima, ADN,I.P



VERIFIED BY


(Arch. Francisco Xavier D. D. Jeronimo)
Engenheiro Senior EPAS ADN, I.P,

CERTIFIED BY


(Eng. Emerenciana Da Costa Maia Freitas)
Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de
Qualidade ADN, I.P,

#ANEXU D (SV-12)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : New Construsaun of Interior Fence for Prison in Suai Municipality		
					Kompanha : Fraternity Unipessoal Lda		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	17/01/2022	Covalima/ Suai Villa	Madelino D J Magno	Eng. Municipio	1	Wainhira atu halo Pengecooran tenke kordena ho laboratorium ADN,I.P. no MOP	
					2	Husu atu hare didiak Dezenho no BOQ molok Implementa	
					3	Aselera servisu iha terreno	
	17/01/2022	Covalima/ Suai Villa	Prezenzio L C D Ximenes	Eng. Municipio	4	Coor Karik Vibrator sei didiak to laran	
					5		
II	25/01/2022	Covalima/ Suai Villa	Madelino D J Magno	Eng. Municipio	1	Husu atu mantein tuir komposisi campuran ne'ebe laboratorium fo	
					2	Enginheiro kompahnia tenke nafatin kontrola trabalhador sira	
					4	Lori sumpel Beton ba tes iha laboratorium MOP no A D N I.P	
	25/01/2022	Covalima/ Suai Villa	Prezenzio L C D Ximenes	Eng. Municipio	5	Servisu tenke hare didiak BOQ ho Dezenho ne'ebe aprova ona	
					6		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-14)

Back-up Data

Naran Projeto : **Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai**
No. kontratu : **NCB:04/MEJD/DNA/2021**

Data Inspesaun : **19-01-2022**

Fatin Inspesaun : Akar Laran Suai Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.350792 Latetude: 125.249381

Naran Inspector : **1 Madelino D J Magno**

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu- Kontrator Instala ona *papan nama*
proyek iha terreno.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (SV-14)


Back-up Data

Naran Projeto
No. kontratu

: **Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai**
: **NCB:04/MEJD/DNA/2021**

Servisu- Kontrator hahu ke rai ba *Fondasi*
Toilet, no Kitchen

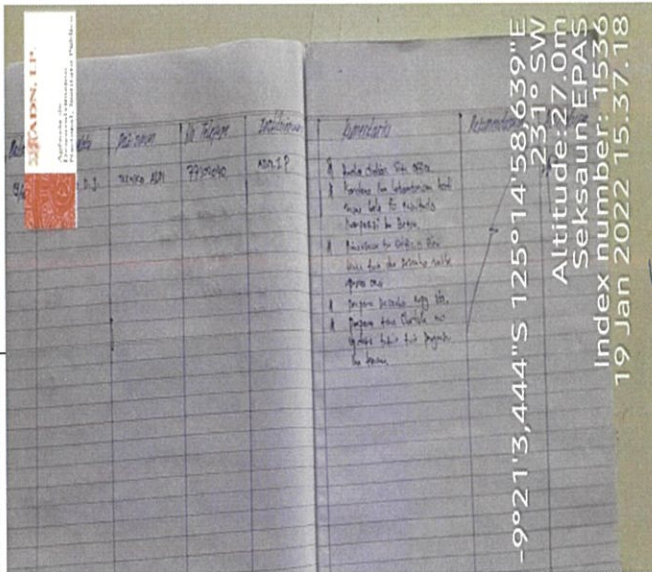

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE EDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN				
Naran projeto : Konstrusaun Foun ba ESTV Akara Laran, Suai									
Kompanha : Roman Junior Unipessoal, Lda									
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		Asinatura	
I	19/01/2022	Covalima-Suai Villa	Madelino D J Magno	Tekniko Municipio	1	Hadia didisk site Office			
					2	Kordena ho Laboratorium hodi nune bele fo resultado komposisi ba beton			
	19/01/2022	Covalima-Suai Villa	Prezenzio L C D Ximenes	Tekniko Municipio	3	Dimensaun Edificio sira tenke tuiirih Dezenho ne'ebe aprova ona			
					4	Prepara Dezenho Copy Ida			
					5	Prepara Time Schedule no Up date tutuir Progresso iha Terreno			
II									
III									
IV									
V									



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (TL-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk

No. kontratu : 06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019

Data Inspesaun :25 -01 -2022

Fatin Inspesaun : Wetaba Tilomar

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.419300 Latetude: 125.114669


Naran Inspector : 1. Madelino D J Magno

2. Prezenzio L C D Ximenes

Informasaun Husi Terreno

Servisu - Kontrator Hahu servisu monta stone masonry iha parte externa works nian.

$$V = (0.4 \text{ m} + 0.3\text{m} / 2) \times 0.75\text{m} \times 25\text{m} \\ = 6.6 \text{ m}^3$$

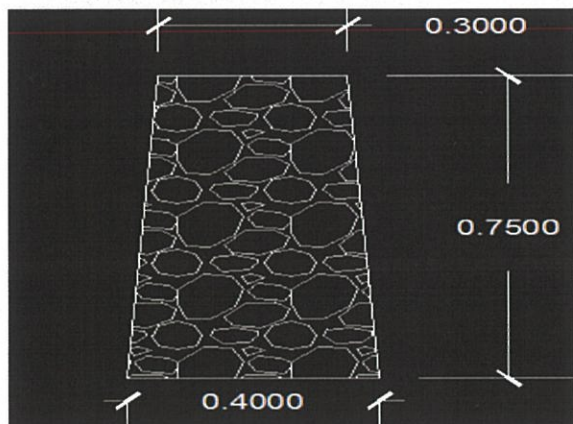

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C2 (TL-4)

PROJECT OWNER
PROJECT NAME
NO. CONTRATO
COMPANHIA
LOCATION PROJECT
POSTO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO

: MAE / Ministeriu da Saude
: KONST. EDIFISIU POSTO SAUDE NO KONST. RESIDENCIA MEDIKU WETABA
: 06 / A.M Covalima / KDM - AMP / IX / 2019
: JOIA CAMENASA CONST. UNIP, Lda
: WETABA
: TILOMAR
: COVALIMA

SUMMARY

NO	SUMMARY ITEM PEKERJAAN	CONTRACT VALUE			ADN BACK UP DATA					
		Amount USD	Weigth (%)	Variation Order	Previous Progress		This Progress		Up To Date Progress	
					Amount	Weight	Amount	Weight	Amount	Weight
I	NEW CONST. HEALTH POST WETABA,BEISEUK									
I	PRELIMINARIES	\$ 950.00	0.51%		\$ 825.00	0.44%	\$ -	0.00%	\$ 825.00	0.44%
II	GROUND WORKS	\$ 954.27	0.51%		\$ 954.27	0.51%	\$ -	0.00%	\$ 954.27	0.51%
III	CONCRETE WORKS	\$ 15,172.68	8.12%		\$ 13,505.36	7.23%	\$ -	0.00%	\$ 13,505.36	7.23%
IV	MASONRY WORKS	\$ 14,154.89	7.58%		\$ 11,602.83	6.21%	\$ -	0.00%	\$ 11,602.83	6.21%
V	STEEL STRUCTURE	\$ 7,003.68	3.75%		\$ 6,903.68	3.69%	\$ -	0.00%	\$ 6,903.68	3.69%
VI	ROOFING WORKS	\$ 6,566.86	3.51%		\$ 5,966.86	3.19%	\$ -	0.00%	\$ 5,966.86	3.19%
VII	DOOR AND WINDOW WORKS	\$ 8,067.01	4.32%		\$ 7,992.01	4.28%	\$ -	0.00%	\$ 7,992.01	4.28%
VIII	HARDWARE	\$ 965.75	0.52%		\$ 610.50	0.33%	\$ -	0.00%	\$ 610.50	0.33%
IX	PAINTING WORKS	\$ 2,809.83	1.50%		\$ 2,461.74	1.32%	\$ -	0.00%	\$ 2,461.74	1.32%
X	TILING WORKS	\$ 5,359.52	2.87%		\$ 5,149.06	2.76%	\$ -	0.00%	\$ 5,149.06	2.76%
XI	CEILING WORKS	\$ 4,921.48	2.63%		\$ 4,921.48	2.63%	\$ -	0.00%	\$ 4,921.48	2.63%
XII	HIDRAULIC SERVICES	\$ 8,662.50	4.64%		\$ 8,104.00	4.34%	\$ -	0.00%	\$ 8,104.00	4.34%
XIII	ELECTRICAL SERVICES	\$ 4,641.03	2.48%		\$ 2,745.39	1.47%	\$ -	0.00%	\$ 2,745.39	1.47%
XIV	MECHANICAL SERVICES	\$ 150.00	0.08%		\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
XV	CLINIC MEDICAL SERVICES	\$ 6,550.00	3.51%		\$ 6,550.00	3.51%	\$ -	0.00%	\$ 6,550.00	3.51%
XVI	PROVISIONAL SUM	\$ 350.00	0.19%		\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
XVII	EXTERNAL WORKS	\$ 6,150.00	3.29%		\$ 6,150.00	3.29%	\$ -	0.00%	\$ 6,150.00	3.29%
II	NEW CONST. OF RESIDENCIA FOR HEALTH POST STAFF WETABA,BEISEUK									
I	PRELIMINARIES	\$ 950.00	0.51%		\$ 375.00	0.20%	\$ -	0.00%	\$ 375.00	0.20%
II	GROUND WORKS	\$ 493.88	0.26%		\$ 493.88	0.26%	\$ -	0.00%	\$ 493.88	0.26%
III	CONCRETE WORKS	\$ 10,435.25	5.59%		\$ 9,547.78	5.11%	\$ -	0.00%	\$ 9,547.78	5.11%
IV	MASONRY WORKS	\$ 11,101.54	5.94%		\$ 9,614.12	5.15%	\$ -	0.00%	\$ 9,614.12	5.15%
V	STEEL STRUCTURE	\$ 4,627.19	2.48%		\$ 4,527.19	2.42%	\$ -	0.00%	\$ 4,527.19	2.42%
VI	ROOFING WORKS	\$ 4,285.18	2.29%		\$ 4,285.18	2.29%	\$ -	0.00%	\$ 4,285.18	2.29%
VII	DOOR AND WINDOW WORKS	\$ 5,465.00	2.92%		\$ 5,465.00	2.92%	\$ -	0.00%	\$ 5,465.00	2.92%
VIII	HARDWARE	\$ 682.00	0.37%		\$ 382.00	0.20%	\$ -	0.00%	\$ 382.00	0.20%
IX	PAINTING WORKS	\$ 2,251.14	1.20%		\$ 2,251.14	1.20%	\$ -	0.00%	\$ 2,251.14	1.20%
X	TILING WORKS	\$ 4,117.88	2.20%		\$ 4,117.88	2.20%	\$ -	0.00%	\$ 4,117.88	2.20%
XI	CEILING WORKS	\$ 3,020.17	1.62%		\$ 3,020.17	1.62%	\$ -	0.00%	\$ 3,020.17	1.62%
XII	HIDRAULIC SERVICES	\$ 6,014.31	3.22%		\$ 5,659.31	3.03%	\$ -	0.00%	\$ 5,659.31	3.03%
XIII	ELECTRICAL SERVICES	\$ 3,681.72	1.97%		\$ 2,130.90	1.14%	\$ -	0.00%	\$ 2,130.90	1.14%
XIV	PROVISIONAL SUM	\$ 2,245.00	1.20%		\$ 1,122.50	0.60%	\$ 1,122.50	0.60%	\$ 2,245.00	1.20%
XV	EXTERNAL WORKS	\$ 5,000.00	2.68%		\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
A	CONST. COST : I + II	\$ 157,799.74	84.46%		\$ 137,434.21	73.56%	\$ 1,122.50	0.60%	\$ 138,556.71	74.16%
B	CONTRACTOR FEE (10 % X A)	\$ 15,779.97	8.45%		\$ 13,743.42	7.36%	\$ 112.25	0.06%	\$ 13,855.67	7.42%
C	OVERHEAD	\$ 9,600.00	5.14%		\$ 6,425.00	3.44%	\$ -	0.00%	\$ 6,425.00	3.44%
D	TAX 2% x (A + B + C)	\$ 3,663.59	1.96%		\$ 3,152.05	1.69%	\$ 24.70	0.01%	\$ 3,176.75	1.70%
E	GRAND TOTAL COST (A + B + C + D)	\$ 186,843.31	100.00%		\$ 160,754.69	86.04%	\$ 1,259.45	0.67%	\$ 162,014.13	86.71%

Prepared By :

(Prezenzio L C D Ximenes) (Madelino D J Magno)
Engenheiro EPAS ADN, I.P. Municipio Covalima

Verified By :

(Arch. Francisco X D D Jeronimo)
Engenheiro Senior ba Edificiu Publico, água no Saneamento ADN, I.P.

Dili, 31 / 01 / 2021

Certified By :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Cordenadora da Unidade de Controlo e Validacao de Qualidade ADN, I.P.

#ANEXU D (TL-4)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
					Naran projeto : Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk		
					Kompanha : Joia Camenasa Unip. Lda		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	19/01/2022	Covalima-Tilomar	Madelino D J Magno	Tekniko Municipio	1	Husu ba Kontartor atu finaliza servisu resto sira	
					2	Parte Dono do Projeto atu orienta kontrator hodi bele finaliza servisu resto sira.	
					3	Kontrator tenke ezejuta obra ho seriedade	
	19/01/2022	Covalima-Tilomar	Prezenzio L C D Ximenes	Tekniko Municipio	4		
II	25/01/2022	Covalima-Tilomar	Madelino D J Magno	Tekniko Municipio	1	Kontrator tenke kontrola Trabalhador sira monta <i>stone masonry</i> , para lalika hada fatuk mamuk deit	
					2	Kontartor tenke Prepara Dezenho no Kalkulasaun Volume ba Externa Works para verifika Presu	
					3	Dono do Projeto tenke akompanhia kontrator nia servisu	
	25/01/2022	Covalima-Tilomar	Prezenzio L C D Ximenes	Tekniko Municipio	4	Aselera servisu iha tereno	
5							
III							
IV							
V							

#ANEXU C1 (TL-6) Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry
of Health, Timor Leste
No. kontratu : RDTL-MS-DNA-NCB-20-217
Data Inspesaun : 19- 01-2022
Fatin Inspesaun : Mota Masin, Tilomar.
Koordinadas :
Start Point : Long : -9.450287 Latetude: 125.088529
Naran Inspector : 1.Madelino Deonizo Jose Magno
2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

Servisu- Kontartor Mont ona *Tower*
foun (Maibe item ida ne sei verifika
presu tamba uza osan *provisional Sum.*)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





#ANEXU C2 (TL-6)

Project Name : Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste

Location : Suai - Covalima Municipality - Timor Leste

Project Owner : Ministry of Health

Contractor : Figelato Unip Lda

SUMMARY

CONTRACT				PREVIOUS PROGRESS		THIS PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT	PERSENTASE	AMOUNT	PERSENTASE	AMOUNT	PERSENTASE	AMOUNT	PERSENTASE
	BUILDING A								
I	PREPARATION WORKS	\$ 2,237.48	1.73%	\$ 1,737.48	1.34%	\$ -	0.00%	\$ 1,737.48	1.34%
II	GROUNDWORKS AND STONE MASONRY WORKS	\$ 55.78	0.04%	\$ 55.78	0.04%	\$ -	0.00%	\$ 55.78	0.04%
III	CONCRETE WORKS	\$ 10,653.02	8.22%	\$ 5,795.99	4.47%	\$ -	0.00%	\$ 5,795.99	4.47%
IV	WALL WORKS	\$ 10,283.76	7.94%	\$ 10,283.76	7.94%	\$ -	0.00%	\$ 10,283.76	7.94%
V	ROOF AND CEILING WORKS	\$ 9,498.56	7.33%	\$ 7,168.03	5.53%	\$ -	0.00%	\$ 7,168.03	5.53%
VI	FLOOR WORKS	\$ 5,529.23	4.27%	\$ 3,945.61	3.04%	\$ -	0.00%	\$ 3,945.61	3.04%
VII	DOORS AND WINDOWS WORKS	\$ 17,625.00	13.60%	\$ 17,300.00	13.35%	\$ -	0.00%	\$ 17,300.00	13.35%
VIII	MECHANICAL & ELEKTRICAL WORKS	\$ 4,101.50	3.16%	\$ 2,886.50	2.23%	\$ -	0.00%	\$ 2,886.50	2.23%
IX	HYDRAULIC SERVICES WORKS	\$ 16,885.50	13.03%	\$ 12,973.00	10.01%	\$ 1,825.00	1.41%	\$ 14,798.00	11.42%
X	SUPPLY & INSTALLATION OF FURNITURE	\$ 18,900.00	14.58%	\$ 18,790.00	14.50%	\$ -	0.00%	\$ 18,790.00	14.50%
XI	PAINTING WORKS	\$ 1,456.87	1.12%	\$ 1,456.87	1.12%	\$ -	0.00%	\$ 1,456.87	1.12%
XII	SITE CLEARANCE AFTER WORKS	\$ 200.00	0.15%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	Sub Total	\$ 97,426.69	75.18%	\$ 82,393.00	63.58%	\$ 1,825.00	1.41%	\$ 84,218.00	64.99%
	BUILDING B								
I	PRELIMINARY WORKS	\$ 875.00	0.68%	\$ 875.00	0.68%	\$ -	0.00%	\$ 875.00	0.68%
II	ELECTRICAL WORKS	\$ 165.00	0.13%	\$ 156.00	0.12%	\$ -	0.00%	\$ 156.00	0.12%
	Sub Total	\$ 1,040.00	0.80%	\$ 1,031.00	0.80%	\$ -	0.00%	\$ 1,031.00	0.80%
	BUILDING C								
I	PRELIMINARY WORKS	\$ 975.00	0.75%	\$ 475.00	0.37%	\$ -	0.00%	\$ 475.00	0.37%
II	OTHER WORKS	\$ 7,110.63	5.49%	\$ 3,263.37	2.52%	\$ -	0.00%	\$ 3,263.37	2.52%
III	ELECTRICAL WORKS	\$ 250.00	0.19%	\$ 125.00	0.10%	\$ -	0.00%	\$ 125.00	0.10%
	Sub Total	\$ 8,335.63	6.43%	\$ 3,863.37	2.98%	\$ -	0.00%	\$ 3,863.37	2.98%
	BUILDING D								
I	PRELIMINARY WORKS	\$ 925.00	0.71%	\$ 425.00	0.33%	\$ -	0.00%	\$ 425.00	0.33%
II	OTHER WORKS	\$ 2,121.96	1.64%	\$ 341.04	0.26%	\$ -	0.00%	\$ 341.04	0.26%
III	ELECTRICAL WORKS	\$ 200.00	0.15%	\$ 100.00	0.08%	\$ -	0.00%	\$ 100.00	0.08%
	Sub Total	\$ 3,246.96	2.51%	\$ 866.04	0.67%	\$ -	0.00%	\$ 866.04	0.67%



#ANEXU C2 (TL-6)

Project Name : Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste
Location : Suai - Covalima Municipality - Timor Leste
Project Owner : Ministry of Health
Contractor : Figelato Unip Lda

SUMMARY

CONTRACT				PREVIOUS PROGRESS		THIS PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
NO	DESCRIPTION	AMOUNT	PERSentase	AMOUNT	PERSentase	AMOUNT	PERSentase	AMOUNT	PERSentase
A	CONSTRUCTION COST	\$ 110,049.28	84.92%	\$ 88,153.42	68.02%	\$ 1,825.00	1.41%	\$ 89,978.42	69.43%
B	CONTRACTOR FEE (10% X A)	\$ 11,004.93	8.49%	\$ 8,815.34	6.80%	\$ 182.50	0.14%	\$ 8,997.84	6.94%
C	OVERHEAD	\$ 1,900.00	1.47%	\$ 1,500.00	1.16%	\$ -	0.00%	\$ 1,500.00	1.16%
D	CONSTRUCTION TAX 2% X (A+B+C)	\$ 2,459.08	1.90%	\$ 1,969.38	1.52%	\$ 40.15	0.03%	\$ 2,009.53	1.55%
E	CONTINGENCY	\$ 4,181.87	3.23%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
F	TOTAL PROJECT COST (A + B + C + D + E)	\$ 129,595.17	100.00%	\$ 100,438.13	77.50%	\$ 2,047.65	1.58%	\$ 102,485.78	79.08%

Prepared by

Date:...../...../2021

(Madelino D J Magno)

Engenheiro EPAS ADN, I.P. Municipio Covalima

(Prezenzio L C D Ximenes)

Engenheiro EPAS ADN, I.P. Municipio Covalima

Verified by

Date:...../...../2021

(Arch. Francisco Xavier de Deus Jeronimo)

Engenheiro Senior do Projeto Edificio
Publico, Agua e Saneamento ADN, I.P.

Certified by

Date: 31./01/...../2021

(Eng. Emerenciana Da Costa Maia)

Coordenadora da Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade ADN, I.P.

#ANEXU D (TL-6)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste

Kompanha : Figelato Unip. Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	19/01/2022	Covalima- Tilomar	Madelino D J Magno	Tekniko Município	1	Husu kompnhia atu Prepara As Built Drawing no as Built Quantity	
					2	Kompnhia tenke hadia parede no lantai iha parte balu ne'ebe sei retak	
	19/01/2022	Covalima- Tilomar	Prezenzio L C D Ximenes	Tekniko Município	3	Komphia tenke hare didiak fali BOQ, tamba iha item balu seidak ezejuta.	
					4	List Pland ba Building A iha parte kotuk presiza halo reparasaun ho dididak	
II							
III							
IV							
V							



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (TL-7)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk,
Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)

No. kontratu : RDTL-MS-DNA-NCB-21-071

Data Inspesaun : 27- Janeiro -2022

Fatin Inspesaun : Biseuk (Niquer), Tilomar, Covalima

Koordinadas :


Start Point : Long : -9.34476142 Latetude: 125.07355645

Naran Inspector : 1.Madelino Deonizo Jose Magno

2. Prezenzio L C D Ximenes

Sketch & Foto Desenho

*Servisu - monta tan Batako pengecooran
Colom no Pengecooran Lintel Beam ba
residencia medico.*

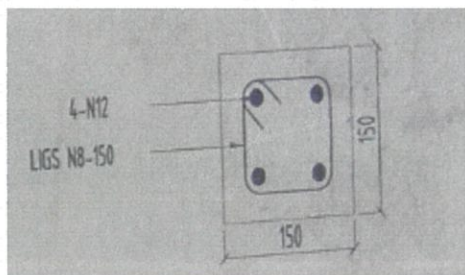

Volume Beton Colom = 0.2×2 Unit House
= 0.4 m³

Area Batako = 18.29×2 unit House
= 36.58 m²

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (TL-7)


Back-up Data

Naran Projeto : New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk,
Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)

No. kontratu : RDTL-MS-DNA-NCB-21-071

Servisu- Komphnia pengecooran ½ ba

Sloof, no hatama rai hodi ateru

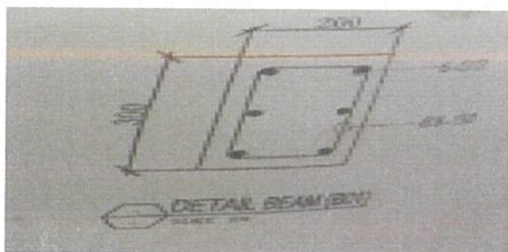

Sloof B1

Beton $V = 3.97 \text{ m}^3$

Bekisnting $A = 26.23 \text{ m}^2$

Sloof B2

Beton $V = 0.51 \text{ m}^3$

Bekisting $A = 4.55 \text{ m}^2$





#ANEXU C2 (TL-7)

PROJECT OWNER : NEW CONSTRUCTION OF HEALTH POST AND DOCTOR HOUSE BUILDING
LOCATION : BEISEUK (NIQUER), TILOMAR, COVALIMA MUNICIPALY, TIMOR-LESTE
PROJECT OWNER : MINISTRY OF HEALTH

SUMMARY

CONTRACT AMOUNT				PREVIOUS PROGRESS		THIS PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
NO	WORK DESCRIPTION	AMOUNT	PERSENTASE	AMOUNT	PERSENTASE	AMOUNT	PERSENTASE	AMOUNT	PERSENTASE
A	HEALTH POST (POSTO DE SAUDE)	\$ 127,444.94	43.09%	\$ 5,946.12	2.01%	\$ 8,311.03	2.81%	\$ 14,257.14	4.82%
1	PREPARATION WORKS	\$ 5,594.44	1.89%	\$ 3,579.44	1.21%	\$ 320.00	0.11%	\$ 3,899.44	1.32%
2	FUNDATION WORKS	\$ 4,739.53	1.60%	\$ 159.73	0.05%	\$ 4,677.54	1.58%	\$ 4,837.27	1.64%
3	CONCRETE WORKS	\$ 16,133.08	5.45%	\$ 2,206.94	0.75%	\$ 3,313.49	1.12%	\$ 5,520.42	1.87%
4	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 17,701.08	5.98%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
5	CARPENTER WORKS	\$ 16,350.00	5.53%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
6	ROOFING WORKS	\$ 16,572.54	5.60%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
7	CEILING WORKS	\$ 5,125.98	1.73%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
8	FLOOR TILE WORKS	\$ 5,913.84	2.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
9	ELECTRICAL WORKS	\$ 9,637.63	3.26%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
10	SANITASI WORKS	\$ 8,058.40	2.72%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
11	PAINTING WORKS	\$ 3,418.51	1.16%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
12	APRON & DRAINAGE WORKS	\$ 2,039.13	0.69%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
13	TOWER WORKS	\$ 9,460.78	3.20%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
14	PROVISIONAL SUM FOR FURNITURE	\$ 6,500.00	2.20%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
15	FINAL CLEANING	\$ 200.00	0.07%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
B	DOCTOR HOUSE (RESIDENCIA PROFESIONAL DE SAUDE) 2 UNIT	\$ 100,426.27	33.95%	\$ 10,052.46	3.40%	\$ 11,705.00	3.96%	\$ 21,757.46	7.36%
1	PREPARATION WORKS	\$ 1,101.90	0.37%	\$ 1,101.90	0.37%	\$ -	0.00%	\$ 1,101.90	0.37%
2	FUNDATION WORKS	\$ 2,315.81	0.78%	\$ 2,253.96	0.76%	\$ 322.50	0.11%	\$ 2,576.46	0.87%
3	CONCRETE WORKS	\$ 6,240.69	2.11%	\$ 1,670.37	0.56%	\$ 2,527.80	0.85%	\$ 4,198.17	1.42%
4	WALL INSTALLATION AND PLESTERING	\$ 6,283.64	2.12%	\$ -	0.00%	\$ 3,002.20	1.01%	\$ 3,002.20	1.01%
5	STAIN WORKS	\$ 203.92	0.07%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
6	CARPENTER WORKS	\$ 7,000.00	2.37%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
7	ROOFING WORKS	\$ 6,899.70	2.33%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
8	CEILING WORKS	\$ 2,307.80	0.78%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
9	TILE WORKS	\$ 2,493.09	0.84%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
10	ELECTRICAL WORKS	\$ 5,240.75	1.77%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
11	SANITASI WORKS	\$ 4,611.40	1.56%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
12	PAINTING WORKS	\$ 1,264.46	0.43%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
13	PROVISIONAL SUM FOR FURNITURE	\$ 4,000.00	1.35%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
14	FINAL CLEANING	\$ 250.00	0.08%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	TOTAL BUILDING B	\$ 100,426.27	33.95%	\$ 10,052.46	3.40%	\$ 11,705.00	3.96%	\$ 21,757.46	7.36%
C	PROVISIONAL SUM FOR EXTERNAL WORKS	\$ 27,250.00	9.21%	\$ 15,148.96	5.12%	\$ -	0.00%	\$ 15,148.96	5.12%



#ANEXU C2 (TL-7)

PROJECT OWNER : NEW CONSTRUCTION OF HEALTH POST AND DOCTOR HOUSE BUILDING
LOCATION : BEISEUK (NIQUER), TILOMAR, COVALIMA MUNICIPALY, TIMOR-LESTE
PROJECT OWNER : MINISTRY OF HEALTH

SUMMARY

CONTRACT AMOUNT				PREVIOUS PROGRESS		THIS PROGRESS		UP TO DATE PROGRESS	
NO	WORK DESCRIPTION	AMOUNT	PERSentase	AMOUNT	PERSentase	AMOUNT	PERSentase	AMOUNT	PERSentase
I	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 255,121.21	86.25%	\$ 31,147.53	10.53%	\$ 20,016.03	6.77%	\$ 51,163.56	17.30%
II	CONTRACTOR FEE (10% X I)	\$ 25,512.12	8.63%	\$ 3,114.75	1.05%	\$ 2,001.60	0.68%	\$ 5,116.36	1.73%
III	OVERHEAD	\$ 4,350.00	1.47%	\$ 1,087.50	0.37%	\$ -	0.00%	\$ 1,087.50	0.37%
IV	TAX (2% X (I+II+III))	\$ 5,699.67	1.93%	\$ 707.00	0.24%	\$ 440.35	0.15%	\$ 1,147.35	0.39%
V	CONTINGENCY (2% x I)	\$ 5,102.42	1.73%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
VI	GRAND TOTAL	\$ 295,785.42	100.00%	\$ 36,056.78	12.19%	\$ 22,457.98	7.59%	\$ 58,514.76	19.78%

PREPARED BY

(MADELINO D J MAGNO) (PREZENZIO L C D XIMENES)
Eng. EPAS- ADN, I.P. Municipio Covalima, ADN, I.P.

VERIFIED BY

(ARC FRANCISCO X D D JERONIMO)
Engenheiro Senior ba Edificio Publiko Agua no Saneamento ADN, I.P.

CERTIFIED BY

(ENG. EMERENCIANANA DA COSTA MAIA FREITAS)
Coordenadora da unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade ADN, I.P.

#ANEXU D (TL-7)

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE <				
---	--	--	--	--



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (MA-1)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to
Aldeia iha Roads Covalima Municipality
No. kontratu : SSS/135/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 24/01/2022

Fatin Inspesaun : Maucatar – Ila Leogore

Koordinadas :


Start Point : Long : -9.239134124156536, Latetude: 125.22076014429331

End Point : Long : -9.24123517045176, Latetude: 125.26187103241682

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins
2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Sketch & Foto Desenho


Gabion box nebe'e instala ona, seidauk iha dezenho tekniku ida nebe'e aprova husi dono projectu.



Gabion Box 1 x 1 x 2

$$L = 46 \text{ m} = Q_{\text{ty}} = 46 \times 9 = 414 \text{ m}^3$$

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

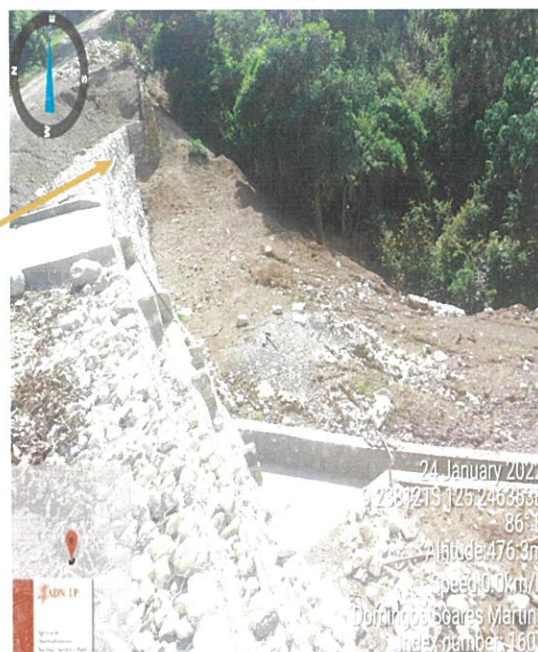



ANEXU C1 (MA-1)


Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to
Aldeia iha Roads Covalima Municipality
No. kontratu : SSS/135/MOPTC-2016

Sketch & Foto Desenho

Bak penampun sendimentasi nebe'e halo iha tereno seidak iha dezenho detailho husi dono projecto no kompanhia implementa ona iha tereno , bak penampun sedimentasaun nian seidak bele rejolve udan been nebe'e liu husi drainagen ba bak sendimentasaun laran tamba seidak hatur gorog-gorong ka deker hodi nune'e udan ben bele liu ba Estrada sorin, maibe kondisaun actual iha tereno udan ben liu husi estrada leten parte drift nian, maibe elevasaun drif nian as oitoan husi bak sndimentasaun nian, tamba ne be susar atu liu ba Estrada sorin.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

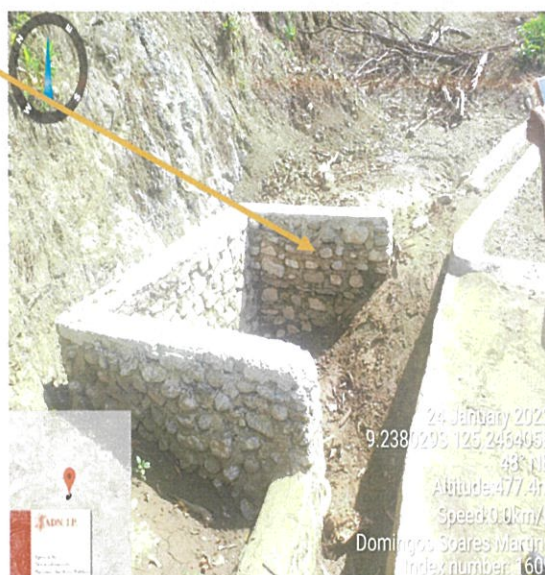

Sendimentasaun nakonu ona iha drainagen laran no bak kontrola nian.

Sketch & Foto Desenho

Drainagen remata ona 100% iha tereno

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C2 (MA-1)

Naran Projeito : Rehabilitasaun Estrada Aldeia Leogore - Ila
Section : 0 + 000 - 5 + 400 km
Contraktor : Maun Alin Suai Unip. Lda

SUMMARY														
Original Contract			Revised Contract I	A D N Backup										Remarks
Item No	Item Description	Amount US \$	Amount US \$	Halo ona rekomendasaun pagamentu		Seidauk halo rekomendasaun pagamentu						To date	Persent %	
				Previous		Fulan Kotuk		Fulan ida ne'e		This Periode				
				Amount	Persent %	Amount	Persent %	Amount	Persent %	Amount	Persent %	Amount	Persent %	
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00	\$ 21,600.00	2.26%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 21,600.00	2.26%	Quantidade no motante osan nebe'e mensiona iha backup data this billing nian seidauk iha aprovasaun variation no.2 husi dono projectu. Tamba ne'e progressu fisiku ba this billing nian nebe'e iha seidauk bele konsidera ba prosesu pagamentu.
200	EARTH WORKS	\$ 128,874.74	\$ 195,323.55	\$ 137,176.03	14.35%	\$ 2,567.40	0.27%	\$ -	0.00%	\$ 2,567.40	0.27%	\$ 139,743.43	14.62%	
300	SUB BASE AND BASE COURSE	\$ 74,353.93	\$ 75,880.80	\$ 75,880.80	7.94%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 75,880.80	7.94%	
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 41,297.94	\$ 41,297.94	\$ 30,973.45	3.24%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 30,973.45	3.24%	
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 580,028.85	\$ 515,700.41	\$ 489,568.50	51.22%	\$ 60,152.40	6.29%	\$ 15,493.80	1.62%	\$ 75,646.20	7.92%	\$ 565,214.70	59.14%	
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 3,647.25	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	TOTAL	\$ 851,802.69	\$ 851,802.69	\$ 755,198.78	79.02%	\$ 62,719.80	6.56%	\$ 15,493.80	1.62%	\$ 78,213.60	8.18%	\$ 833,412.38	87.20%	
B	PROFIT AND OVER HEAD (10%)*A	\$ 85,180.27	\$ 85,180.27	\$ 75,519.88	7.90%	\$ 6,271.98	0.66%	\$ 1,549.38	0.16%	\$ 7,821.36	0.82%	\$ 83,341.24	8.72%	
C	TAX 2 % OF ITEM (A+B)	\$ 18,739.66	\$ 18,739.66	\$ 16,614.37	1.74%	\$ 1,379.84	0.14%	\$ 340.86	0.04%	\$ 1,720.70	0.18%	\$ 18,335.07	1.92%	
D	TOTAL (A+B+C)	\$ 955,722.62	\$ 955,722.62	\$ 847,333.03	88.66%	\$ 70,371.61	7.36%	\$ 17,384.04	1.82%	\$ 87,755.66	9.18%	\$ 935,088.69	97.84%	

Prepara Husi :


I. Eng. Domingos Soares Martins


II. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Engenheiro ba Projecto Infrastructura, Transportes e Irigasaun Municipiu
Covalima A D N, I.P.

Verifika Husi:


Eng. Aniceto da Costa

Engenheiro Senior ba Projecto Infrastructura, Transportes e Irigasaun A D N, I.P.

Sertifika Husi :


Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade A D N, I.P.

ANEXU D (MA-1)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Naran projeto : Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to Aldeia iha Roads Covalima Municipality							
Kompanha : Maun Alin Suai Unip Lda							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	11/24/2021	Maucatar	Eng. Bosco Dinis de Sousa	Engineiru Munisipiu	1	La Priense livru vizita tamba kompanhia la rai livro vizita nian iha tereno.	
					2	Iha observasaun ba projectu nebe'e implemta ona husi kompanhia finaliza ona 100% iha tereno	
					3	Bak kontrola nebe'e instala ona iha tereno seidak bele rezolve problema udan ben nian nebe'e liu husi drainagen laran.	
			4				
			5				
			6				
II							



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ZU-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima
No. kontratu : SSS/227/MOPTC-2016

Data Inspesaun : 20/01/2022

Fatin Inspesaun : Zumalai Villa

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.158486, Latetude: 125.450154

End Point : Long : -9.177609, Latetude: 125.469369

Naran Inspector : 1. Eng.Domingos Soares Martins

2. Eng.Bosco Dinis de Sousa

Informasaun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Estrada ligasaun Harekain ba Zumalai Villa





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ZU-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km
00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima
No. kontratu : SSS/227/MOPTC-2016

Informasaun

Estrada ne'e nia luan 6 m, uja Asfalt Hot
Roll Sheet, (HRS) 50mm thk no Pavement
Markings (Reflective)

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Informasaun

Drainagen uja Tipo material Stone Masonry

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C2 (ZU-3)

PROJECT TITLE : Upgrading Of Cassa - Zumalai Road Jct. Zumalai - Harekain Road
STA : 0 + 000 To 4+000 KM
CONTRACT NO : SSS / 227/ MPOTC-2016
COMPANY : Clardel Enterprise UNIP. Lda

SUMARRY									
	DESCRIPTION	CONTRACT	ADN Inspection						Remarks
PAY		AMOUNT	AMOUNT (\$)					PERCENT %	
ITEM			PREVIUS	PERCENT %	THIS BILLING	PERCENT %	UP TO DATE		
I	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 55,310.11	\$ 38,535.11	1.27%	\$ -	0.00%	\$ 38,535.11	1.27%	
II	EARTHWORKS	\$ 219,036.76	\$ 219,036.76	7.24%	\$ -	0.00%	\$ 219,036.76	7.24%	
III	SUBBASE AND BASE COURSE	\$ 613,148.65	\$ 517,382.59	17.10%	\$ -	0.00%	\$ 517,382.59	17.10%	
IV	SURFACE COURSE	\$ 958,106.54	\$ 838,309.98	27.70%	\$ -	0.00%	\$ 838,309.98	27.70%	
V	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 254,932.15	\$ 75,049.25	2.48%	\$ -	0.00%	\$ 75,049.25	2.48%	
VI	DRAINAGE & SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 555,182.42	\$ 170,125.67	5.62%	\$ -	0.00%	\$ 170,125.67	5.62%	
VII	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 41,531.63	\$ 88.60	0.00%	\$ 40,053.63	1.32%	\$ 40,142.23	1.33%	
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 2,697,248.26	\$ 1,858,527.95	61.41%	\$ 40,053.63	1.32%	\$ 1,898,581.58	62.74%	
B	CONTRACTOR FEE AND OVERHEAD (10% X A)	\$ 269,724.83	\$ 185,852.80	6.14%	\$ 4,005.36	0.13%	\$ 189,858.16	6.27%	
C	TAX (2% A+B)	59339.46172	\$ 40,887.61	1.35%	\$ 881.18	0.03%	\$ 41,768.79	1.38%	
D	TOTAL (A + B + C)	\$ 3,026,312.56	\$ 2,085,268.36	68.90%	\$ 44,940.17	1.48%	\$ 2,130,208.54	70.39%	

Inspeksaun Husi :

I. Eng. Domingos Soares Martins

II. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Engenheiro ba Projecto Infrastructura, Transportes e Irigasaun

Munisipiu Covalima A D N, I.P.

Verifika Husi:

Eng. Aniceto da Costa

Engenheiro Senior ba Projecto
Infrastructura, Transportes e Irigasaun A D N, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas

Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da
Qualidade A D N, I.P.



ANEXU C1 (ZU-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction (0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima
No. kontratu : SSS/050/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 20/01/2022

Fatin Inspesaun : Zumalai - Covalima

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.2164781, Latetude: 125.39185429

End Point : Long : -9.19277947, Latetude: 125.42564747

Naran Inspector : **1. Domingos Soares Martins**
2. Bosco Dinis de Sousa

Assunto : Informasaun ba Projecto tama ona ba fase retensaun 10%

1. Projecto refere agora tama ona ba fase retensaun
2. Geralmente Kondisaun actual iha tereno diak hela

Informasaun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Estrada Liga Entre Zumalai – Suai Villa, item
Reflectorized Thermoplastic Pavement
Markings, iha tereno atinge ona 100% ho
kondisaun diak no la iha defeitus





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ZU-4)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction (0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima
No. kontratu : SSS/050/MOPTC-2017

Informasaun

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Item servisu stone Masonry wall no drainagen iha tereno atinge ona 100%, ho kondisaun diak no la iha defeitus



NB: Projecto ne'e fisicamente iha tereno atinge ona 100%, no kondisaun actual diak hela, halo ona pagamentu 100% ba kompanhia baseia ba monitorizasaun no inspeksaun iha loron 3 de dezembro de 2021.



ANEXU C2 (ZU-4)

Name of Project : Rehabilitation of Haemanu Bridge - Zumalai Jct. Road (10+140 - 15+180 km)
Location of Project : Suai - Timor Leste
Contractor : Star Suai, Lda

SUMMARY													
ORIGINAL CONTRAC			Rivised Contract I	Additional Works II		Rivised Contract II	Resultado Inspeksaun A D N						Remarks
ITEM NO.	ITEM DESCRIPTION	AMOUNT		Increase	Descreease		PREVIOUS PAYMENT		THIS PAYMENT		PAYMENT UP TO DATE	Weight (%)	
			Cost (\$)	Cost (\$)	Cost (\$)	Cost (\$)	Amount (\$)	Weight (%)	Amount (\$)	Weight (%)	Amount (\$)		
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 34,342.40	\$ 34,342.40	\$ -	\$ (5,095.35)	\$ 29,247.05	\$ 25,623.30	0.74%	\$ 3,623.75	0.10%	\$ 29,247.05	0.84%	
200	EARTHWORKS	\$ 457,757.01	\$ 422,927.52	\$ 93,257.39	\$ (2,771.60)	\$ 513,413.31	\$ 513,411.49	14.83%	\$ -	0.00%	\$ 513,411.49	14.83%	
300	SUBBASE AND BASE COURSE	\$ 723,314.68	\$ 787,299.01	\$ -	\$ (70,816.82)	\$ 716,482.19	\$ 716,482.18	20.70%	\$ -	0.00%	\$ 716,482.18	20.70%	
400	SURFACE COURSE AND PAVEMENT	\$ 1,131,512.87	\$ 1,128,721.29	\$ 15,235.44	\$ (17,673.75)	\$ 1,126,282.99	\$ 1,027,851.74	29.69%	\$ 82,309.71	2.38%	\$ 1,110,161.45	32.07%	
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 66,323.39	\$ 43,379.38	\$ 56,138.77	\$ -	\$ 99,518.15	\$ 99,518.15	2.87%	\$ -	0.00%	\$ 99,518.15	2.87%	
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION WORKS	\$ 611,661.26	\$ 608,241.98	\$ 3,232.98	\$ (58,081.29)	\$ 553,393.68	\$ 545,441.21	15.76%	\$ 7,949.30	0.23%	\$ 553,390.51	15.99%	
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 60,390.00	\$ 60,390.00	\$ 2,810.03	\$ (16,235.80)	\$ 46,964.23	\$ 1,832.63	0.05%	\$ 44,520.73	1.29%	\$ 46,353.35	1.34%	
A	TOTAL CONSTRUCTION COST	\$ 3,085,301.60	\$ 3,085,301.60	\$ 170,674.61	\$ (170,674.61)	\$ 3,085,301.60	\$ 2,930,160.71	84.64%	\$ 138,403.48	4.00%	\$ 3,068,564.19	88.64%	
B	CONTRACTOR FEE AND OVERHEAD (10% X A)	\$ 308,530.16	\$ 308,530.16	\$ 17,067.46	\$ (17,067.46)	\$ 308,530.16	\$ 293,016.07	8.46%	\$ 13,840.35	0.40%	\$ 306,856.42	8.86%	
C	TAX (2% A+B)	\$ 67,876.64	\$ 67,876.64	\$ 3,754.84	\$ (3,754.84)	\$ 67,876.64	\$ 64,463.54	1.86%	\$ 3,044.88	0.09%	\$ 67,508.41	1.95%	
D	GRAND TOTAL (D + E)	\$ 3,461,708.40	\$ 3,461,708.40	\$ 191,496.91	\$ (191,496.91)	\$ 3,461,708.40	\$ 3,287,640.31	94.97%	\$ 155,288.71	4.49%	\$ 3,442,929.02	99.46%	

Prepara Husi :

I. Eng. Domingos Soares Martins
Engenheiro ba Projecto Infrastructura, Transportes e Irigasaun Munisipiu Covalima A D N, I.P.

II. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Verifika Husi:

Eng. Aniceto da Costa
Engenheiro Senior ba Projecto Infrastructura, Transportes e Irigasaun A D

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade A D N, I.P.

ANEXU D (ZU-4)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN Naran projeto : Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction (0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima Kompanha : Star Suai, Lda		
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
II	16/11/2021	Covalima/Zumalai	Domingos Soares Martins	Engineiro Municipio Covalima	1	Progressu fisiku iha tereno 100% ona, maibe kuantidade 2875 m2 seidauk hatama iha backup data tamba resultado teste husi Lab nian seidauk fo sai	
					2	Konstrusaun estrada refere actual diak hela no hein prosesu husu pagamentu nian husi kompanhia ba dono projetu	
	16/11/2021	Covalima/Zumalai	Bosco Dinis de Sousa	Engineiro Municipio Covalima	3		
					4		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ZU-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of be'e mean roads
No. kontratu : SSS/049/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 20 / 01 / 2022

Fatin Inspesaun : Zumalai – Be'e Mean

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.08912877432965, Latetude: 125.388369709253

End Point : Long : -9.09257813782961, Latetude: 125.390407182276

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins

2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Informasaun	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Kondisaun estruturas em geral diak hela no kontrusaun refere halo ona termo entrega provozorio badono projecto iha tinan 2020	



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ZU-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of be'e mean roads
No. kontratu : SSS/049/MOPTC-2017

Informasaun

- ✓ Konstrusaun 'Structural Concrete for box control (21 MPa), diak hela.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Informasaun

Asfalt, Stone Masonry wall iha tereno diak hela

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ZU-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of be'e mean roads
No. kontratu : SSS/049/MOPTC-2017

Informasaun

Bio Engineering
Vertiver Grass iha tereno moris ho diak
Iha parte karuk no los. Husi parte karuk $80 \times 12 \text{ m} = 960\text{m}^2$ no parte los $30 \times 9 = 270\text{m}^2$

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Informasaun

Bio Engineering
Ai Alu maka moris barak liu iha tereno iha
parte area karuk no los nian.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (ZU-5)


Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of be'e mean roads
No. kontratu : SSS/049/MOPTC-2017

Informasaun

Bio Engineering
Ai naá, ai mahonik, ai fauk nebeé kuda iha
tinan kotuk ate agora seidauk moris ho diak
iha tereno.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

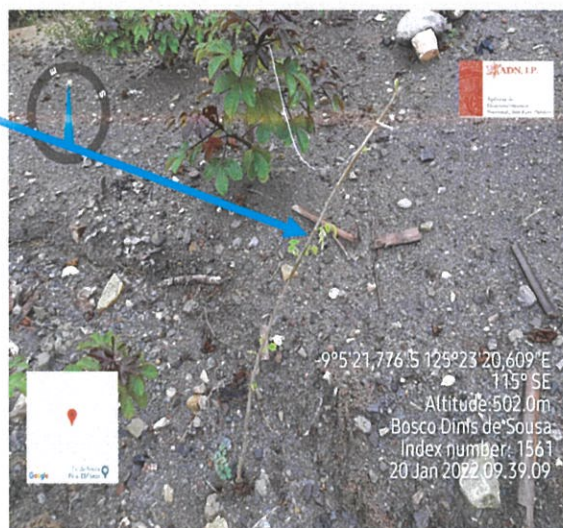

Informasaun

Bio Engineering
Ai kaisoti inklui ai horis seluk hamutuk hun
27 maka moris iha tereno.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C2 (ZU-5)

Name Of Project : CONSTRUCTION OF ZUMALAI BE'E MEAN ROADS
Location Of Project : Be'e Mean
Contractor Name : Roman Junior Unip.Lda

SUMMARY													
ORIGINAL CONTRAC			Variation Order I	Variation Contract II		Revised Contract II						PERCENT (%)	Remarks
PAY ITEM	DESCRIPTION	CONTRACT AMOUNT		Increase (+)	Descrease (-)		Amount (\$)						
		ORIGINAL		AMOUNT (\$)	Cost (\$)		Cost (\$)	Cost (\$)	PREVIOUS	PERCENT (%)	THIS BILLING		
100	GENERAL REQUIREMENTS	\$ 88,005.00	\$ 88,005.00	\$ -	\$ -	\$ 88,005.00	\$ 49,002.50	1.23%	\$ 39,002.50	0.98%	\$ 88,005.00	2.21%	
200	EARTHWORKS	\$ 341,765.54	\$ 361,170.10	\$ 74,898.75	\$ (35,271.58)	\$ 400,797.26	\$ 400,797.26	10.05%	\$ -	0.00%	\$ 400,797.26	10.05%	
300	SURFACE COURSE	\$ 25,782.40	\$ 62,931.26	\$ 175.04	\$ (17,364.02)	\$ 45,742.28	\$ 45,742.28	1.15%	\$ -	0.00%	\$ 45,742.28	1.15%	
400	SURFACE COURSE	\$ 63,808.97	\$ 107,199.06	\$ 711.26	\$ -	\$ 107,910.32	\$ 107,910.32	2.71%	\$ -	0.00%	\$ 107,910.32	2.71%	
500	BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 2,092,386.56	\$ 2,353,483.93	\$ 24,950.39	\$ (109,693.16)	\$ 2,268,741.16	\$ 2,268,741.16	56.92%	\$ -	0.00%	\$ 2,268,741.16	56.92%	
600	DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUCTURES	\$ 512,415.67	\$ 454,628.71	\$ -	\$ (6,198.84)	\$ 448,429.87	\$ 448,429.87	11.25%	\$ -	0.00%	\$ 448,429.87	11.25%	
700	MISCELLANEOUS STRUCTURES	\$ 31,547.95	\$ 31,547.95	\$ -	\$ (9,256.70)	\$ 22,291.25	\$ 22,291.25	0.56%	\$ -	0.00%	\$ 22,291.25	0.56%	
800	BIOENGINEERING	\$ 93,727.07	\$ 93,727.07	\$ 9,419.17	\$ (24,768.81)	\$ 78,377.43	\$ 5,899.27	0.15%	\$ 1,350.29	0.03%	\$ 7,249.56	0.18%	
A	TOTAL CONSTSTRUCTION COST	\$ 3,249,439.15	\$ 3,552,693.07	\$ 110,154.61	\$ (202,553.11)	\$ 3,460,294.57	\$ 3,348,813.92	84.01%	\$ 40,352.79	1.01%	\$ 3,389,166.70	85.02%	
B	PROFIT AND OVERHEAD (10% x A)	\$ 324,943.92	\$ 355,269.31	\$ 11,015.46	\$ (20,255.31)	\$ 346,029.46	\$ 334,881.39	8.40%	\$ 4,035.28	0.10%	\$ 338,916.67	8.50%	
C	TAX (2% x (A+B))	\$ 71,487.66	\$ 78,159.25	\$ 2,423.40	\$ (4,456.17)	\$ 76,126.48	\$ 73,673.91	1.85%	\$ 887.76	0.02%	\$ 74,561.67	1.87%	
D	TOTAL (A + B + C)	\$ 3,645,870.73	\$ 3,986,121.62	\$ 123,593.48	\$ (227,264.59)	\$ 3,882,450.51	\$ 3,757,369.21	94.26%	\$ 45,275.83	1.14%	\$ 3,802,645.04	95.40%	

Prepara Husi :

I. Eng. Domingos Soares Martins

Engenheiro ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun Munisipiu Covalima ADN, I.P.

II. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Verifika Husi:

Eng. Aniceto da Costa

Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun A D N, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas

Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade A D N, I.P.

ANEXU D (ZU-5)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN		
Naran projeto : Rehabilitation of be'e mean roads							
Kompanha : Roman Junior Unipessoal, Lda							
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	20 de Janeiro de 2022	Zumalai	Eng.Domingos Soares Martins	Engineiru Munisipiu	1	Projectu ne'e geralmente fisiku atinge ona 100% iha tinan 2020	
					2	kondisaun aktual iha tereno ba konstrusaun fisiku estruktural nian diak hela	
					3	Item Bio Engineering iha tereno aihoris nebeé kuda balun seidauk moris ho diak.	
					4		
	20 de Janeiro de 2022	Zumalai	Eng. Bosco Dinis de Sousa	Engineiru Munisipiu	5		
					6		
					7		
					8		
III					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
V					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

#ANEXU C1 (ZU-6)

Back-up Data

Naran Projeto : Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai
No. kontratu : 002/NC-ZC/VII/2015

Data Inspesaun : 20-01-2021

Fatin Inspesaun : Zumalain Covalima

Koordinadas :



Start Point : Long : -9.157194 Latetude: 125.449596

Naran Inspector : 1. Madelino D J Magno
2. Prezezio L C D Ximenes

Informsaun Husi Terreno

Projeto ida ne Remata ona, no balansu osan
resto, owner seidauk apresenta relatorio mai
ADN

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

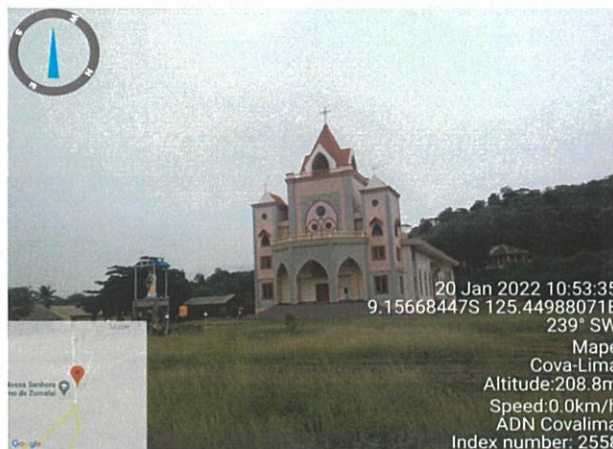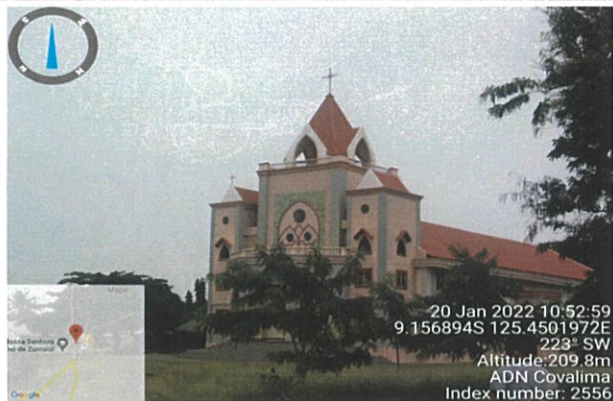



#ANEXU C2 (ZU -6)

PROJECT OWNER : DIOCESE DE MALIANA, PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO MONTECARMELO, ZUMALAI, SUAI, TIMOR - LESTE
PROJECT NAME : CONSTRUCTION OF ZUMALAI CHURCH
LOCATION : ZUMALAI, COVALIMA - TIMOR LESTE
CONTRACTOR : AITULA CONSTRUCTION & ELECTRICAL, LDA

SUMMARY										
ORIGINAL CONTRAC					WORKS PERFORMED					
ITEM NO	DESCRIPTION	ORIGINAL	REVISED	TOTAL	UP TO DATE BILLING		THIS BILLING		UP TO DATE BILLING	
					AMOUNT (\$)	WEIGHT (%)	AMOUNT (\$)	WEIGHT (%)	AMOUNT (\$)	WEIGHT (%)
I	PRELIMINARIES WORKS	\$ 13,350.00	\$ -	\$ 13,350.00	\$ 9,125.00	0.76%		0.00%	\$ 9,125.00	0.76%
II	EART WORKS	\$ 27,314.82	\$ -	\$ 27,314.82	\$ 27,314.81	2.28%		0.00%	\$ 27,314.81	2.28%
III	STONE WORKS	\$ 28,619.19	\$ -	\$ 28,619.19	\$ 28,619.19	2.39%		0.00%	\$ 28,619.19	2.39%
IV	CONCRETE WORKS	\$ 476,528.45	\$ -	\$ 476,528.45	\$ 476,528.45	39.82%		0.00%	\$ 476,528.45	39.82%
V	WALL,FLOOR CERAMICS,ORNAMENT WORKS	\$ 224,068.86	\$ -	\$ 224,068.86	\$ 214,068.86	17.89%		0.00%	\$ 214,068.86	17.89%
VI	FRAME,DOORS & WINDOWS	\$ 49,559.31	\$ -	\$ 49,559.31	\$ 23,094.19	1.93%		0.00%	\$ 23,094.19	1.93%
VII	FROOFING & CEILING WORKS	\$ 130,226.95	\$ -	\$ 130,226.95	\$ 130,226.95	10.88%		0.00%	\$ 130,226.95	10.88%
VIII	FINISHING	\$ 9,637.12	\$ -	\$ 9,637.12	\$ 9,637.12	0.81%		0.00%	\$ 9,637.12	0.81%
IX	MECHANICAL & ELECTRICAL	\$ 102,435.92	\$ -	\$ 102,435.92	\$ 13,520.31	1.13%		0.00%	\$ 13,520.31	1.13%
X	EXTERIOR & OTHERS WORKS	\$ 26,132.65	\$ -	\$ 26,132.65	\$ 19,099.55	1.60%		0.00%	\$ 19,099.55	1.60%
A	Total Construction Cost	\$ 1,087,873.26		\$ 1,087,873.26	\$ 951,234.44	79.49%	\$ -	0.00%	\$ 951,234.44	79.49%
B	CONTRACTORS FEE AND OVERHEAD = A x 10%	\$ 108,787.33	\$ -	\$ 108,787.33	\$ 95,123.44	7.95%	\$ -	0.00%	\$ 95,123.44	7.95%
C	GRAND TOTAL	\$ 1,196,660.59	\$ -	\$ 1,196,660.59	\$ 1,046,357.88	87.44%	\$ -	0.00%	\$ 1,046,357.88	87.44%

PREPARED BY

() ()
Eng. EPAS- ADN, I.P. Municipio Covalima, ADN,I.P.

VERIFIED BY

()
(ARC FRANCISCO X D D JERONIM
Engenheiro Senior ba Edificio Publiko Agua no
Saneamento ADN, I.P.

CERTIFIED BY

()
(ENG. EMERENCIANA DA COSTA MAIA FREITAS)
Coordenadora da unidade de Controloe Validasaun de
Qualidade ADN, I.P.

#ANEXU D (ZU-6)

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL					 ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público					INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	
Naran projeto : Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai											
Kompanha : Aitula Construction, Lda											
No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN			Asinatura		
I	20/01/2021	Covalima/ Zumalain	Madelino D J Magno	Tekniko Municipio	1	Projeto ida ne fisikamante remata ona					
					2	Husu ba Dono de Projeto atu apresenta relatorio final.					
	20/01/2021	Covalima/ Zumalain	Prezenzio L C D X	Tekniko Municipio	3	Projeto refere remata ona husu ba dono de projeto atu submete pedido pagamento final					
					4						
					5						
II											
III											
IV											
V											



ANEXU C1 (ZU-9)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai Road Section 8
: Zulo - Jct Zumalai (30+100 - 35+120 km) Municipality Covalima
No. kontratu : SSS/067/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 26-01-2022

Fatin Inspesaun : Zumalai - Zulo

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.13517812863851, Latetude: 125.43390087783337


End Point : Long : -9.158220932745419, Latetude: 125.45011013746262

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins

2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Skecha Item Servisu

Item Servisu 604 Stone Pitching 200mm



Sta. 34 + 818 - 34+997) Qty = 125.37 Cu.m

Sta. 34 + 782 - 34 + 870 Qty = 65.71 Cu.m

Sta. 34 + 780 Qty = 29.80 Cu.m

Total Qty = 216.26 Cu.m

Husi kuantidade nebeé iha rekomena deit =
105.28 cu.m tamba kuantidade balun seidaui
iha aprovasaun revizaun kuantidade ou CCO

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Projecto ba Stone Pitching kuantidade iha tereno
liu ona original contracto, no seidaui hetan
aprovasaun husi projecto nain.




ANEXU C1 (ZU-9)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai Road Section 8
: Zulo - Jct Zumalai (30+100 - 35+120 km) Municipality Covalima
No. kontratu : SSS/067/MOPTC-2017


Skecha Item Servisu

Item Servisu 606 Stone Mansonry retaining wall
and line drain including bed wall of RCG



Sta. 33 + 723, Qty = 50 m3

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

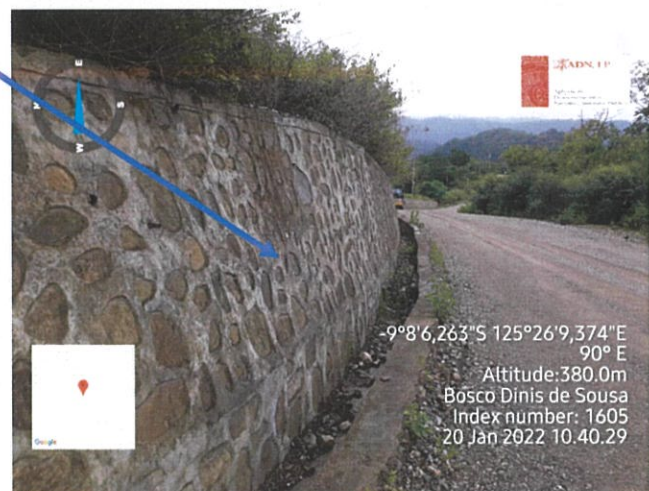

Skecha Item Servisu

Item Servisu Sub-Base Course

Item servisu Sub-Base ho luan 8m no mahar
24cm atinge ona 100% iha tereno, maibe iha
parte suvida nian mak sei hadia hela husi
kompanhia tamba hetan estragus husi tempo
udan. Nomos inklui ona servisu ba item Base-
course nian iha tereno ba area nebeé nesessario
atu halo.





ANEXU C2 (ZU-9)

PROJECT NAME : Rehabilitation of Roads A12 JTC A12 Maliana -JCT A02 Zumalai Road Section 8 : Zulo - JCT Zumalai (30+100 - 35+120 Km) Municipio Covalima
CONTRACTOR : OCÓGONO CONSTRUÇÃO, LDA.

SUMMARY																
Orginal Contrack			MOP Beck Up Data			A D N.I.P. BackUp Data										Remarks
ITEM	DESCRIPTION	ORIGINAL AMOUNT	PREVIOUS	THISBILLING	TOTAL TO DATE	Halo ona rekomendasaun		Seidauk halo rekomendasaun pagamentu						Total to Date		
						PREVIOUS BILLING		Fulan Kotuk		Fulan ida ne'e		THIS BILLING				
			AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	Percent %	AMOUNT	Percent %	AMOUNT	Percent %	AMOUNT	Percent %	AMOUNT	Percent %	
1	SECTION 100 - GENERAL REQUIREMENT	\$ 26,017.57	\$ 12,129.24	\$ 3,142.88	\$ 15,272.13	\$ 12,129.24	0.32%	\$ 1,016.23	0.03%	\$ 1,753.72	0.05%	\$ 2,769.95	0.07%	\$ 14,899.19	0.40%	
2	SECTION 200 - EARTHWORK	\$ 791,230.01	\$ 723,591.03	\$ 2,481.78	\$ 726,072.81	\$ 723,591.03	19.30%	\$ 19,382.25	0.52%	\$ (17,568.98)	-0.47%	\$ 1,813.27	0.05%	\$ 725,404.30	19.35%	
3	SECTION 300 - SUBBASE AND BASE COURSE	\$ 524,140.65	\$ 62,150.40	\$ 150,844.20	\$ 212,994.60	\$ 62,150.40	1.66%	\$ 151,006.05	4.03%	\$ (11,167.65)	-0.30%	\$ 139,838.40	3.73%	\$ 201,988.80	5.39%	
4	SECTION 400 - SURFACE COURSES	\$ 1,181,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
5	SECTION 500 - BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 12,928.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
6	SECTION 600 - DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUTURES	\$ 700,042.92	\$ 351,297.52	\$ 24,369.29	\$ 375,666.82	\$ 351,297.52	9.37%	\$ 72,280.95	1.93%	\$ (54,630.27)	-1.46%	\$ 17,650.68	0.47%	\$ 368,948.21	9.84%	
7	SECTION 700 - MISCELLANEUOS STRUTURES	\$ 104,638.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
8	SECTION 800 - BIOENGGINERRING	\$ 473.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	Total As Built (A)	\$ 3,341,279.64	\$ 1,149,168.20	\$ 180,838.15	\$ 1,330,006.35	\$ 1,149,168.20	30.65%	\$ 243,685.48	6.50%	\$ -81,613.18	-2.18%	\$ 162,072.30	4.32%	\$ 1,311,240.50	34.98%	
B	Profit and Overhead (10% of A)	\$ 334,127.96	\$ 114,916.82	\$ -	\$ 133,000.63	\$ 114,916.82	3.07%	\$ 24,368.55	0.65%	\$ -8,161.32	-0.22%	\$ 16,207.23	0.43%	\$ 131,124.05	3.50%	
C	Tax (2% of (A + B))	\$ 73,508.15	\$ 25,281.70	\$ -	\$ 29,260.14	\$ 25,281.70	0.67%	\$ 5,361.08	0.14%	\$ -1,795.49	-0.05%	\$ 3,565.59	0.10%	\$ 28,847.29	0.77%	
D	Grand Total (A + B + C)	\$ 3,748,915.76	\$ 1,289,366.72	\$ 180,838.15	\$ 1,492,267.12	\$ 1,289,366.72	34.39%	\$ 273,415.11	7.29%	\$ -91,569.99	-2.44%	\$ 181,845.12	4.85%	\$ 1,471,211.84	39.24%	

Prepara Husi :

I. Eng. Domingos Soares Martins

II. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Engenheiro ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun Munisipiu Covalima A D N, I.P.

Verifika Husi:

Eng. Aniceto da Costa

Engenheiro Senior ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun A D N, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas

Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade A D N, I.P.



ANEXU C1 (ZU-10)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50+900 km), Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai (35+120) Road Section 7 : Fatulito - Zulo (25+800 - 30+100) Municipality Bobonaro - Covalima

No. kontratu : SSS/065/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 20-01-2022

Fatin Inspesaun : Covalima - Zumalai

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.108627052, Latetude: 125.4078439

End Point : Long : -9.135178129, Latetude: 125.4339009

Naran Inspector : **1. Eng. Domingos Soares Martins**
2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Skecha Item Servisu

Item Servisu 601.3 Pipe Culvert, 1000mm diameter

Sta. 26+766 = 8 lm
Sta. 26+970 = 8 lm
Sta. 27+140 = 8 Lm
Sta. 27+430 = 8 Lm

Qty Total = 32 lm

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ZU-10)


Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50+900 km), Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai (35+120) Road Section 7 : Fatulito - Zulo (25+800 - 30+100) Municipality Bobonaro - Covalima

No. kontratu : SSS/065/MOPTC-2017

Skecha Item Servisu

Item Servisu 606 Stone Mansonry retaining wall and line drain including bed wall of RCPC



Qty = 1730 m3

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Skecha Item Servisu

Item Servisu Sub-Base Course

Item servisu Sub-Base ho luan 8m no mahar 24cm atinge ona 90% iha tereno, maibe iha parte suvida nian mak sei hadia hela husi kompanhia tamba hetan estragus husi tempo udan. Nomos inklui ona servisu ba item Base-course nian iha tereno ba area nebeé nesessario atu halo.





ANEXU C2 (ZU-10)

PROJECT NAME

:

Rehabilitation Of Roads A12 JCT A12 Maliana-JCT A02 Zumalai (50+900Km), Road Section: JCT A16 Uele'o - JCTA02 Zumalai (35+120) Road Section 7 : Fatulito - Zulo (25 + 800 - 30 + 100) Municipality Of Bobonaro - Covalima

CONTRACTOR

:

MARINO ENTERPRISES, Lda.

SUMARRY													
ORIGINAL CONTRAC			A D N.I.P. Backup										Remarks
			Halo ona rekomendasaun pagamentu		Seidauk halo rekomendasaun pagamentu						Up to Date		
ITEM	DESCRIPTION	CONTRACT AMOUNT	Previous Billing		Fulan kotuk		Fulan ida ne'e		This Billing				
		ORIGINAL AMOUNT	AMOUNT	PERCENT (%)	AMOUNT	PERCENT (%)	AMOUNT	PERCENT (%)	AMOUNT	PERCENT (%)	AMOUNT	PERCENT (%)	
1	SECTION 100 - GENERAL REQUIREMENT	\$ 26,017.57	\$ 5,254.95	0.12%	\$ 4,917.18	0.11%	\$ 729.17	0.02%	\$ 5,646.35	0.13%	\$ 10,901.30	0.25%	
2	SECTION 200 - EARTHWORK	\$ 813,314.25	\$ 714,388.22	16.56%	\$ 23,021.54	0.53%	\$ (10,383.23)	-0.24%	\$ 12,638.31	0.29%	\$ 727,026.53	16.85%	
3	SECTION 300 - SUBBASE AND BASE COURSE	\$ 524,140.65	\$ -	0.00%	\$ 213,156.45	4.94%	\$ (109,572.45)	-2.54%	\$ 103,584.00	2.40%	\$ 103,584.00	2.40%	
4	SECTION 400 - SURFACE COURSES	\$ 1,181,808.00	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
5	SECTION 500 - BRIDGE CONSTRUCTION	\$ 12,929.06	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
6	SECTION 600 - DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION STRUTURES	\$ 1,182,283.93	\$ 453,750.80	10.52%	\$ 114,740.20	2.66%	\$ 43,640.06	1.01%	\$ 158,380.26	3.67%	\$ 612,131.06	14.19%	
7	SECTION 700 - MISCELLANEUOS STRUTURES	\$ 104,204.43	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
8	SECTION 800 - BIOENGGINERRING	\$ 473.76	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	Total As Built (A)	\$ 3,845,171.65	\$ 1,173,393.97	27.20%	\$ 355,835.37	8.25%	\$ -75,586.45	-1.75%	\$ 280,248.92	6.50%	\$ 1,453,642.89	33.69%	
B	Profit and Overhead (10% of A)	\$ 384,517.16	\$ 117,339.40	2.72%	\$ 35,583.54	0.82%	\$ -7,558.64	-0.18%	\$ 28,024.89	0.65%	\$ 145,364.29	3.37%	
C	Tax (2% of (A + B))	\$ 84,593.78	\$ 25,814.67	0.60%	\$ 7,828.38	0.18%	\$ -1,662.90	-0.04%	\$ 6,165.48	0.14%	\$ 31,980.14	0.74%	
D	Grand Total (A + B + C)	\$ 4,314,282.59	\$ 1,316,548.03	30.52%	\$ 399,247.28	9.25%	\$ -84,808.00	-1.97%	\$ 314,439.29	7.29%	\$ 1,630,987.32	37.80%	

Prepara Husi :

I. Eng. Domingos Soares Martins

II. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Engenheiro ba Projecto Infrastructura, Transportes e Irigasaun
Munisipiu Covalima A D N, I. P.

Verifika Husi:

Eng. Aniceto da Costa

Engenheiro Senior ba Projecto Infrastructura, Transportes e Irigasaun
A D N, I. P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da
Qualidade A D N, I. P.

ANEXU D (ZU-10)

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN

Naran projeto : Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50+900 km), Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai (35+120)
Road Section 7 : Fatulito - Zulo (25+800 - 30+100) Municipality Bobonaro - Covalima

Kompanha : Marino Enterprises, Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura
I	1/20/2022	Covalima/Zumalai	Eng. Domingos Soares Martins	Engenheiro Municipio Covalima	1	Husu hadia fila fali stone Masonry wall no drainagen balun nakfera ona iha tereno	
					2	Iha pagamentu IPC-4 sei rekomenda tuir kuantidade nebee iha ona relatorio mensal AD N.I.P. nian, no sei check hamutuk ho kompanhia ba item sub-base no base-course iha tempo tuir mai.	
					3	Husu aselera servisu tuir tempo	
	1/20/2022	Covalima/Zumalai	Eng. Bosco Dinis de Sousa	Engenheiro Municipio Covalima	4		
					5		
					6		
II					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
					6		
IV					1		
					2		
					3		
					4		
					5		



ANEXU C1 (ZU-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Manutensaun no konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba - Covalima
No. kontratu : RDTL – 2021 - 15595

Data Inspesaun : 25-01-2022

Fatin Inspesaun : Covalima - Zumalai

Koordinadas :

Start Point : Long : -9.18895361, Latetude: 125.51541044


End Point : Long : -9.19223243, Latetude: 125.508700982

Naran Inspector : 1. Eng. Domingos Soares Martins

2. Eng. Bosco Dinis de Sousa

Sketch & Foto Desenho

Item servisu Stone Masonry drainagen

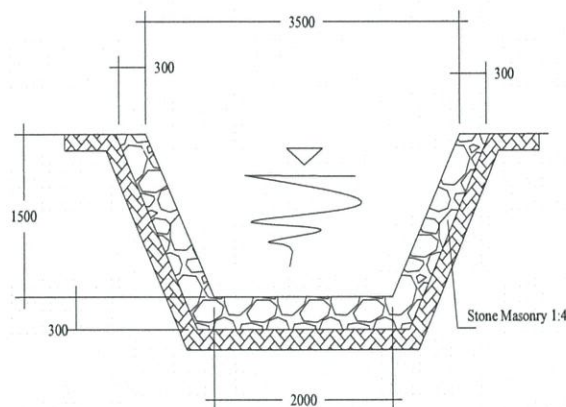

L = 914.1 m,
Lantai iha tereno 17 cm

$$\text{Qty} = L \times A = 914.1 \times 1.4 = \mathbf{1315.8m^3}$$

Observasaun iha tereno no Foto Aktual




ANEXU C1 (ZU-11)

Back-up Data

Naran Projeto : Manutensaun no konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba - Covalima
No. kontratu : RDTL – 2021 - 15595

Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu, Concrete for Canal
Irrigation Shipon

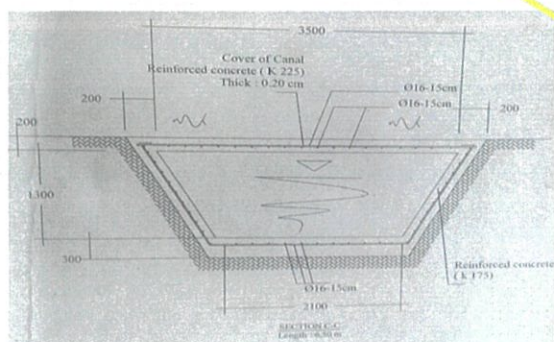


$$L = 6.5 \text{ m, Qty} = L \times A = 6.5 \times 2.004 = 13.02 \text{ m}^3$$

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



Sketch & Foto Desenho

Sketch Item servisu, wall concrete 20Mpa

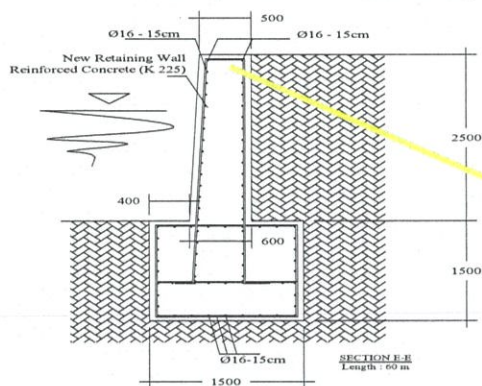

$$L = 82\text{m, Qty} = 194.77\text{m}^3.$$

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C2 (ZU-11)

PROJECT : Rehabilitation of Oebaba Irrigation Scheme
PACKAGE NO LOCATION : Construction of Retaining Wall & Irrigation Canal
LOCATION : Oebaba, Covalima Municipality
Contractor name : Lifran Unip.Lda

SUMMARY													
No	Original Contrack		ADN,I.P. PROGRES										
			Halo ona rekomendasaun pagamentu		Seidauk halo rekomendasaun pagamentu						TOTAL BILLED (Cumulative)		Remarks
	ITEM WORKS	Amount	PREVIOUS		MONTANTE FULAN KOTUK		MONTANTE FULAN NE,E		THIS PERIOD				
			Cost (\$)	Perecent (%)	Cost (\$)	Perecent (%)	Cost (\$)	Perecent (%)	Cost (\$)	Perecent (%)	Cost (\$)	Perecent (%)	
I	Preparatory Works	\$ 11,411.55	\$ 3,321.61	1.27%	\$ 6,061.86	2.33%	\$ (3,387.01)	-1.30%	\$ 2,674.85	1.03%	\$ 5,996.46	2.30%	
II.	Earth works	\$ 4,989.83	\$ 4,242.00	1.63%	\$ 4,242.00	1.63%	\$ (4,242.00)	-1.63%	\$ -	0.00%	\$ 4,242.00	1.63%	
III.	Masonry works	\$ 150,824.70	\$ 66,484.84	25.52%	\$ 75,661.11	29.04%	\$ (46,673.19)	-17.92%	\$ 28,987.93	11.13%	\$ 95,472.76	36.65%	
IV.	Concrete works	\$ 65,196.50	\$ 17,079.36	6.56%	\$ 47,036.25	18.05%	\$ (8,311.99)	-3.19%	\$ 38,724.27	14.86%	\$ 55,803.63	21.42%	
V.	Finishing arrangement	\$ 187.40	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
A	CONSTRUCTION COST	\$ 232,609.98	\$ 91,127.81	34.98%	\$ 133,001.22	51.05%	\$ (62,614.18)	-24.03%	\$ 70,387.04	27.02%	\$ 161,514.85	62.00%	
B	CONTRAKTOR FEE,10% (A*10%)	\$ 23,261.00	\$ 9,112.78	3.50%	\$ 13,300.12	5.11%	\$ (6,261.42)	-2.40%	\$ 7,038.70	2.70%	\$ 16,151.48	6.20%	
C	TAX (A)*2%	\$ 4,652.20	\$ 1,822.56	0.70%	\$ 2,660.02	1.02%	\$ (1,252.28)	-0.48%	\$ 1,407.74	0.54%	\$ 3,230.30	1.24%	
D	GRAND TOTAL COST (A+B+C)	\$ 260,523.18	\$ 102,063.14	39.18%	\$ 148,961.37	57.18%	\$ (70,127.88)	-26.92%	\$ 78,833.48	30.26%	\$ 180,896.63	69.44%	

Prepara Husi :

I. Eng. Domingos Soares Martins II. Eng. Bosco Dinis de Sousa
Engenheiro ba Projecto Infrastructura, Transportes e Irigasaun Munisipiu
Covalima A D N, I.P.

Verifika Husi:

Eng. Aniceto da Costa
Engenheiro Senior ba Projecto Infrastructura, Transportes e
Irigasaun A D N, I.P.

Sertifika Husi :

Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação da Qualidade A D N, I.P.

ANEXU D (ZU-11)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN


Naran projeto : Manutensaun no konstrusaun Kanais Irrigasaun iha
Oebaba - Covalima

Kompanha : Lifran Unip.Lda

No	Data inspesaun	Municipiu / Posto	Naran Eng.	Pozisaun	No	INSTRUSAUN / REKOMENDASAUN	Asinatura	
I	25 de Janeiro de 2022	Covalima/Zumalai	Eng. Domingos Soares Martins	Engineiro Municipio Covalima	1	Konstrusaun fisiku iha tereno finaliza ona 100%		
					2	Kompanhia demobiliza ona ekipamentus servisu husi tereno		
					3			
	4							
	5							
	6							

 MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Prezenzio L. C. D. Ximenes							2022																																
Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																							
Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
SUAI VILLA (SV)	8	New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste	Giovanio	RDTL-MS-DNA-NCB-20-150	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																Projeto ida ne iha ona fase retensaun	
							Actual																																	
	9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																On Going	
							Actual																																	
	10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																Projeto ida ne iha ona fase retensaun	
							Actual																																	
	12	New Construction of Interior Fence for Prison in Suai Municipality	Fraternity Unipessoal Lda	MJ-062/OUTOBRO/2021	LM-CD	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																																	On Going
							Actual																																	
	13	Prefurasun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	Paya's Sisters	002.LM/RDTL/MPIE/A.D.N/Da Rfq/VI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM-CD	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																	Projeto ida nee iha fase retensaun, no osan retensaun balu halo ona pagamento tuir CPV ne'ebe parte Financas ADN Prepara
							Actual																																	
14	Konstrusaun Foun ba ESTV Akar Iaran, Suai	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB-04/MEJD/DNA/2021	LM-CD	MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																	On Going	
						Actual																																		
15	Konstrusaun Rezidencia Administrador Municipio Covalima	Verde Caisahe Lda	RDTL/02/A.M.COVALIMA/XI I/2021	PDIM	ESTATAL	Plan																																	On Going	
						Actual																																		
TILOMAR (TL)	3	Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Sua- Covalima	Ota Gelor	RDTL-73/GMTAC/X//2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																Projeto ida ne agora rahabilita ona ba fatin karantina responsabiliza husi Komphnia Figaletto Unip Lda	
							Actual																																	
	4	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Coalima/KDM-AMP/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																On Going	
							Actual																																	
	6	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															On Going		
							Actual																																	
	7	New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk, Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)	Caramé Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-21-071	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																On Going	
							Actual																																	
FATUM FOHOR EM (FO)	3	Construction, Rehabilitation and Installation of Clean Water with System Gravitation in Suco Fohorem Villa	Loro Metan Unipesola. Lda	SSS/293/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Projeto ida ne abandona hela	
							Actual																																	
EA (FTM)	2	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Nanu	Unidade Unip Lda	05/A.M.Coalima/KDM-AMP/VII/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																Projeto ida nee iha fase retensaun, no pagamento retensaun seidauk prosesa tamba hein desizaun konaba rai halai	
							Actual																																	
MAUCA TAR (MA)	3	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maucatar	Sabudo Unip. Lda	RDTL/01/A.M.COVALIMA/X/2021	PDIM	ESTATAL	Plan																																On Going	
							Actual																																	
ZUMALAI (ZU)	6	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/VII/2015	LM	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	Plan																																	
							Actual																																	
	7	Konstrusaun Eskola Tekniko Professional Zumalai	Sabudo Unip. Lda	03/A.M.Coalima/KDM-AMP/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Projeto ida ne iha fase retensaun	
							Actual																																	
MULTY POSTO ADMNT (MPA)	1	Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro and Manufahi	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/029/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Tekniko nebe responsavel ba Konsultan mk sei halo plano	
							Actual																																	
		TOTAL PROJETO																																						

Note:



Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatorio avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :

(PREZENZIO L. C. D. XIMENES)

Engenheiro ba Projecto Edificio Publico Agua e Saneamento ADN,I.P Munisipiu Covalima

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P.


Aprova Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)

Adjunto Director Executivo ADN,I.P.

 MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL  ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng.	Madelino Deonizo J Magno							2022																															
Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																						
Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
SUAI VILLA (SV)	8	New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste	Giovanio	RDTL-MS-DNA-NCB-20-150	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															Projeto ida ne iha ona fase retensaun	
							Actual																																
	9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															On Going	
							Actual																																
	10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															Projeto ida ne iha ona fase retensaun	
							Actual																																
	12	New Construction of Interior Fence for Prison in Suai Municipality	Fraternity Unipessoal Lda	MJ-062/OUTOBRO/2021	LM-CD	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																															On Going	
							Actual																																
	13	Prefurasun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	Paya's Sisters	002.LM/RDTL/MPIE/A.D.N/Da Rfq/VI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM-CD	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																															Projeto ida nee iha fase retensaun, no osan retensaun balu halo ona pagamento tuir CPV ne'ebe parte Financas ADN Prepara	
							Actual																																
	14	Konstrusaun Foun ba ESTV Akar Iaran, Suai	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB/04/MEJD/DNA/2021	LM-CD	MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																															On Going	
							Actual																																
	15	Konstrusaun Rezidencia Administrador Municipio Covalima	Verde Caisahe Lda	RDTL/02/A.M.COVALIMA/XI I/2021	PDIM	ESTATAL	Plan																															On Going	
							Actual																																
TILOMAR (TL)	3	Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Sua- Covalima	Ota Gelor	RDTL/73/GMTAC/X/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																															Projeto ida ne agora rahabilita ona ba fatin karantina responsabiliza husi Kompanhia Figaletto Unip Lda	
							Actual																																
	4	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Coalima/KDM-AMP/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															On Going	
							Actual																																
	6	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																															On Going	
							Actual																																
	7	New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk, Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)	Caramé Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-21-071	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																														On Going		
							Actual																																
FATUM FOHOR EA (FTM)	3	Construction, Rehabilitation and Installation of Clean Water with System Gravitation in Suco Fohorem Villa	Loro Metan Unipesola. Lda	SSS/293/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Projeto ida ne abandona hela		
							Actual																																
	2	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Nanu	Unidade Unip Lda	05/A.M.Coalima/KDM-AMP/VII/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																														Projeto ida nee iha fase retensaun, no pagamento retensaun seidauk prosesa tamba hein desizaun konaba rai halai		
							Actual																																
MAUCA TAR (MA)	3	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maucatar	Sabudoí Unip. Lda	RDTL/01/A.M.COVALIMA/X/2021	PDIM	ESTATAL	Plan																														On Going		
							Actual																																
ZUMALAI (ZU)	6	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/VII/2015	LM	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	Plan																														On Going		
							Actual																																
	7	Konstrusaun Eskola Tekniko Professional Zumalai	Sabudoí Unip. Lda	03/A.M.Coalima/KDM-AMP/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																														Projeto ida ne iha fase retensaun		
							Actual																																
TOTAL PROJETO																																							

Note:



Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu



Relatoriu avaliasun mensal iha Dili



Inspesaun Proceso Pagamentu

Prepara Husi :

(MADELINO DEONIZO J MAGNO)

Engenheiro ba Projecto Edificio Publico Agua e Saneamento ADN,I.P. Munisipiu Covalima, ADN,I.P.

Sertifika Husi :

(Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P.

Approva Husi :

(Eng. Januario Maia Guterres)

Adjunto Director Executivo ADN,I.P.

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO XIII GOVERNO DA CONSTITUCION ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng.	Bosco Dinis de Sousa							2022																															
Municipio	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																						
Municipio / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS
SUAI VILLA (SV)	1	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Parte Electrical mk sei halo plano					
							Actual																																
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Halihun, MDGS, Matai, MDGS Halihun - Covalima Municipality	Eron Power, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000435	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Parte Electrical mk sei halo plano					
							Actual																																
	3	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	ICB/035/TGAP-2013	FI	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																											PHO,Inspeksaun geral ba pagamentu retensaun, devolve dokumentus iha tinan 2021 tamba sei iha defeitus nebe'e seidauk hadia husi contractor.					
							Actual																												La halo monitorizasaun iha fulan Janeiru nia laran, tamba kompanhia la halo aktividade reparasaun ba defeitus sira nebe'e existe iha tinan kotuk ate agora.				
	4	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	ICB/035/TGAP-2013	FI	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																											Tekniko nebe responsavel ba Konsultan mk sei halo plano					
							Actual																																
	5	New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)	Consortio Naroman Covalima, Group Lda	SSS/266/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											On Progress					
							Actual																												Projecto ne'e provizoriamente sei paradu hela, tamba kompanhia sei hein aprovasaun CCO-1 no Item foun nebe'e maka seidauk iha aprovasaun husi projecto nain.				
	6	Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun	Consortio Zemo Lda	SSS/346/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Projecto ne'e abandona husi tinan 2017 ate agora la iha aktividade konstrusaun foun iha tereno, Tuir informasaun projecto ne'e atu continua fali iha tinan 2022 nia laran.					
							Actual																												La halo monitorizasaun iha fulan Janeiru 2022 nia laran, tamba kompanhia la halo aktividade konstrusaun iha tereno.				
	7	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II 5+020 - 10+140 Municipality Covalima	Nobre Labadai Unipessoal, Lda	SSS/051/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											PHO					
							Actual																												FHO, Rekomendasaun Pagamentu.				
8	New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste	Giovanio	RDTL-MS-DNA-NCB-20-150	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																											Edifikasaun mak halo planu						
						Actual																																	
9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referal Hospital, Covalima, Timor Leste	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																											Edifikasaun mak halo planu						
						Actual																																	
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referal Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																											Edifikasaun mak halo planu						
						Actual																																	
11	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge - Zumalai Jct. Phase I 0+000 - 5+020 Municipality Covalima	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/322/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											PHO						
						Actual																												FHO, Rekomendasaun Pagamentu.					
12	New Construction of Interior Fence for Prison in Suai Municipality	Fraternity Unipessoal Lda	MJ-062/OUTOBRO/2021	LM-CD	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																											Edifikasaun mak halo planu						
						Actual																																	
13	Prefurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	Paya's Sisters	002.LM/RDTL/MPIE/A.D.N /Da Rfq/V1/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																											Edifikasaun mak halo planu						
						Actual																																	
TILOMAR (TL)	1	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality	Lalenok Fronteira, unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										Parte Electrical mk sei halo plano						
							Actual																																
	2	River normalization and protection in Fatuk Oan	Consortio Lorico Covalima	SSS/263/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										ABANDONA						
							Actual																																
	3	Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Sua- Covalima	Ota Gelor	RDTL-73/GMTAC/X/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																										Edifikasaun mak halo planu						
							Actual																																
	4	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																										Edifikasaun mak halo planu						
							Actual																																
	5	Lookeu Chainage 0+000 - 6+000, Casabau 008 Chainage 0+000 - 3+000, Casabau 012 Chainage 0+000 - 3+500, Casabau 018 Chainage 0+000 - 2+700, Naguidal - Lour Chainage 0+000 - 4+000, Boardikun - Mape Chainage 0+000 - 8+000, Data - Tolu Chainage 0+000 - 9+600 / 162	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	RDTL	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																										ABANDONA						
							Actual																																
	6	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																											Edifikasaun mak halo planu					
							Actual																																
	7	New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk, Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)	Carama Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-21-071	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																											Edifikasaun mak halo planu					
							Actual																																

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIA GOVERNAMENTAL, LISBOA ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Bosco Dinis de Sousa							2022																																
Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																							
Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
FOHOREM (FO)	1	R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality	Unidade Unip Lda	RT/027/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PHO	
							Actual																																	
	2	R4D Rural Road Rehabilitation Dato- Tolu Chainage 11+100 - 12+600 Covalima Municipality	Verde Caisahe Lda	NCB/057/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PHO	
							Actual																																	
	3	Construction, Rehabilitation and Installation of Clean Water with System Gravitation in Suco Fohorem Villa	Loro Metan Unipessola. Lda	SSS/293/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Edifikasaun mak halo planu
							Actual																																	
4	Construction of Baer Bridge	PT. Duta Graha	RDTL- 120002189	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	PENDENTE	
						Actual																																		
FATUMEA (FTM)	1	Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160	Be'e horis, Unip. Lda	SSS/103/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Progressu Fisiku finaliza ona 100% iha tereno, no hein aprovasaun CCO No.2 husi Dono projecto hodi lori ba prosesu pagamentu nian iha periode tuir mai.	
							Actual																																	
	2	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Nanu	Unidade Unip Lda	05/A.M.Coalima/KDM-AMP/VII/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																Edifikasaun mak halo planu	
							Actual																																	
FATULULIK (FTK)	1	Road Maintenance Section Taroman - Datorua - Fatumeta (A016) 13.15 Km Section Covalima Municipality (162)	Jufado	NCB-MOP-190014	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PARADO/ABANDONA	
							Actual																																	
	2	Construction of Taroman Bridge	Ensul Engenharia, S.A.	RDTL- 11005004	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PENDENTE	
							Actual																																	
MAUCATAR (MA)	1	Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to Aldeia iha Roads Covalima Municipality	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/135/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Progressu fisiku finaliza ona 100% iha tereno, Maibe dezenho no Variation seidauk iha aprovasaun husi dono projecto	
							Actual																																	
	2	Rebidding of Project Road Maintenance Sections ; Suai, Maucatar - Lelaus Municipality Covalima (162)	Verde Caisahe Lda	NCB-MOP-190010	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PARADO/ABANDONA		
							Actual																																	
	3	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maucatar	Sabudoir Unip. Lda	RDTL/01/A.M.COVALIMA /X/2021	PDIM	ESTATAL	Plan																																	
							Actual																																	
ZUMALAI (ZU)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality	Foho Rua Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000404	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Parte Electrical mk sei halo plano	
							Actual																																	
	2	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality	Mania Unip, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000427	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Parte Electrical mk sei halo plano		
							Actual																																	
	3	Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima	Clardel Interprice Unip Lda	SSS/227/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PARADO / ABANDONA		
							Actual																																	
	4	Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction (0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima	Star Suai, Lda	SSS/050/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PHO		
							Actual																																	
	5	Rehabilitation of be'e mean roads	Roman Junior Unipessoal, Lda	SSS/049/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PHO	
							Actual																																	
	6	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/VII/2015	LM	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	Plan																																Edifikasaun mak halo planu	
							Actual																																	
	7	Konstrusaun Escola Tekniko Profissional Zumalai	Sabudoir Unip. Lda	03/A.M.Coalima/KDM-AMP/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Edifikasaun mak halo planu	
							Actual																																	
	8	Rural Roads Periodik Maintenance Lepo - Lour Chainage 0+000-3+000	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	MPW-W-190260	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PARADO/ABANDONA	
							Actual																																	
	9	Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai Road Section 8 : Zulo - Jct Zumalai (30+100 - 35+120 km) Municipality Covalima	Octogono Constru. Unip. Lda	SSS/067/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																On Progres	
							Actual																																	
10	Rehabilitation of Roads A12 Jct A12 Maliana - Jct A02 Zumalai (50+900 km), Road Section : Jct A16 Uele'o - Jct A02 Zumalai (35+120) Road Section 7 : Fatulito - Zulo (25+800 - 30+100) Municipality Bobonaro - Covalima	Marino Enterprises, Lda	SSS/065/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																On Progres		
						Actual																																		
11	Manutensaun no konstrusaun Kanais Irrigasaun iha Oebaba - Covalima	Lifran Unip.Lda	RDTL-2021-15595	LM-CD	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	Plan																																On Progress		
						Actual																																		

PLANU INSPESAUN

Naran Eng. **Bosco Dinis de Sousa**

2022

Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS
-----------	------------------------------

[illegible]

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesoun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :



(Eng. Bosco Dinis de Sousa)

Engenheiro ba Projecto Infraestructura, Transportes e Irrigasaun Munisipiu Covalima ADN, I.P.

Sertifika Husi :

nciana da Costa Mai:

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi :

Eng. Januario Ma

(Eng. Januario Maia Guterres)

Adjunto Director Ejecutivo ADN, I.P.

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																
Naran Eng.	Domingos Soares Martins							2022																															
Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																						
Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS
SUAI VILLA (SV)	1	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Parte Electrical mk sei halo plano				
							Actual																																
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Dehos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Halihun, MDGS, Matai, MDGS Halihun - Covalima Municipality	Eron Power, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000435	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Parte Electrical mk sei halo plano				
							Actual																																
	3	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	ICB/035/TGAP-2013	FI	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																												PHO,Inspeksaun geral ba pagamentu retensaun, devolve dokumentus iha tinan 2021 tamba sei iha defeitus nebe'e seidauk hadia husi contractor.				
							Actual																													La halo monitorizasaun iha fulan Janeiru nia laran, tamba kompanhia la halo aktividade reparasaun ba defeitus sira nebe'e existe iha tinan kotuk ate agora.			
	4	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	ICB/035/TGAP-2013	FI	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																												Tekniko nebe responsavel ba Konsultan mk sei halo plano				
							Actual																																
	5	New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)	Consortio Naroman Covalima, Group Lda	SSS/266/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Progress				
							Actual																													Projecto ne'e provizoriamente sei paradu hela, tamba kompanhia sei hein aprovasaun CCO-1 no Item foun nebe'e maka seidauk iha aprovasaun husi projecto nain.			
	6	Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun	Consortio Zemo Lda	SSS/346/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Projecto ne'e abandona husi tinan 2017 ate agora la iha aktividade konstrusaun foun iha tereno, Tuir informasaun projecto ne'e atu kontinua fali iha tinan 2022 nia laran.				
							Actual																													La halo monitorizasaun iha fulan Janeiru 2022 nia laran, tamba kompanhia la halo aktividade konstrusaun iha tereno.			
	7	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II 5+020 - 10+140 Municipality Covalima	Nobre Labadai Unipessoal, Lda	SSS/051/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												PHO				
							Actual																													FHO, Rekomendasaun Pagamentu.			
8	New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste	Giovanio	RDTL-MS-DNA-NCB-20-150	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																												Edifikasaun mak halo planu					
						Actual																																	
9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referal Hospital, Covalima, Timor Leste	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																												Edifikasaun mak halo planu					
						Actual																																	
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referal Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																												Edifikasaun mak halo planu					
						Actual																																	
11	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge - Zumalai Jct. Phase I 0+000 - 5+020 Municipality Covalima	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/322/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												PHO					
						Actual																													FHO, Rekomendasaun Pagamentu.				
12	New Construction of Interior Fence for Prison in Suai Municipality	Fraternity Unipessoal Lda	MJ-062/OUTOBRO/2021	LM-CD	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																												Edifikasaun mak halo planu					
						Actual																																	
13	Prefurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	Paya's Sisters	002.LM/RDTL/MPIE/A.D.N /Da Rfq VI/2019/EDIFICIO DEPARTAMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																												Edifikasaun mak halo planu					
						Actual																																	
TILOMAR (TL)	1	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality	Lalenok Fronteira, unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											Parte Electrical mk sei halo plano					
							Actual																																
	2	River normalization and protection in Fatuk Oan	Consortio Lorico Covalima	SSS/263/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											ABANDONA					
							Actual																																
	3	Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Sua- Covalima	Ota Gelor	RDTL/73/GMTAC/X/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																											Edifikasaun mak halo planu					
							Actual																																
	4	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Coalima/KDM-AMP/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																											Edifikasaun mak halo planu					
							Actual																																
	5	Looku Chainage 0+000 - 6+000, Casabau 008 Chainage 0+000 - 3+000, Casabau 012 Chainage 0+000 - 3+500, Casabau 018 Chainage 0+000 - 2+700, Naguidal - Lour Chainage 0+000 - 4+000, Boardikun - Mape Chainage 0+000 - 8+000, Data - Tolu Chainage 0+000 - 9+600 / 162	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	RDTL	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																											ABANDONA					
							Actual																																
	6	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																											Edifikasaun mak halo planu					
							Actual																																
	7	New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk, Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)	Carama Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-21-071	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																											Edifikasaun mak halo planu					
							Actual																																

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																	
Naran Eng.	Domingos Soares Martins						2022																																	
Municipio	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																							
Municipio / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
FOHOREM (FO)	1	R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality	Unidade Unip Lda	RT/027/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PHO	
							Actual																																	
	2	R4D Rural Road Rehabilitation Dato- Tolu Chainage 11+100 - 12+600 Covalima Municipality	Verde Caisahe Lda	NCB/057/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Edifikasaun mak halo planu
							Actual																																	
	4	Construction of Baer Bridge	PT. Duta Graha	RDTL- 120002189	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
FATUMEA (FTM)	1	Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160	Be'e horis, Unip. Lda	SSS/103/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Progressu Fisiku finaliza ona 100% iha tereno, no hein aprovasaun CCO No.2 husi Dono projecto hodi lori ba prosesu pagamentu nian iha periode tur mai.	
							Actual																																	
	2	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Nanu	Unidade Unip Lda	05/A.M.Coalima/KDM-AMP/VII/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																	
FATULULIK (FTK)	1	Road Maintenance Section Taroman - Datorua - Fatumeta (A016) 13.15 Km Section Covalima Municipality (162)	Jufado	NCB-MOP-190014	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PARADO/ABANDONA	
							Actual																																	
	2	Construction of Taroman Bridge	Ensul Engenharia, S.A.	RDTL- 11005004	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PENDENTE	
							Actual																																	
MAUCATAR (MA)	1	Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to Aldeia iha Roads Covalima Municipality	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/135/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Progressu fisiku finaliza ona 100% iha tereno, Maibe dezenho no Variation seidauk iha aprovasaun husi dono projecto	
							Actual																																	
	2	Rebidding of Project Road Maintenance Sections ; Suai, Maucatar - Lelaus Municipality Covalima (162)	Verde Caisahe Lda	NCB-MOP-190010	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PARADO/ABANDONA		
							Actual																																	
	3	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maucatar	Sabudoir Unip. Lda	RDTL/01/A.M.COVALIMA /X/2021	PDIM	ESTATAL	Plan																																	
							Actual																																	
ZUMALAI (ZU)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality	Foho Rua Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000404	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Parte Electrical mk sei halo plano	
							Actual																																	
	2	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality	Mania Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000427	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Parte Electrical mk sei halo plano		
							Actual																																	
	3	Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima	Clardel Interprice Unip Lda	SSS/227/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PARADO / ABANDONA		
							Actual																																	
	4	Rehabilitation of Road From Haemanu Bridge Zumalai Junction (0+000 - 20+316) Phase III Sta. 10+140 - 15+180 Municipality Covalima	Star Suai, Lda	SSS/050/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PHO		
							Actual																																	
	5	Rehabilitation of be'e mean roads	Roman Junior Unipessoal, Lda	SSS/049/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PHO	
							Actual																																	
	6	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/VII/2015	LM	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	Plan																																Edifikasaun mak halo planu	
							Actual																																	
	7	Konstrusaun Escola Tekniko Professional Zumalai	Sabudoir Unip. Lda	03/A.M.Coalima/KDM-AMP/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																Edifikasaun mak halo planu	
							Actual																																	
	8	Rural Roads Periodik Maintenance Lepo - Lour Chainage 0+000-3+000	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	MPW-W-190260	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																PARADO/ABANDONA	
							Actual											</																						

2022

Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS
-----------	------------------------------

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Ajuntamiento Director Ejecutivo ADN, I.P.

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VICARIA GERAL DO GOVERNO ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Investimentos Públicos							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Naran Eng. Silvino Domingos Rita Rebelo Soares							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Município MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS							Janeiro																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUAI VILLA (SV)	1	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Hela Retensaun 10% e Tenki Hadia Avaria																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Actual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

[illegible]

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Proceſu Pagamentu

Prepara Husi:

(Silvino D. R. Rebelo Soares)
Eng. Electricidade, ADN, I.P

Sertifikasi Nusi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controle e Validação de Qualidade, ADN, I.P.

Apfova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T.M., Eng)
 Director Ejecutivo, ADN .P

Naran Eng. Silvino Domingos Rita Rebelo Soares							2022																																	
Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS						Feiverio																															OBS		
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
SUAI VILLA (SV)	1	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																Hela Retensaun 10% e Tenki Hadia Avaria	
							Actual																																	
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Deboas Office District. Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Halihun, MDGS, Matai, MDGS Halihun - Covalima Municipality	Eron Power. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000435	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	3	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	ICB/035/TGAP-2013	FI	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																																	
							Actual																																	
	4	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	Junutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	ICB/035/TGAP-2013	FI	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																																	
							Actual																																	
	13	Prefurasau No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	Paya's Sisters	002.LM/RDTL/MPIE/A.D.N/Da Riq/VI/2019/EDIFICIO DEPARTAMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																	
							Actual																																	
	14	Konstrusaun Foun Ba ESTV Akar Laran, Suai	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB:04/MEJD/DNA/2021	LM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
15	Konstrusan Rezidencia Administrador Municipio Covalima	Verde Caisahe Lda	RDTL/02/A.M.CO VALIMA/XII/2021	PDIM		Plan																																		
						Actual																																		
8	New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste	Giovanio	RDTL-MS-DNA-NCB-20-150	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																		
						Actual																																		
9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																		
						Actual																																		
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																		
						Actual																																		
TILOMAR (TL)	16	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality	Lalenok Fronteira, unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	17	Rehabilitasaun Merkadu Tradisional Iha Fronteira Salele- Sua- Covalima	Ota Gelor	RDTL-73/GMTAC/X/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																	
							Actual																																	
	18	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Coalima/KD M-AMP/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																	
21	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																		
						Actual																																		
22	New Construction of Health Post and Doctor House Buiding in Beisuk, Tilomar, Covalima, Timor Leste (Niquir)	Carama Unip Lda	RDTL-MS-DNA-ICB-21-071	LM-CD	MINISTERIO SAUDE	Plan																																		
						Actual																																		
FATUMEA (FTM)	28	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Nanu	Unidade Unip Lda	05/A.M.Coalima/KD M-AMP/VII/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																	
MAUCATAR (MA)	33	Konstrusaun Edifisio Posto Administrativo Maucatar	Sabudoir Unip. Lda	RDTL/01/A.M.COVALIMA/X/2021	PDIM	ESTATAL	Plan																																	
							Actual																																	
ZUMALAI (ZU)	34	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality	Foho Rua Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000404	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	35	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality	Mania Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000427	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	39	Konstrusaun Igreja Paroquia Zumalai	Aitula Construction, Lda	002/NC-ZC/VII/2015	LM	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	Plan																																	
Actual																																								

8



2022

Naran Eng.		Silvino Domingos Rita Rebelo Soares						2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Município		MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Feiverio																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	40	Konstrusaun Eskola Tekniko Profesional Zumalai	Sabudoj Unip. Lda	03/A.M.Covalima/KD M-AMP/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Note:

Planu Periode inspesaun iha tercinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Proceso Pagamentu

Prepara Husi:

(Silvino D. R. Rebelo Soares)
Eng. Electricidade, ADN, I.P.

Sertifika Husi:

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi:

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T.M., Eng)
Director Executivo, ADN, I.P.

Naran Eng.	Madelino D J Magno							2022																																				
Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																											
Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS					
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
SUAI VILLA (SV)	1	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Parte Electrical mk sei halo plano				
							Actual																																					
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Halihun, MDGS, Matai, MDGS Halihun - Covalima Municipality	Eron Power, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000435	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Parte Electrical mk sei halo plano			
							Actual																																					
	3	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	ICB/035/TGAP-2013	FI	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																																		Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano			
							Actual																																					
	4	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	ICB/035/TGAP-2013	FI	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																																			Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano		
							Actual																																					
	5	New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)	Consortcio Naroman Covalima, Group Lda	SSS/266/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano	
							Actual																																					
	6	Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun	Consortcio Zemo Lda	SSS/346/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																					Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano
							Actual																																					
	7	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II 5+020 - 10+140 Municipality Covalima	Nobre Labadai Unipessoal, Lda	SSS/051/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																					Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano
							Actual																																					
	8	New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste	Giovanio	RDTL-MS-DNA-NCB-20-150	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																					Projeto ida ne iha ona fase refensaun
Actual																																												
9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referal Hospital, Covalima, Timor Leste	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																					On Going	
						Actual																																						
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referal Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																					Projeto ida ne iha ona fase refensaun	
						Actual																																						
11	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge - Zumalai Jct. Phase I 0+000 - 5+020 Municipality Covalima	WTJ Contraction Unipesoal Lda	SSS/322/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																					Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano	
						Actual																																						
12	New Construction of Interior Fence for Prison in Suai Municipality	Fraternity Unipessoal Lda	MJ-062/OUTOBRO/2021	LM-CD	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																																					On Going	
						Actual																																						
13	Prefurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	Paya's Sisters	002.LM/RDTL/MPIE/A.D.N/Da Rfq/VI/2019/EDIFICIO DEPARTMENT	LM-CD	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																																					Projeto ida nee iha fase refensaun, no osan refensaun balu halo ona pagamento tuir CPV ne'ebe parte Financas ADN Prepara	
						Actual																																						
14	Konstrusaun Foun ba ESTV Akar laran, Suai	Roman Junior Unipessoal, Lda	NCB-04/MEJD/DNA/2021	LM-CD	MINISTERIO DA EDUCACAO JUVENTUDE E DESPORTO	Plan																																					On Going	
						Actual																																						
15	Konstrusaun Rezidencia Administrador Municipio Covalima	Verde Caisahe Lda	RDTL/02/A.M.COVALIMA/XI I /2021	PDIM	ESTATAL	Plan																																				On Going		
						Actual																																						
TILOMAR (TL)	1	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality	Lalenok Fronteira, unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano		
							Actual																																					
	2	River normalization and protection in Fatuk Oan	Consortcio Lorico Covalima	SSS/263/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano		
							Actual																																					
	3	Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Sua- Covalima	Ota Gelor	RDTL.73/GMTAC//XII/2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																																			Projeto ida ne agora rahabilita ona ba fatin karantina responsabiliza husi Komphnia Figaleta Unip Lda		
							Actual																																					
	4	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																				On Going	
							Actual																																					
	5	Lookeu Chainage 0+000 - 6+000, Casabau 008 Chainage 0+000 - 3+000, Casabau 012 Chainage 0+000 - 3+500, Casabau 018 Chainage 0+000 - 2+700, Naguidal - Lour Chainage 0+000 - 4+000, Boardikun - Mape Chainage 0+000 - 8+000, Data - Tolu Chainage 0+000 - 9+600 / 162	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	RDTL	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																				Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano	
							Actual																																					
	6	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																				On Going	
							Actual																																					
7	New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk, Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)	Caramé Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-21-071	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																				On Going		
						Actual																																						

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL INADN, I.P. Agência de Estatística e Indicadores Nacionais, Instituto Estatístico								PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Naran Eng.	Madelino Deonizo J Magno							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
FOHOREM (FO)	1	R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality	Unidade Unip Lda	RT/027/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Actual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	2	R4D Rural Road Rehabilitation Dato- Tolu Chainage 11+100 - 12+600 Covalima Municipality	Verde Caisahe Lda	NCB/057/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público								PLANU INSPESAUN																																		
Naran Eng.	Madelino D J Magno							2022																																		
Municipio	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																									
Municipio / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MULTY POSTO ADMNT (MPA)	1	Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro and Manufahi	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/029/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Tekniko nebe responsavel ba Konsultan mk sei halo plano		
							Actual																																			
	2	Rehabilitation of Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800	Expres Distribution Services Unip. Lda	SSS/318/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano	
							Actual																																			
	3	Manutensaun Estrada Lookou. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200-Municipal of Covalima	Manu Bey Unip Lda	RT/079/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano	
							Actual																																			
	4	Rural Roads Routine Maintenance Lepo-Lour Sta 0+000-3+000, Naguidal - Lour Sta 0+000-5+000, Boardikun - Mape Sta 0+000-8+000 / 162	Futuro Mane Mesak Unip Lda	MPWTC-CD-170015	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano	
							Actual																																			
	5	Rural Roads Routine Maintenance Dato Tohu Cha 0+000 - 9+600, Lookou Cha 0+000 - 6+000, Casabauc 008 Cha 0+000 - 3+000, Casabauc 012 Cha 0+000 - 3+500, Casabauc 018 Cha 0+000 - 2+700, Lalawa Cha 0+000 - 3+500, Boraikun Mape Cha 0+000 - 8+000, Naguidal Lepo Cha 0+000 - 4+000 Municipality Covalima	Lufi Raica Unip Lda	MPW/WNCB/R/190048	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																			Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano
							Actual																																			
		TOTAL PROJETO																																								
Note:																																										
	Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu							Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili																Inspesaun Proceso Pagamentu																		

Note:

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Proceu Pagamentu

Prepara Husi :



(**MADELINO DEONIZO J MAGNO**)

Engenheiro ba Projecto Edificio Publico Agua e Saneamento ADN,I.P. Munisipiu Covalima


Sertifika Husi :



(**Emerenciana da Costa Maia Freitas**)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P.

Aprova Husi :



(**Mariano R. Monteiro da Cruz, S.T.M.,Eng**)

Director Executivo ADN,I.P.

2022

4

2022

Page 2 of 3

 MUNICÍPIO DE COVALIMA TERREIRA NOVA, 1111 MUNICÍPIO DE COVALIMA  ADN, I.P. Agência de Qualidade de Serviços Nacionais - Ministério Público								PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng. Domingos Soares Martins								2022																															
Município MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																							
Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiro																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MULTY POSTO ADMNT (MPA)	1	Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro and Manufahi	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/029/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Tekniko nebe responsavel ba Konsultan mk sei halo plano	
							Actual																																
	2	Rehabilitation of Mota Masin to Haemann Roads Sta. 17+500-23+800	Expres Distribution Services Unip. Lda	SSS/318/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Progressu iha tereno finaliza ona 100%, hein pagamentu ba addisioal ho 100% nian.	
							Actual																																
	3	Manutensaun Estrada Lookou. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naguidal-Lour. Sta. 0+000-4+200-Municipal of Covalima	Manu Bey Unip Lda	RT/079/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PENDENTE	
							Actual																																
	4	Rural Roads Routine Maintenance Lepo-Lour Sta 0+000-3+000, Naguidal - Lour Sta 0+000-5+000, Boardikun - Mape Sta 0+000-8+000 / 162	Futuro Mane Mesak Unip Lda	MPWTC-CD-170015	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PENDENTE	
							Actual																																
	5	Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Cha 0+000 - 9+600, Lookou Cha 0+000 - 6+000, Casabauc 008 Cha 0+000 - 3+000, Casabauc 012 Cha 0+000 - 3+500, Casabauc 018 Cha 0+000 - 2+700, Lalawa Cha 0+000 - 3+500, Boraikun Mape Cha 0+000 - 8+000, Naguidal Lepo Cha 0+000 - 4+000 Municipality Covalima	Lufi Raica Unip Lda	MPW/WNCB/R/190048	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															PENDENTE	
							Actual																																
TOTAL PROJETO																																							

Note:

 Planu Periode inspesaun iha tercinu

 Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

 Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

 Inspesaun Proceu Pagamentu

Prepara Husi :



(Eng. Domingos Soares Martins)

Engenheiro ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irrigasaun Munisipiu Covalima ADN, I.P.

Sertifica Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN, I.P.

Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T.M., Eng)

Director Executivo ADN, I.P.

MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituição Pública										PLANU INSPEAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Naran Eng. Prezenzio L. C. D. Ximenes										2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Município MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SUAI VILLA (SV)	1	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

REPUBLICA DE TIMOR-LESTE REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência do Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Naran Eng. Prezenzio L. C. D. Ximenes							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Município							MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Município / Posto							Janciru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FOHOREM (FO)	1	R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality	Unidade Unip Lda	RT/027/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE REPUBLICA DEMOKRATIS TETUM-LESTU RDTL MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL ADN, I.P. Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público							PLANU INSPESAUN																																			
Naran Eng. Prezenzio L. C. D. Ximenes							2022																																			
Município							MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																			
Município / Posto							Janeiru																																			
MULTY POSTO ADMNT (MPA)	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS			
	1	Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro and Manufahi	Maun Alin Suai Unip Lda	SSS/029/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	Tekniko nebe responsavel ba Konsultan mk sei halo plano		
							Actual																																			
	2	Rehabilitation of Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800	Expres Distribution Services Unip. Lda	SSS/318/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano	
							Actual																																			
	3	Manutensaun Estrada Looku. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200-Municipal of Covalima	Manu Bey Unip Lda	RT/079/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano	
							Actual																																			
	4	Rural Roads Routine Maintenance Lepo-Lour Sta 0+000-3+000, Naguidal - Lour Sta 0+000-5+000, Boardikun - Mape Sta 0+000-8+000 / 162	Futuro Mane Mesak Unip Lda	MPWTC-CD-170015	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano	
							Actual																																			
	5	Rural Roads Routine Maintenance Dato Tolu Cha 0+000 - 9+600, Looku Cha 0+000 - 6+000, Casabauc 008 Cha 0+000 - 3+000, Casabauc 012 Cha 0+000 - 3+500, Casabauc 018 Cha 0+000 - 2+700, Lalawa Cha 0+000 - 3+500, Boraikun Mape Cha 0+000 - 8+000, Naguidal Lepo Cha 0+000 - 4+000 Municipality Covalima	Lufi Raica Unip Lda	MPW/WNCB/R/190048	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																		Parte Seksaun ITI mak sei halo Plano	
						Actual																																				
		TOTAL PROJETO																																								
Note:																																										
							Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu																																			
							Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili																																			
							Inspesaun Proceu Pagamentu																																			

Note:

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Prosesu Pagamentu

Prepara Husi :



(Prezenzio L. C. D. Ximenes)

Engenheiro ba Projecto Edificio Publico Agua e Saneamento ADN,I.P. Munisipiu Covalima

Sertifika Husi :



(Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN,I.P.



Aprova Husi :



(Mariano R. Monteiro da Cruz, S.T.M., Eng)

Director Executivo ADN,I.P.

REPUBLICA DE TIMOR-LESTE MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTU REPÚBLICA DE TIMOR-LESTE MINISTÉRIU DA PLANA E ORDENAMENTU ADN, L.P. Associação para o Desenvolvimento Nacional PLANU INSPESAUN																																					
Naran Eng. Bosco Dinis de Sousa																																					
Município																																					
Município / Posto																																					
MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																					
2022																																					
Janeiru																																					
OBS																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																																					
SUAI VILLA (SV)	1	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	Divita Unip. Lda	RDTL/MOP-SEE/CGI-PEN:000052	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Parte Electrical mk sei halo plano		
							Actual																														
	2	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Halihun, MDGS, Matai, MDGS Halihun - Covalima Municipality	Eron Power, Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000435	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Parte Electrical mk sei halo plano		
							Actual																														
	3	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	ICB/035/TGAP-2013	FI	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																												PHO,Inspeksaun geral ba pagamentu retensaun, devolve dokumentus iha tinan 2021 tamba sei iha defeitus nebe'e seidauk hadia husi contractor.		
							Actual																														
	4	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	ICB/035/TGAP-2013	FI	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	Plan																												Tekniko nebe responsavel ba Konsultan mk sei halo plano		
							Actual																														
	5	New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)	Consortio Naronan Covalima, Group Lda	SSS/266/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												On Progress		
							Actual																														
	6	Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun	Consortio Zemo Lda	SSS/346/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Projecto ne'e abandona husi tinan 2017 ate agora la iha aktividade konstrusaun foun iha tereno, Tuir informasaun projecto ne'e atu kontinua fali iha tinan 2022 nia laran.		
							Actual																														
	7	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge to Zumalai Jct. Phase II 5+020 - 10+140 Municipality Covalima	Nobre Labadai Unipessoal, Lda	SSS/051/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												PHO		
							Actual																														
8	New Construction of ICU ROOM in Covalima, Timor Leste	Giovanio	RDTL-MS-DNA-NCB-20-150	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													Edifikasaun mak halo planu		
						Actual																															
9	New Construction of Isolamento for covid-19 Suai Referral Hospital, Covalima, Timor Leste	Roman Junior Unipessoal, Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-166	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													Edifikasaun mak halo planu		
						Actual																															
10	New Construction of Laboratory for Covid 19 at Suai Referral Hospital, Ministry of Health Timor-Leste	Manu Bey Unip Lda	RDTL-MS-DNA-RBK-20-184	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													Edifikasaun mak halo planu		
						Actual																															
11	Rehabilitation of Road From Haemano Bridge - Zumalai Jct. Phase I 0+000 - 5+020 Municipality Covalima	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/322/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													PHO		
						Actual																															
12	New Construction of Interior Fence for Prison in Suai Municipality	Fraternity Unipessoal Lda	MJ-062/OUTOBRO/2021	LM-CD	MINISTERIO DA JUSTICA	Plan																													Edifikasaun mak halo planu		
						Actual																															
13	Prefurasaun No Kanalizasaun Bee Mos Iha Aldeia Gala	Paya's Sisters	002.LM/RDTL/MPIE/A.D. N/Da Rfq/VII/2019/EDIFICIO DEPARTAMENT	LM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan																													Edifikasaun mak halo planu		
						Actual																															
TILOMAR (TL)	1	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality	Lalenok Fronteira, unip.lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												Parte Electrical mk sei halo plano		
							Actual																														
	2	River normalization and protection in Fatuk Oan	Consortio Lorico Covalima	SSS/263/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																												ABANDONA		
							Actual																														
	3	Rehabilitasaun Merkadu Tradisional iha Fronteira Salele- Sua- Covalima	Ota Gelor	RDTL-73/GMTAC/X//2015	LM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	Plan																												Edifikasaun mak halo planu		
							Actual																														
	4	Construction of Health Post and Residence for Health Staff in Suku Beiseuk	Joia Camenasa Unip. Lda	06/A.M.Covalima/KDM-AMP/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																												Edifikasaun mak halo planu		
							Actual																														
	5	Lookou Chainage 0+000 - 6+000, Casabau 008 Chainage 0+000 - 3+000, Casabau 012 Chainage 0+000 - 3+500, Casabau 018 Chainage 0+000 - 2+700, Naguidal - Lour Chainage 0+000 - 4+000, Boardikun - Mape Chainage 0+000 - 8+000, Data - Tolu Chainage 0+000 - 9+600 / 162	Futuro Mane Mesak Unip. Lda	RDTL	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																													ABANDONA	
							Actual																														
	6	Rehabilitation of Mini Mercado Mota Masin in Suai Covalima Ministry of Health, Timor Leste	Figelato Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-20-217	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													Edifikasaun mak halo planu	
							Actual																														
	7	New Construction Of Health Post and Doctor House Building in Biseuk, Tilomar, Covalima Timor Leste (Niquer)	Carama Unip. Lda	RDTL-MS-DNA-NCB-21-071	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																													Edifikasaun mak halo planu	
							Actual																														

MINISTERIO DO PLANO E ORDENAMENTO MINISTERIO DA ECONOMIA ADN, I.P.								PLANU INSPESAUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Naran Eng.	Bosco Dinis de Sousa							2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Município	MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Município / Posto	No	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Janeiru																															OBS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
FOHOREM (FO)	1	R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 9+600 - 11+100 Covalima Municipality	Unidade Unip Lda	RT/027/MOP-2019	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

PLANU INSPESAUN

Naran Eng.	Bosco Dinis de Sousa
------------	-----------------------------

Municipio

MUNICIPIO COVALIMA NO POSTOS

Municipio /
Posto

No

Naran Projeto

Notes

2022

Janeiru

OBS

Tekniko nebe responsavel ba Konsultan mk sei halo plano

Progressu iha tereno finaliza ona 100%, hein pagamentu ba adicional ho 100% nian.

PENDENTE

PENDENTE

PENDENTE

Note:

Planu Periode inspesaun iha tereinu

Implementa Planu Periode Inspensaun iha Terenu

Relatoriu avaliasuan mensal iha Dili

Inspesaun Prokesu Pagamentu

Prepara Husi :

Sertifika Husi :

✓ Aprova Husi :

(Eng. Bosco Dinis de Sousa)

Engenheiro ba Projecto Infraestrutura, Transportes e Irrigasaun Munisipiu Covalima ADN, I.P.

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenadora da Unidade de Controlo e Validação de Qualidade, ADN, I.P.

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T.M., Eng)
Director Executivo ADN, I.P.
